云浮市云城区富丰象山郊野公园项目（施工）

投标文件

投　　标　　人：四川霖冠建筑工程有限公司　（盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）　　_（签字或盖章）

编　　制　　人：_____　　_____（签字或盖章）

日　期：2025 年 10 月 10 日

目　录

一、法定代表人身份证明书 4
二、授权委托书（如果有） 6
三、投 标 函 8
四、投标函附录 9
五、拟投入本工程项目 介 10
项目经理 11
项目技术负责人 19
安全员 24
施工员 30
质量员 36
材料员 40
机管（械）员 44
资料员 49
项目负责人和项目技 确认表 53
六、投标人声明函 55
七、投标人的其他评审 56
7.1 企业业绩 56
八、需要提供的其他投 72
8.1 营业执照 73
8.2 资质证书 74
8.3 安全生产许可证 75
8.4 基本账户信息 76
8.5 信用截图 77
8.6 投标保证金 78
8.7 智慧建筑平台相 79
8.8 进粤平台截图 82
九、投标人承诺书 99
十、投标报价 100

（一）投标报价说明 100
（二）工程量清单报价书 101
十一、施工组织设计方案 249
一、总体概述:施工程序总体设想及施工段划分 249
二、 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 271
三、 施工平面布置和临时设施布置 300
四、质量保证措施 311
十二、定标因素评审情况所需的资料 362
施工方案组织方案 362
进度计划、质量控制措施 403
安全、文明施工、环保管理 469
绿色施工措施、防尘措施 480
应急处理方案 517

目　录

一、法定代表人身份证明书

二、授权委托书（如果有）

三、投标函

四、投标函附录

五、拟投入本工程项目主要施工人员简介

六、投标人声明函

七、投标人的其他评审情况

八、需要提供的其他投标资料

九、投标人承诺书

十、投标报价

十一、施工组织设计方案

十二、定标因素评审情况所需的资料

（投标人可自行调整目录格式。）

一、法定代表人身份证明书

（或采用工商部门格式）

单位名称：四川霖冠建筑工程有限公司 .

单位性质：有限责任公司(自然人独资) .

地　　址 .

成立时间：2020 年 09 月 08 日

经营期限：长期 .

姓　　__ 职务：总经理 .

系 四川霖冠建筑工程有限公司 的法定代表人。

特此证明。

投标人：四川霖冠建筑工程有限公司 （盖公章）

日　　期：2025 年 10 月 10 日

注：后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。

中华人民共和国
居民身份证
签发机
有效期


姓 名
性 别
出 生
住 址
公民

二、授权委托书（如果有）

（或采用工商部门格式）

本授权委托书声明：　　（姓名）系 四川霖冠建筑工程有限公司 的法定代表人，现授权委托 四川霖冠建筑工程有限公司 的　　为我公司参加投标、签署**云浮市云城区富丰象山郊野公园项目**的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托权限：从本授权委托书发出之日至 2026 年 9 月 30 日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人　　（签字）性别 ： 男 年龄： 38 岁

身份证号码

投标人： 四川霖冠建筑工程有限公司 （盖公章）

法定代表人：　　（签字或盖章）

授权委托日期： 2025 年 10 月 10 日

注：1、后附授权委托人二代身份证复印件或扫描件。

2、**本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。**


姓 名
性 别
出 生
住 址
公民身份

中华人民共和国
居民身份证
签发机
有效期

三、投 标 函

致 云浮市云城区云城街道办事处 （招标人）：

1、根据你方的 云浮市云城区富丰象山郊野公园项目 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、 合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单以其他有关文件后，我方愿以**人民币（大写） 肆佰柒拾捌万伍仟玖佰捌拾元伍角（RMB： 4785980.50 元）的**投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 90 个 日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第 3.3.1 条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，与贵方的相应施工合同将得到签署及履行，从而使双方共同地受到法律约束。

7、我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认定位的。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标保证金。

10、此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

11、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。

投标人： 四川霖冠建筑工程有限公司 （盖公章）

单位地址：

法定代表人或 ）

邮政编码： 6

开户银行名称：

开户银行账号

日期： 2025 年 10 月 10 日

四、投标函附录

序号	项 目 内 容	约 定 内 容	是否响应	备注
1	履约保证金	按合同文件约定	√	
2	施工准备时间	按合同文件约定	√	
3	误期违约金额	按招标文件规定	√	
4	误期赔偿费限额	按合同文件约定	√	
5	提前工期奖	按合同文件约定	√	
6	提前工期奖限额	按合同文件约定	√	
7	工期	（ 90 个 ）日历天	√	
8	质量标准	按招标文件约定	√	
9.	工程质量违约金最高限额	按合同文件约定	√	
10	预付款金额	按合同文件约定	√	
11	预付款保函金额	按合同文件约定	√	
12	进度款付款时间	按合同文件约定	√	
13	竣工结算款付款时间	按合同文件约定	√	
14	保修期	按合同文件约定	√	
15	投标有效期	按招标文件约定	√	
16	投标范围	按招标文件约定	√	
17	第二章“投标人须知”中“投标人须知前附表”1.4.1 项规定	按招标文件约定	√	

投标人：四川霖冠建筑工程有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：___（签字或盖章）

日 期：2025 年 10 月 10

五、拟投入本工程项目主要施工人员简介

职务	姓名	职称	职称证号	上岗执业或职业资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
项目经理							
项目技术负责人							
安全员							
施工员							
质量员							
材料员							
机管（械）员							
资料员							

一旦内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。

备注：如投标人要对项目管理人员架构进行调整的，本表格式可自行调整。

投标人：__四川霖冠建筑工程有限公司__（盖公章）

法定代表人或授权委托人　　签字或盖章）

日 期：_2025_年_10__月_10_日

后附：人员班子的相关证明资料。

项目经理



本证书表明持证人符合国家颁布的《专业技术职务试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

The certificate indicates that the holder has the qualifications of the related professional and technical positions as stipulated in the national regulations — Provisional Regulations for Professional and Technical Positions.

成都市人力资源和社会保障局制发
Chengdu Human Resources and Social Security Bureau

编号

993

姓
Full Nan

性
Sex

身份证
ID Numb

专业名称 水利水电
Speciality

资格名称 工程师
Professional Qualification

评审组织 成都市武侯区工程技术水利水电专业中(初)级职务任职资格评审专家委员会
Appraisal Organization

评审时间 2019年5月23日
Appraisal Date

批准时间 2019年6月27日
Approval Date

查询码
Query Code

使用有效期：2025年10月01日

－ 2026年03月30日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名

性　　别：

出生日期：

注册编号：

聘用企业：四川霖冠建筑工程有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2025-09-30至2028-09-29)
市政公用工程(有效期：2025-09-30至2028-09-29)
水利水电工程(有效期：2025-09-30至2028-09-29)
建筑工程(有效期：2025-09-30至2028-09-29)

请登录“四川建设发布”
微信公众号扫一扫查询

个人签名

签名日期

四川省住房和城乡建设厅

签发日期：2025年9月30日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

[redacted]

姓　　名：

性　　别：

出 生 年 月：

企 业 名 称：

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2021年04月24日

有　效　期：2024年03月04日　　至　2027年04月23日

发 证 机 关：四川省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年3月4日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

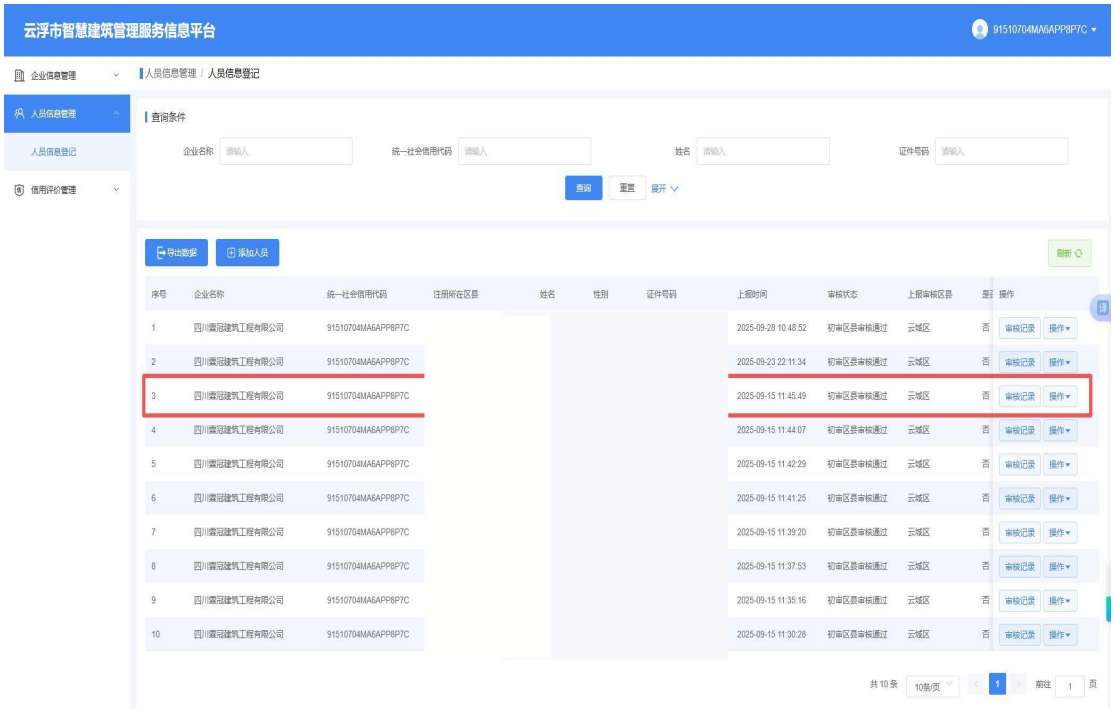

四、进粤企业在粤技术管理人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	职称	职务（岗位）	注册专业	注册类别	注册章号	执业资格证书号	注册证书编号	安全生产考核合格证书号	安全生产考核合格证书有效期
[redacted]					项目负责人							2027-04-23
					安全负责人							2026-12-19
						建筑工程	二级注册建造师					2026-07-06
												2026-09-29
				工程师								2026-09-12
					安全员							2026-07-07
												2026-05-24
				高级工程师	技术负责人							
				工程师		建筑工程 民航机场工程 水利水电工程 建筑工程	一级注册建造师					2026-09-12
				工程师								

人员诚信信息登记平台

四川省社会保险单位参保证明

单位名称：四川霖冠建筑工程有限公司　　单位社保编号　　当前参保地：成都市青羊区

参保险种：企业职工基本养老保险,工伤保险,失业保险(2025年07月-2025年07月)

缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202507	5	541.2		0	5	225.55	5	293.2

欠费情况（该单位初次参保时间2020年09月截至2023年12月）

险种	企业养老保险（本金）	机关养老保险 （本金）	失业保险 （本金）	工伤保险 （本金）
累计欠费（元）	0	0	0	0

人员缴费信息(2025年07月-2025年07月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1			企业职工养老	202507	1	202507	1	202507	1
2			企业职工养老	202507	1	202507	1	202507	1
3			企业职工养老	202507	1	202507	1	202507	1
4			企业职工养老	202507	1	202507	1	202507	1
5			企业职工养老	202507	1	202507	1	202507	1

打印时间：2025年07月21日

说明：1.本证明采用电子验证方式，不再加盖红色鲜章。如需验证，请登陆https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/toPage.do，凭验证码 3mG545qmjDN98RRRnGUw 验证。验证码有效期至2025 年 10 月 21 日（有效期三个月）。

2.如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的，请到参保地社保经办机构核实；2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。

3.“欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。

4.2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

四川省社会保险单位参保证明

单位名称：四川霖冠建筑工程有限公司　　单位社保编号　　当前参保地：成都市青羊区

参保险种：企业职工基本养老保险,工伤保险,失业保险(2025年08月-2025年08月)

缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202508	5	541.2		0	5	225.55	5	293.2

欠费情况（原单位初次参保时间2020年09月截至2023年12月）

险种	企业养老保险（本金）	机关养老保险 （本金）	失业保险 （本金）	工伤保险 （本金）
累计欠费（元）	0	0	0	0

人员缴费信息(2025年08月-2025年08月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
	[redacted]		企业职工养老	202508	1	202508	1	202508	1
			企业职工养老	202508	1	202508	1	202508	1
			企业职工养老	202508	1	202508	1	202508	1
			企业职工养老	202508	1	202508	1	202508	1
			企业职工养老	202508	1	202508	1	202508	1

打印时间：2025年08月22日

说明：1.本证明采用电子验证方式，不再加盖红色鲜章。如需验证，请登陆https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/toPage.do，凭验证码 N2wGNB3WPRUltfGtF5Wa 验证。验证码有效期至2025 年 11 月 22 日（有效期三个月）。

2.如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的，请到参保地社保经办机构核实；2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。

3.“欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。

4.2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

四川省社会保险单位参保证明

单位名称：四川霖冠建筑工程有限公司　　单位社保编号　　）当前参保地：成都市青羊区

参保险种：企业职工基本养老保险，工伤保险，失业保险(2025年09月-2025年09月)

缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202509	5	541.2		0	5	225.55	5	293.2

欠费情况（原单位初次参保时间2020年09月截至2023年12月）

险种	企业养老保险（本金）	机关养老保险 （本金）	失业保险 （本金）	工伤保险 （本金）
累计欠费（元）	0	0	0	0

人员缴费信息(2025年09月-2025年09月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1	[redacted]		企业职工养老	202509	1	202509	1	202509	1
2			企业职工养老	202509	1	202509	1	202509	1
3			企业职工养老	202509	1	202509	1	202509	1
4			企业职工养老	202509	1	202509	1	202509	1
5			企业职工养老	202509	1	202509	1	202509	1

打印时间：2025年09月28日

说明：1. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色鲜章。如需验证，请登陆https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/toPage.do，凭验证码 t d t N W e E u M 3 G d y d e f e P Q T 验证。验证码有效期至2025 年 12 月 28 日（有效期三个月）。

2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的，请到参保地社保经办机构核实；2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。

3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。

4. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

项目技术负责人

本证书表明持证人符合国家颁布的《专业技术职务试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

The certificate indicates that the holder has the qualifications of the related professional and technical positions as stipulated in the national regulations — Provisional Regulations for Professional and Technical Positions.

成都市人力资源和社会保障局制发
Chengdu Human Resources and Social Security Bureau

编号

姓
Full Na

性
Sex

身份证
ID Num

专业名称 市政工程
Speciality

资格名称 工程师
Professional Qualification

评审组织 四川省工程技术中级职务成都评审委员会
Appraisal Organization

评审时间 2015年12月27日
Appraisal Date

批准时间 2016年6月26日
Approval Date

查 询 码
Query Code

聘　书

兹聘　　（先生）担任四川霖冠建筑工程有限公司的项目技术负责人职务，负责公司技术工作的全面管理，并对项目质量安全进行监督指导相关工作。

聘期五年，自 2024 年 06 月 30 日至 2029 年 06 月 29 日。

此聘！

四川霖冠建筑工程有限公司

2024 年 06 月 30 日

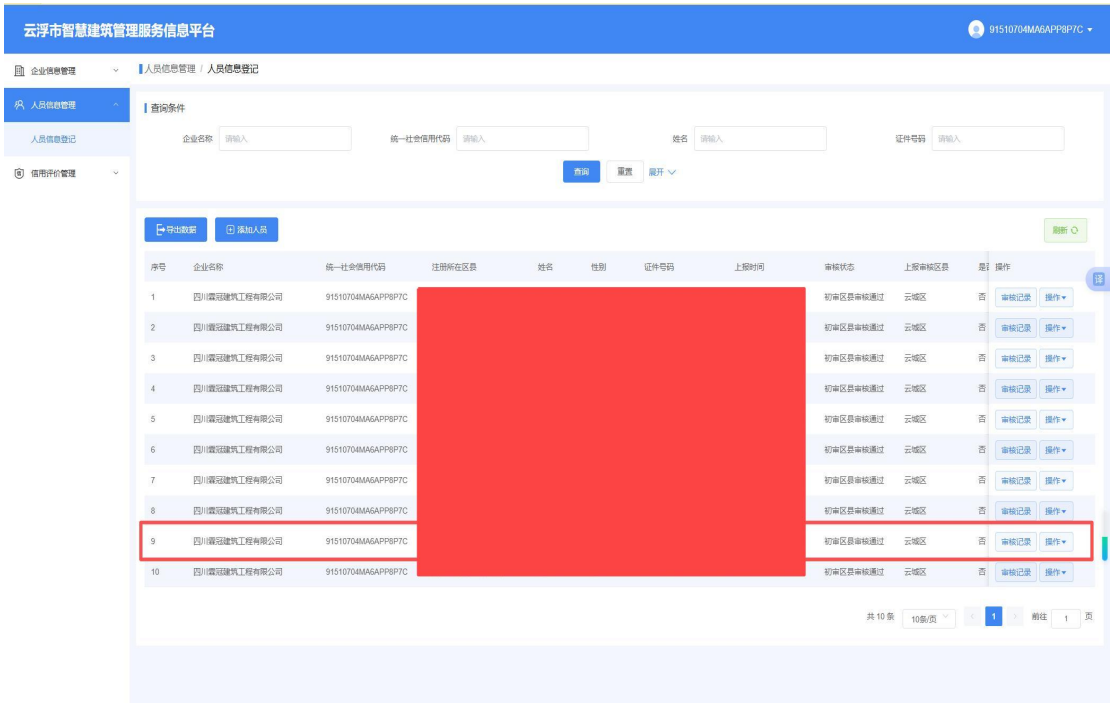

四、进粤企业在粤技术管理人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	职称	职务(岗位)	注册专业	注册类别	注册章号	执业资格证书号	注册证有效期	安全生产考核合格证号	安全生产考核合格证有效期
1	[redacted]				项目负责人							2027-04-23
2					安全负责人							2026-12-19
3						建筑工程	二级注册建造师					2026-07-06
4												
5												2026-09-29
6												2026-09-12
7					安全员							2026-07-07
												2026-05-24
8					技术负责人							
9						建筑工程 民航机场工程 水利水电工程 建筑工程	一级注册建造师					2026-09-12
10												

诚信信息登记平台

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

130140202509261014O9

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130140

兹证明

参保单位名称：	四川霖冠建筑工程有限公司河北分公司	社会信用代码：	
单位社保编号：		经办机构名称：	石家庄高新技术产业开发区社会保险中心
单位参保日期：	2022年12月01日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	10	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1			2022-12-19	缴费	3920.55	202212至202509
2			2024-01-15	缴费	3920.55	202401至202509
3			2024-01-15	缴费	3920.55	202401至202509
4			2022-12-19	缴费	3920.55	202212至202509
5			2024-08-15	缴费	3920.55	202408至202509
6			2022-12-19	缴费	3920.55	202212至202509
7			2025-07-01	缴费	3920.55	202507至202509
8			2025-08-01	缴费	3920.55	202508至202509
9			2022-12-19	缴费	3920.55	202212至202509

证明机构盖章：　　证明日期：2025年09月26日

业务专用章

1. 证明开具后1个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，请向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-1925198646640　01

安全员

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：

姓　　名：

性　　别：

出 生 年 月：

企 业 名 称：四川霖冠建筑工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年01月04日

有　效　期：2024年01月04日　　至　2026年12月19日

发 证 机 关：四川省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年1月4日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

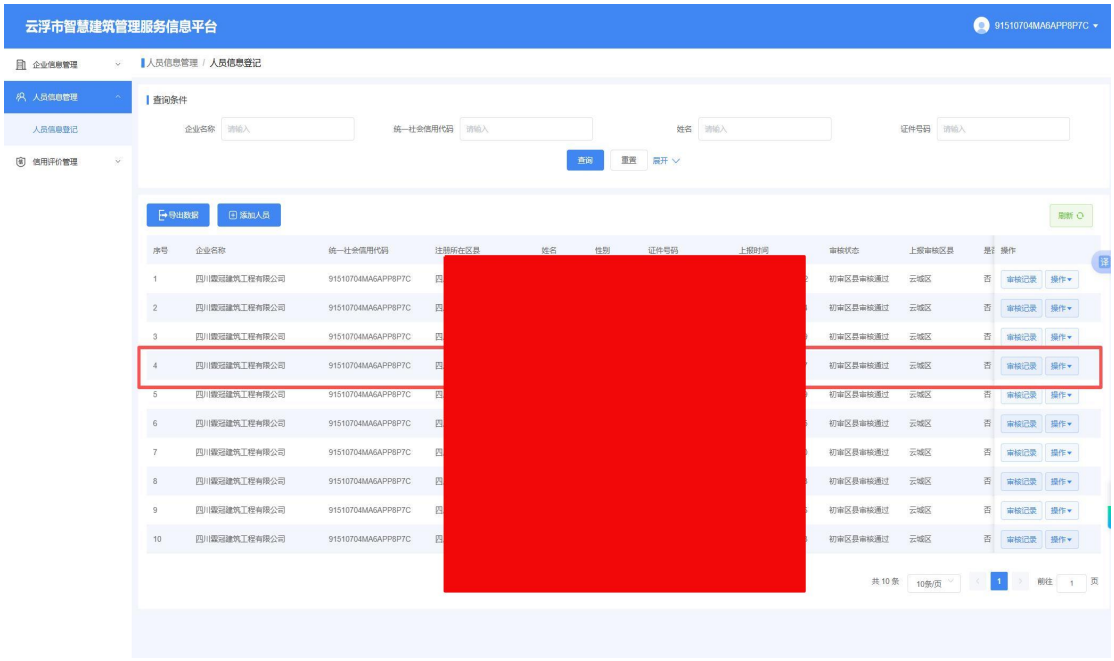

四、进粤企业在粤技术管理人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	职称	职务(岗位)	注册专业	注册类别	注册章号	执业资格证书号	注册证有效期	安全生产考核合格证号	安全生产考核合格证有效期
					项目负责人							2027-04-23
					安全负责人							2026-12-19
						建筑工程	一级注册建造师					2026-07-06
												2026-09-29
												2026-09-12
					安全员							2026-07-07
												2026-05-24
					技术负责人							
						建筑工程 民航机场工程 水利水电工程 建筑工程	一级注册建造师					2026-09-12

云城信信息登记平台

四川省社会保险单位参保证明

单位名称：四川霖冠建筑工程有限公司　　单位社保编号　　）当前参保地：成都市青羊区

参保险种：企业职工基本养老保险，工伤保险，失业保险(2025年07月-2025年07月)

缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202507	5	5413.2		0	5	225.55	5	293.2

欠费情况（从单位初次参保时间2020年09月截至2023年12月）

险种	企业养老保险（本金）	机关养老保险 （本金）	失业保险 （本金）	工伤保险 （本金）
累计欠费（元）	0	0	0	0

人员缴费信息(2025年07月-2025年07月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
			职工养老	202507	1	202507	1	202507	1
			职工养老	202507	1	202507	1	202507	1
			职工养老	202507	1	202507	1	202507	1
			职工养老	202507	1	202507	1	202507	1
			职工养老	202507	1	202507	1	202507	1

打印时间：2025年07月21日

说明：1.本证明采用电子验证方式，不再加盖红色鲜章。如需验证，请登陆https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/toPage.do，凭验证码 3mG545qmjDN98RRRnGUw 验证。验证码有效期至2025 年 10 月 21 日（有效期三个月）。

2.如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的，请到参保地社保经办机构核实；2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。

3.“欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。

4.2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

四川省社会保险单位参保证明

单位名称：四川霖冠建筑工程有限公司　　单位社保编号　　当前参保地：成都市青羊区

参保险种：企业职工基本养老保险,工伤保险,失业保险(2025年08月-2025年08月)

缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202508	5	5413.2		0	5	225.55	5	293.2

欠费情况（从单位初次参保时间2020年09月截至2023年12月）

险种	企业养老保险（本金）	机关养老保险 （本金）	失业保险 （本金）	工伤保险 （本金）
累计欠费（元）	0	0	0	0

人员缴费信息(2025年08月-2025年08月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1			企业职工养老	202508	1	202508	1	202508	1
2			企业职工养老	202508	1	202508	1	202508	1
3			企业职工养老	202508	1	202508	1	202508	1
4			企业职工养老	202508	1	202508	1	202508	1
5			企业职工养老	202508	1	202508	1	202508	1

打印时间：2025年08月22日

说明：1.本证明采用电子验证方式，不再加盖红色鲜章。如需验证，请登陆https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/toPage.do，凭验证码 N2wGNB3WPRUltfGtF5Wa 验证。验证码有效期至2025 年 11 月 22 日（有效期三个月）。

2.如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的，请到参保地社保经办机构核实；2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。

3.“欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。

4.2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

四川省社会保险单位参保证明

单位名称：四川霖冠建筑工程有限公司　　单位社保编号　　前参保地：成都市青羊区

参保险种：企业职工基本养老保险，工伤保险，失业保险(2025年09月-2025年09月)

缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202509	5	5411.2		0	5	225.55	5	293.2

欠费情况（从单位初次参保时间2020年09月截至2023年12月）

险种	企业养老保险（本金）	机关养老保险（本金）	失业保险（本金）	工伤保险（本金）
累计欠费（元）	0	0	0	0

人员缴费信息(2025年09月-2025年09月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
			企业职工养老	202509	1	202509	1	202509	1
			企业职工养老	202509	1	202509	1	202509	1
			企业职工养老	202509	1	202509	1	202509	1
			企业职工养老	202509	1	202509	1	202509	1
			企业职工养老	202509	1	202509	1	202509	1

说明：1. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色鲜章。如需验证，请登陆https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/toPage.do，凭验证码 t d t N W e E u M 3 G d y d e f e P Q T 验证。验证码有效期至2025 年 12 月 28 日（有效期三个月）。

2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的，请到参保地社保经办机构核实；2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。

3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。

4. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

施工员



证书编码

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：

身份证号：

岗位名称：　市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：中国铁建股份有限公司

发证时间：2025年01月15日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

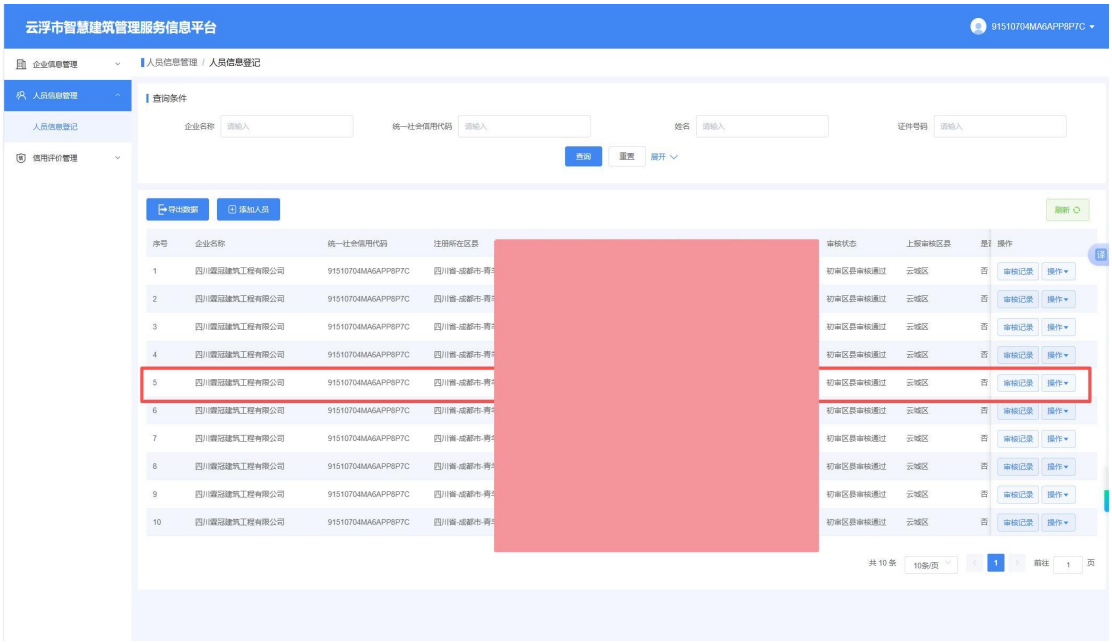

四、进粤企业在粤技术管理人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	职称	职务(岗位)	注册专业	注册类别	注册章号	执业资格证书号	注册证有效期	安全生产考核合格证号	安全生产考核合格证有效期
1					项目负责人							)27-04-23
2					安全负责人							)26-12-19
3						建筑工程	二级注册建造师					)26-07-06
4												
5												)26-09-29
6				.师								)26-09-12
7					安全员							)26-07-07
												)26-05-24
8				.程师	技术负责人							
9				.师		建筑工程 民航机场工程 水利水电工程 建筑工程	一级注册建造师					)26-09-12
10				.师								

员诚信信息登记平台

第 7 页 共 10 页

四川省社会保险单位参保证明

单位名称：四川霖冠建筑工程有限公司　　单位社保编号　　当前参保地：成都市青羊区

参保险种：企业职工基本养老保险,工伤保险,失业保险(2025年07月-2025年07月)

缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202507	5	5413.2		0	5	225.55	5	293.2

欠费情况（从单位初次参保时间2020年09月截至2023年12月）

险种	企业养老保险（本金）	机关养老保险 （本金）	失业保险 （本金）	工伤保险 （本金）
累计欠费（元）	0	0	0	0

人员缴费信息(2025年07月-2025年07月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1			企业职工养老	202507	1	202507	1	202507	1
2			企业职工养老	202507	1	202507	1	202507	1
3			企业职工养老	202507	1	202507	1	202507	1
4			企业职工养老	202507	1	202507	1	202507	1
5			企业职工养老	202507	1	202507	1	202507	1

打印时间：2025年07月21日

说明：1. 本证明未用电子验证方式，不再加盖红色鲜章。如需验证，请登陆https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/toPage.do，凭验证码 3mG545qmjDN98RRRnGUw 验证。验证码有效期至2025 年 10 月 21 日（有效期三个月）。

2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的，请到参保地社保经办机构核实；2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。

3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。

4. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

四川省社会保险单位参保证明

单位名称：四川霖冠建筑工程有限公司　　单位社保编号　　当前参保地：成都市青羊区

参保险种：企业职工基本养老保险,工伤保险,失业保险(2025年08月-2025年08月)

缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202508	5	5412.2		0	5	225.55	5	293.2

欠费情况（从单位初次参保时间2020年08月截至2023年12月）

险种	企业养老保险（本金）	机关养老保险 （本金）	失业保险 （本金）	工伤保险 （本金）
累计欠费（元）	0	0	0	0

人员缴费信息(2025年08月-2025年08月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
			职工养老	202508	1	202508	1	202508	1
			职工养老	202508	1	202508	1	202508	1
			职工养老	202508	1	202508	1	202508	1
			职工养老	202508	1	202508	1	202508	1
			职工养老	202508	1	202508	1	202508	1

打印时间：2025年08月22日

说明：1.本证明采用电子验证方式，不再加盖红色鲜章。如需验证，请登陆https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/toPage.do，凭验证码 N2wGNB3WPRU1tfGtF5Wa 验证。验证码有效期至2025 年 11 月 22 日（有效期三个月）。

2.如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的，请到参保地社保经办机构核实；2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。

3.“欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。

4.2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

四川省社会保险单位参保证明

单位名称：四川霖冠建筑工程有限公司　　单位社保编号　　）当前参保地：成都市青羊区

参保险种：企业职工基本养老保险，工伤保险，失业保险(2025年09月-2025年09月)

缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202509	5	541.2		0	5	225.55	5	293.2

欠费情况（原单位初次参保时间2020年09月截至2023年12月）

险种	企业养老保险（本金）	机关养老保险 （本金）	失业保险 （本金）	工伤保险 （本金）
累计欠费（元）	0	0	0	0

人员缴费信息(2025年09月-2025年09月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
			企业职工养老	202509	1	202509	1	202509	1
			企业职工养老	202509	1	202509	1	202509	1
			企业职工养老	202509	1	202509	1	202509	1
			企业职工养老	202509	1	202509	1	202509	1
			企业职工养老	202509	1	202509	1	202509	1

打印时间：2025年09月28日

红色鲜章。如需验证，请登陆https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/ EuM3GdydefePQT 验证。验证码有效至2025 年 12 月 28 日（有效期三个月）。

2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的，请到参保地社保经办机构核实；2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。

3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。

4. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

质量员

证书编码

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：

身份证号：

岗位名称：　市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：石家庄市裕华区卓成职业培训学校

发证时间：2024年06月25日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

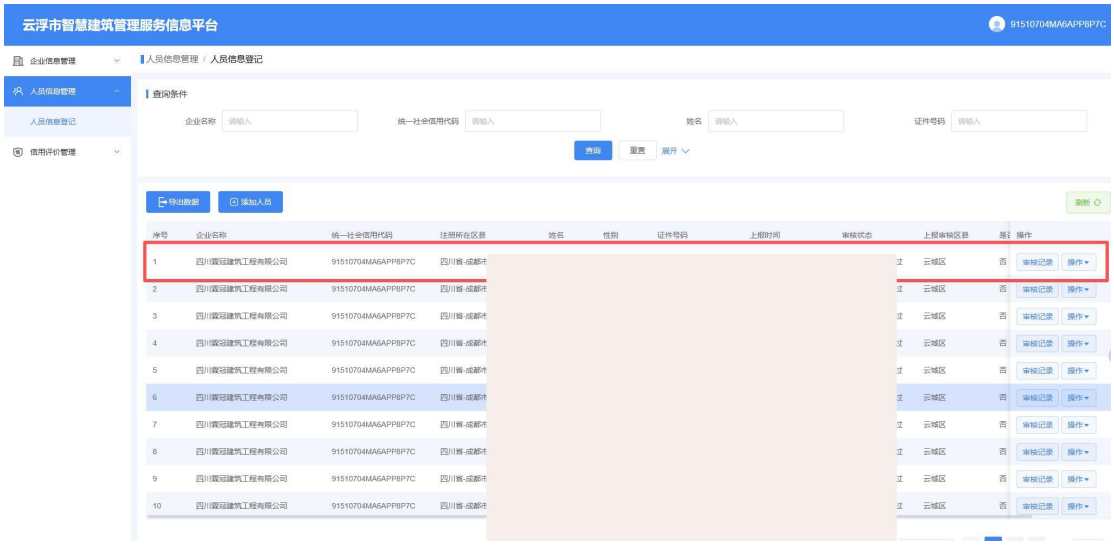

四、进粤企业在粤技术管理人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	职称	职务(岗位)	注册专业	注册类别	注册章号	执业资格证书号	注册证有效期	安全生产考核合格证号	安全生产考核合格证有效期
					项目负责人							027-04-23
					安全负责人							026-12-19
						建筑工程	二级注册建造师					026-07-06
												026-09-29
												026-09-12
					安全员							026-07-07
												026-05-24
					技术负责人							
						建筑工程 民航机场工程 水利水电工程 建筑工程	一级注册建造师					026-09-12

诚信信息登记平台

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

130140202509261014O9

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130140

兹证明

参保单位名称：	四川霖冠建筑工程有限公司河北分公司	社会信用代码：	
单位社保编号：		经办机构名称：	石家庄高新技术产业开发区社会保险中心
单位参保日期：	2022年12月01日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	10	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
			022-12-19	缴费	3920.55	202212至202509
			024-01-15	缴费	3920.55	202401至202509
			024-01-15	缴费	3920.55	202401至202509
			022-12-19	缴费	3920.55	202212至202509
			024-08-15	缴费	3920.55	202408至202509
			022-12-19	缴费	3920.55	202212至202509
			025-07-01	缴费	3920.55	202507至202509
			025-08-01	缴费	3920.55	202508至202509
			022-12-19	缴费	3920.55	202212至202509

证明机构盖章：　　证明日期：2025年09月26日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-1925198646(　1

材料员

证书编码

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：[redacted]

身份证号：[redacted]

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：石家庄市裕华区卓成职业培训学校

发证时间：2022年 08月 04日

扫码验证

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

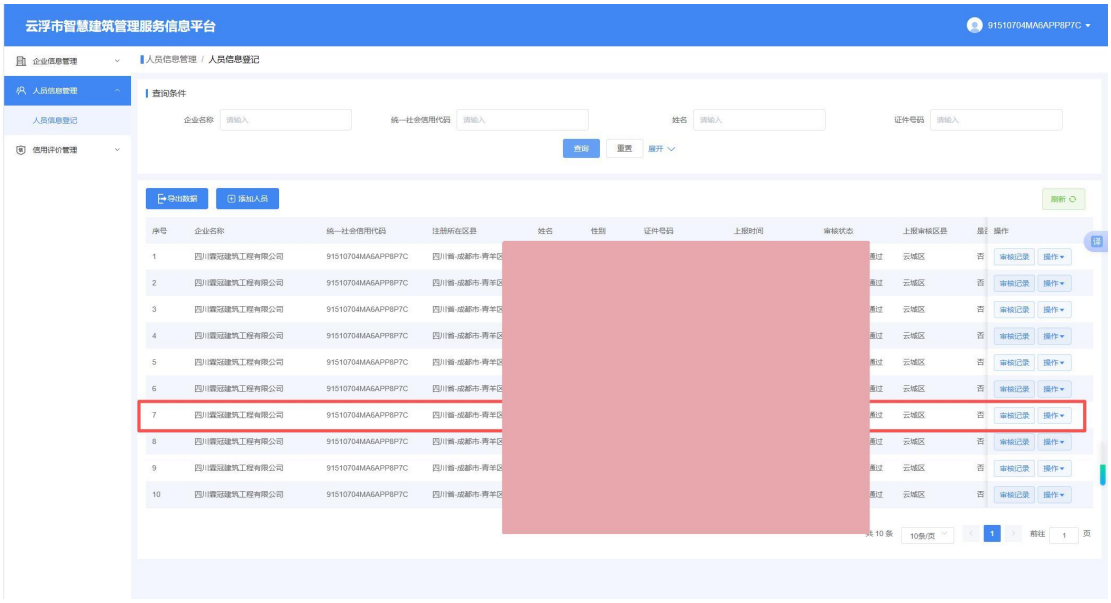

四、进粤企业在粤技术管理人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	职称	职务(岗位)	注册专业	注册类别	注册章号	执业资格证书号	注册证有效期	安全生产考核合格证号	安全生产考核合格证有效期
[redacted]					项目负责人							-04-23
					安全负责人							-12-19
						建筑工程	二级注册建造师					-07-06
												-09-29
												-09-12
					安全员							-07-07
												-05-24
					技术负责人							
						建筑工程 民航机场工程 水利水电工程 建筑工程	一级注册建造师					-09-12

												-07-01
						建筑工程	二级注册建造师					-06-22
												-07-01

诚信信息登记平台

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

130140 1409

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130140

兹证明

参保单位名称：	四川霖冠建筑工程有限公司河北分公司	社会信用代码：	
单位社保编号：	13201496958	经办机构名称：	石家庄高新技术产业开发区社会保险中心
单位参保日期：	2022年12月01日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	10	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
			2022-12-19	缴费	3920.55	202212至202509
			2024-01-15	缴费	3920.55	202401至202509
			2024-01-15	缴费	3920.55	202401至202509
			2022-12-19	缴费	3920.55	202212至202509
			2024-08-15	缴费	3920.55	202408至202509
			2022-12-19	缴费	3920.55	202212至202509
			2025-07-01	缴费	3920.55	202507至202509
			2025-08-01	缴费	3920.55	202508至202509
			2022-12-19	缴费	3920.55	202212至202509

证明机构盖章：　　证明日期：2025年09月26日

业务专用章

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-1925　　3401

机管（械）

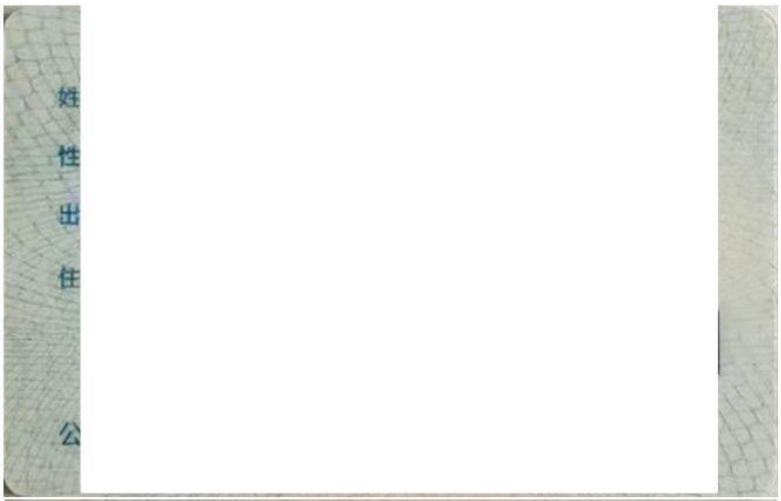

专业技术系列 工程技术
Professional Series
专 业 名 称 工民建
Name of Speciality
资 格 名 称 工程师
Name of Qualification
评审委员会 保定市中级专业技术资格评审委员会
Appraisal Committee
授 予 时 间 2000.7.4
Date of Conferment

姓名
Name
出生
Date
证书
Certific

二〇〇〇年十月十八日

证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：

身份证号：

[redacted]　　岗位名称：　机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：石家庄市裕华区卓成职业培训学校

发证时间：2024年06月25日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

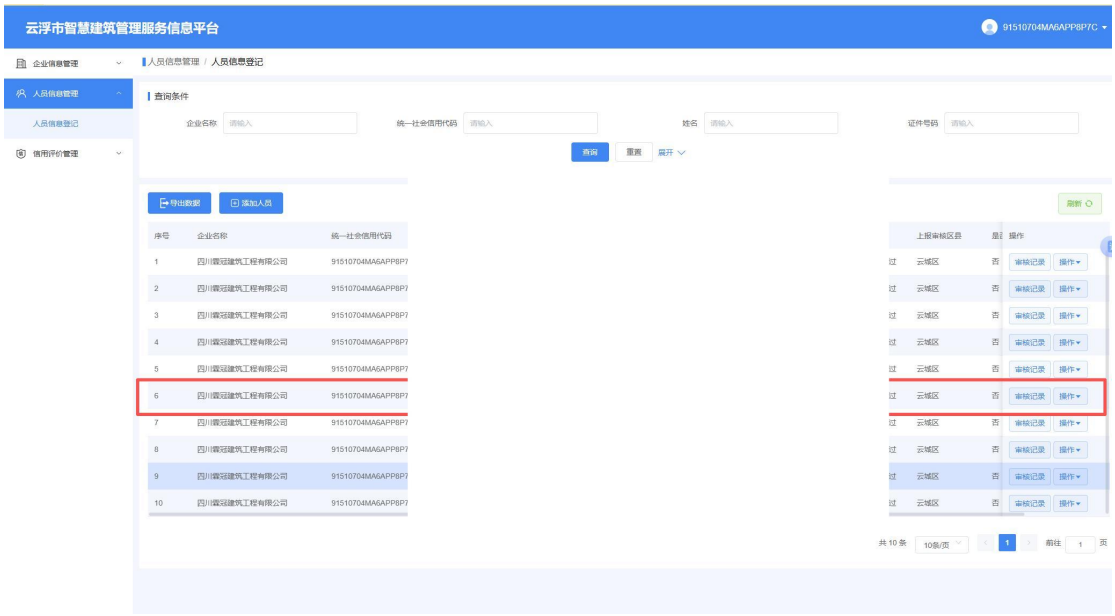

四、进粤企业在粤技术管理人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	职称	职务(岗位)	注册专业	注册类别	注册章号	执业资格证书	注册证有效期	安全生产考核合格证号	安全生产考核合格证有效期
					项目负责人							-04-23
					安全负责人							-12-19
						建筑工程	二级注册建造师					-07-06
												-09-29
												-09-12
					安全员							-07-07
												-05-24
					技术负责人							
						建筑工程 民航机场工程 水利水电工程 建筑工程	一级注册建造师					-09-12

												-07-01
						建筑工程	二级注册建造师					-06-22
												-07-01

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130140

兹证明

参保单位名称：四川霖冠建筑工程有限公司河北分公司　　社会信用代码：

单位社保编号：　　经办机构名称：　　中心

单位参保日期：2022年12月01日　　单位参保状态：参保缴费

参保缴费人数：10　　单位参保险种：企业职工基本养老保险

单位有无欠费：无　　单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
			2022-12-19	缴费	3920.55	202212至202509
			2024-01-15	缴费	3920.55	202401至202509
			2024-01-15	缴费	3920.55	202401至202509
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			2024-08-15	缴费	3920.55	202408至202509
			2022-12-19	缴费	3920.55	202212至202509
			2025-07-01	缴费	3920.55	202507至202509
			2025-08-01	缴费	3920.55	202508至202509
			2022-12-19	缴费	3920.55	202212至202509

证明机构盖章：　　证明日期：2025年09月26日

业务专用章

1. 证明开具后[illegible]内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-1925198[illegible]1

资料员

证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：

身份证号：

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：石家庄市裕华区卓成职业培训学校

发证时间：2022年 08月 04日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

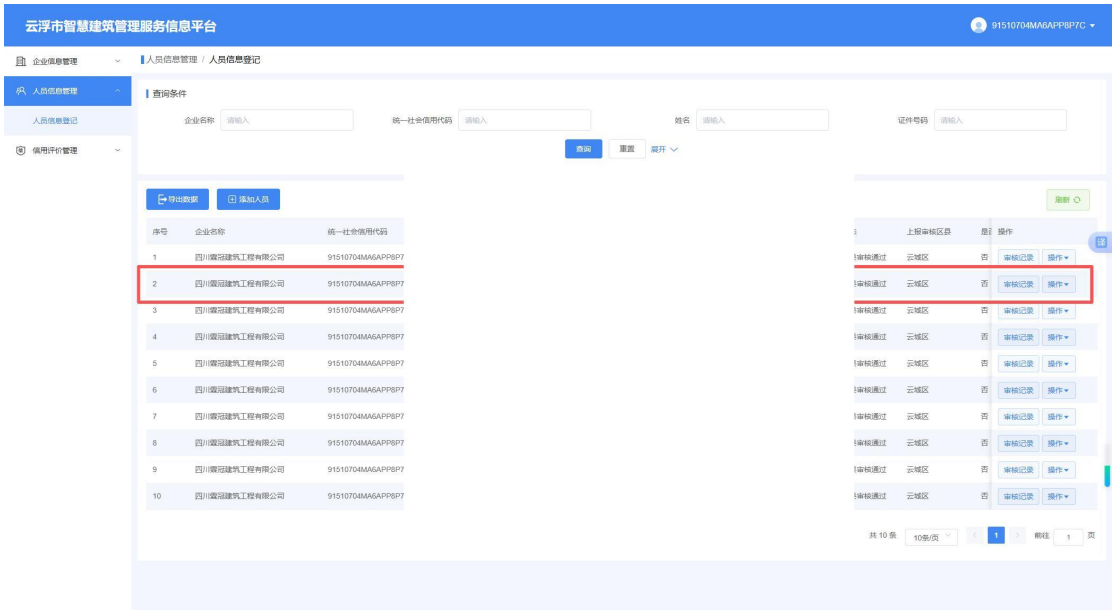

四、进粤企业在粤技术管理人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	职称	职务(岗位)	注册专业	注册类别	注册章号	执业资格证书号	注册证有效期	安全生产考核合格证号	安全生产考核合格证有效期
					项目负责人							4-23
					安全负责人							2-19
						建筑工程	二级注册建造师					7-06
												9-29
				工程师								9-12
					安全员							7-07
												5-24
				级工程师	技术负责人							
				工程师		建筑工程 民航机场工程 水利水电工程 建筑工程	一级注册建造师					9-12
				工程师								

人员诚信信息登记平台

												7-01
						建筑工程	二级注册建造师					6-22
												7-01

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130140

兹证明

参保单位名称：	四川霖冠建筑工程有限公司河北分公司	社会信用代码：	1
单位社保编号：		经办机构名称：	石家庄
单位参保日期：	2022年12月01日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	10	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	[redacted]		12-19	缴费	3920.55	202212至202509
2			01-15	缴费	3920.55	202401至202509
3			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4			12-19	缴费	3920.55	202212至202509
5			08-15	缴费	3920.55	202408至202509
6			12-19	缴费	3920.55	202212至202509
7			07-01	缴费	3920.55	202507至202509
8			08-01	缴费	3920.55	202508至202509
9			12-19	缴费	3920.55	202212至202509

证明机构：　　证明日期：2025年09月26日

业务专用章

1. 证明开具后一个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-1925[redacted]3401

项目负责人和项目技术负责人签名确认表

本人姓名：　　，性别：男，身份证证号　　已认真阅读 **云浮市云城区富丰象山郊野公园项目** 招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目**项目负责人**一职，并承担相应的责任。

本人姓名：　　，性别：男，身份证证号　　已认真阅读 **云浮市云城区富丰象山郊野公园项目** 招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目**项目技术负责人**一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人：四　　盖公章）

项目负责人：　　（签字）

项目技术负责　　（签字）

：　　月 10 日

注：后附相关人员的二代身份证复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由对应的负责人签字确认。


姓 名
性 别
出 生
住 址
公民身

中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限

中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限

姓 名
性 别
出 生
住 址
公民身份

六、投标人声明函

致：云浮市云城区云城街道办事处（招标人）

我公司作为贵单位拟建的云浮市云城区富丰象山郊野公园项目招标的投标人，我公司郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目管理班子不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，如在两个及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。

二、我公司保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的，包括但不仅限于营业执照、资质证书、业绩证明资料、获奖证明资料、人员证书、社保、纳税证明材料等。我公司同意投标材料及其后提供的一切材料均可对社会公开，接受社会监督。

三、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、我公司近三年没有下列情形之一：

1. 捏造事实、伪造证明材料投诉；

2. 无故放弃中标的；

3. 超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；

4. 由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5. 办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、我公司不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

六、我公司保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关网站载明该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人：四川霖冠建 工 （ ）

法定代表人或授权委托 [redacted] 盖章）

日 期：2025 年 10 [redacted]

七、投标人的其他评审情况

7.1 企业业绩

序号	项目名称	签订日期
1	礼义路”工程	2024.6.26
2	赵县洨河农桥修建项目一小李庄桥施工	2024.10.28
3	定州市乡村基础设施建设项目施工（砖路镇丁村环村路硬化工程施工）	2025.8.29

投标人：四川霖冠建筑工程有限公司（盖公章）

日 期：2025 年 10 月 10 日

说明：后附相关证明资料。

1　礼义路”工程

成交通知书

项目编号：

四川霖冠建筑工程有限公司：

“礼义路”工程于 2024 年 06 月 24 日 14：30 进行了评审，评审商小组综合评定，现确定你单位为本项目的成交供应商。

成交金额：3400000.00 元

工　　期：30 日历天（自本合同生效之日起计算）

请你方在接到本通知书后 30 日内到 定州市北城区瘟庙街社区居民委员会 签订采购合同。

特此通知。

采购人：定州市北城区瘟庙街社区居民委员会　（盖章）

采购代理机构：河北福山工程咨询有限公司（盖章）

2024 年 06 月 25 日

“礼义路”工程施工合同

甲方：定州市北城区瘟庙街社区居民委员会

乙方：四川霖冠建筑工程有限公司

签订时间：2024 年 6 月 26 日

乙方具有本工程施工资质和能力。为了保护甲、乙双方的合法权益，依照《中华人共和国民法典》及其他有关法律和法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，就甲方开发建设的“礼义路”工程交由乙方施工事宜，达成如下协议，共同遵守。

一、工程名称及地点

1、工程地点：河北省定州市‘志远路’北侧（清风北街至张寒辉大街）。

2、工程名称：“礼义路”工程。

3、工程质量： 按现行的国家质量评定标准执行，质量合格。

二、工程承包范围及不包含范围

（1）、道路工程：“礼义路”道路工程图纸当中的全部内容（含清表、挖方、填方、拆除、树池、车行道及路基、人行道及路基、路缘石、交通标线‘指示线、禁止线’等），严格按图纸施工。交钥匙工程。

注：道路面层（AC-13 沥青砼 4cm）改成玄武岩材料。

（2）、电力工程：“礼义路”电力工程图纸当中的全部内容（含挖方、填方、夯实、布管、管材、拖拉管、管井、井盖、接入清风北街至张寒辉大街现状井等），严格按图纸施工。交钥匙工程。**注：不含电线电缆。**

（3）、雨污水工程：“礼义路”雨污水工程图纸当中的所有内容（含挖方、填方、夯实、布管、管材、管井、井盖、接入清风北街至张寒辉大街现状井等），严格按图纸施工。交钥匙工程。

（4）、路灯（照明）工程：“礼义路”路灯（照明）工程图纸当中的所有内容（含挖方、填方、夯实、布管、管材、管井、井盖等），严格按图纸施工。交钥匙工程。**注：不包含路灯（灯杆）、路灯基础、电线电缆。**

（5）、含 C30 砼路面，厚度 15cm，长度 10~20 米，宽 3~3.5 米。

（6）、含各个专业为道路两侧本公司项目预留管道的过路管（热力、燃气、给水、消防、电信等）。

（7）、含道路两侧本公司项目的各个出入口。

特别说明：本工程不包含燃气管道、给水管道、通信管道、热力管道。

三、合同价款

1、本工程合同含税（税率 9%）总价款为人民币叁佰肆拾万元整（￥3400000.00 元）。

2、本合同总价含人工费、材料费、机械费、管理费、安全文明施工费、保险费、税金、利润等一切费用。该合同总价为包干价，是乙方完成本合同约定全部工作，甲方支付给乙方的全部报酬，除上述以外，甲方无需向乙方或第三方支付其他任何费用。合同单价除合同另有明确约定外，不得调增。

四、对施工、实验等环节的全面验收

1、施工当中，甲乙双方的工程技术人员必须都到施工现场具体指导，参与施工，并做好技术交底工作，在施工过程中，要接受有关监督部门的监督指导；

2、施工完毕，乙方及时通知甲方组织有关人员对工程进行全面调试验收，并做好详细记录及相关技术资料存档备案，验收通过后为工程竣工。

3、按现行的、相应的国家工程质量标准及图纸标准验收。验收时产生的费用乙方自理，甲方协调验收。

五、工期安排

1、合同签订后，乙方派出项目经理，技术负责人和施工人员介入工程，随之进场；

2、工期：30 日历天（自本合同生效之日起计算）。

如遇下列情况之一，经甲方工地代表认可后，工期可作相应顺延调整：

（1）图纸范围内或图纸范围以外的重大设计变更工程量的增加；

（2）因人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度。

（3）上级部门的有关政策影响施工进度。

六、变更的确定

1、甲方由于功能的需要，经设计方出变更图，书面通知乙方（如无书面通知乙方有权不进行施工），乙方按变更要求施工。计价方式按《河北省建设工程消耗量标准（2022）-市政工程》定额编制。

2、所有设计变更，施工变更，须经甲方签字。

七、甲方工作

1、甲方应提供图纸一套和相关的技术资料，组织乙方，监理和其他施工方参加的技术交底和图纸会审；

2、甲方应提供场地供乙方搭建公棚或临时用房间，并保证使用至工程结束。

3、甲方负责提供电源，水源（水电费用乙方自理）并及时拨付工程款，确保工程顺利进行。

4、甲方委托监理时，应将其所委托的监理单位，监理内容，总监理工程师姓名与赋予的权限一并以书面通知乙方。

5、甲方驻工地代表：　　电话：

八、乙方工作

1、乙方应编制施工组织设计（施工方案）和施工总进度计划；

2、负责已竣工的工程（含施工中在建工程）在未交付甲方之前的成品保护；

3、 工程资料的整理、归档。

4、乙方必须按照河北省建筑施工安全检查标准加强现场管理，做到文明施工扬尘治理，加强施工安全教育工作，严格按操作规程操作。乙方全部承担包括但不限于本工程发生的安全事故或行政处罚等一切责任和损失。

5、乙方必须保证质量，按期完成本工程项目。

6、乙方购买的工程所需材料必须为“国标”，材料进场必须具有生产许可

证、出厂合格证、材质单，材料经监理、甲方现场见证取样复试合格方可使用，否则甲方监理有权制止使用未经认可的材料。

7、乙方驻地项目经理：

九、保修责任

1、乙方按国家有关规定的保修内容、事项、范围、期限进行保修。质保期内由乙方负责免费保修。

2、质量保修期从甲方验收合格之日期起算，保修期为 2 年。

3、保修期内，乙方在接到甲方紧急修理通知后，需尽快赶赴现场，并进行维修。否则，甲方有权组织维修，维修费用全部由乙方无条件承担。

十、违约责任

1、甲方违约逾期付款未超过 15 日的，每迟延一天，应向乙方支付合同总金额 0.1% 的违约金。逾期付款超过 15 日的，除甲方依约向乙方支付违约金外，乙方有权无条件终止本合同，乙方终止本合同的，甲方 15 日内全额付清乙方已施工的工程款并承担由此产生的全部损失。

2、乙方违约逾期交付工程未超过 15 日的，每迟延交付一天，应向甲方支付合同总金额 0.1% 的违约金；逾期交付超过 15 日的，除乙方依约向甲方支付违约金外，甲方有权无条件终止本合同，甲方终止本合同的，乙方返还甲方已付工程款，甲方有权索赔由于其违约造成的所有直接损失。

十一、付款方式、时间及额度

1、甲方将款直接付至乙方对公银行账户。付款时，乙方向甲方提供符合要求的合法合规的增值税普通发票，甲方凭票付款。

2、按单项工程月进度完成工程量的 85%支付工程款；施工完毕经甲方监理验收合格后，支付到合同总价的 90%；竣工验收后支付到合同的 95%；余 5%质保金，质保期满后一个月内付清（不计息）。

甲方信息

开户行：

账户：60

乙方信息

公司名称：

纳税人识别

地址：四川

联系人电话

开户行

账号：

联行号

法人：

邮箱号

十二、其他约定

1、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，并签订补充条款作为本合同附件执行。

2、合同执行中的争议，甲乙双方首先友好协商解决，协商不成可在定州市人民法院诉讼解决。

3、合同签订生效后，任何一方违反合同规定，除了承担违约金外，还应承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于：律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通食宿费等。

4、施工合同签订后，合同的解释权归甲方所有。

5、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，甲乙双方签章后生效。

甲方：定州市北城区瘟庙街社区居民委员会　乙方：四川森冠建筑工程有限公司

代表人：　　代表人：

签订日期：2024 年 6 月 26 日

2　赵县洨河农桥修建项目一小李庄桥施工

中 标 通 知 书

编号：

四川霖冠建筑工程有限公司：

根据《中华人民共和国招标投标法》规定，你方于2024年10月15日09:00所递交的赵县洨河农桥修建项目-小李庄桥投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

请你方接到本中标通知书后30日内与我方签订合同。

特此通知。

招标人：（公章）

2024 年 10 月 21 日

建设单位	赵县水利局		
工程名称	赵县洨河农桥修建项目-小李庄桥	建筑面积	/
中标工程内容	工程量清单范围内的全部内容。		
承包方式	包工包料		
中标条款	1、中标价：1214448.77元 2、中标工期：180日历天 3、质量标准：合格 4、项目经 证书编号 5、招标方式：公开招标		
备注	本项目委托河北标得工程项目管理有限公司负责招标代理工作，项目负责		

合同协议书

赵县水利局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施赵县洨河农桥修建项目一小李庄桥施工（项目名称），已接受四川森林建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对赵县洨河农桥修建项目一小李庄桥施工（项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书；

(2) 投标函及投标函附录；

(3) 专用合同条款；

(4) 通用合同条款；

(5) 技术标准和要求（合同技术条款）；

(6) 图纸；

(7) 已标价工程量清单；

(8) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹佰贰拾壹万肆仟肆佰肆拾捌元柒角柒分（¥1214448.77元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）伍万贰仟柒佰贰拾捌元伍角叁分（¥52728.53元）；

4. 承包人项目经理：

5. 工程质量符合合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，工期为 180 。

9. 本协议书一式 拾 份，其中正本 贰 份，双方各执 壹 份；副本 捌 份，双方各执 肆 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：赵县水利局

（盖单位章）

法定代表人

或其委托代

开户银行：

账号：

联系电话：

2024 年 10 月 28 日

承包人：四川霖冠建筑工程有限公司

（盖单位章）

法定代表人

或其委托代

开户银行：

账号：

联系电话：

2024 年 10月 28 日

3　定州市乡村基础设施建设项目施工（暨砖路镇丁村环村路硬化工程施工）

中标通知书

（项目编号：HBLC-2025-049-1）

四川霖冠建筑工程有限公司：

你方递交的定州市乡村基础设施建设项目施工（一标段：环村路）投标文件于 2025 年 7 月 18 日开标，并经评标委员会评审，已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：大写：玖拾叁万零贰佰柒拾柒元叁角壹分

小写：930277.31 元

其中安全文明施工费：大写：叁万肆仟玖佰玖拾贰元玖角整

小写：34992.90 元

工　　期：60 日历天

质量标准：达到国家或行业现行的验收合格标准

项目经理：

请你方在接到本通知书后的 30 日内到定州市砖路镇丁村村民委员会与我方签订施工总承包合同。

招　标　人：定州市砖路镇丁村村民委员会（盖章）

招标代理机构：河北蓝城工程项目管理咨询有限公司（盖章）

2025 年 8 月 4 日

工程施工合同

本合同由甲乙两方于2023年8月29日在定州市砖路镇丁村村民委员会签署。

甲方(发包方):定州市砖路镇丁村村民委员会

乙方(承包方):

(本合同以下条款中，甲乙两方合称“双方”)

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商一致，签订合同前乙方需交给甲方履约保证金保函或打款至甲方账户（保证金额为工程总价10%）就定州市砖路镇丁村道路硬化项目成协议，供双方共同遵守。

1工程概况

1.1 工程地点：定州市砖路镇丁村村东村北外环路。

1.2 工程内容：定州市砖路镇丁村环村路硬化工程施工项目。

1.3 承包范围：包工包料包机械。

1.4承包方式：包工包料包机械以及水电。

2 工程质量

2.1 本工程质量应达到国家、河北省或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。

2.2 约定标准：合格

2.3 工程质保期：一年(自工程竣工验收合格之日起计算)。

3 工期

3.1 总工期：90 日 (自合同签订之日起90日历天)

3.2开工日期：2025年9月8日。

3.3 竣工日期：2025年12月8日。

3.4工期顺延

3.4.1 发生以下情况的，经甲方书面同意，工期顺延：

(1)甲方未能按合同约定提供开工条件的。

(2)工程量增加、设计变更的。

(3)由于非乙方原因停水停电连续8小时以上不能施工的。

(4)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

3.4.2 出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。

4工程价款

4.1.1工程总价款为¥:环村路清理表土15公分（1719.9立方），石灰稳定土15公分压实夯实（含白灰量15%，11466平方），混凝土浇筑厚度18公分，总面积10192平米，实心砖墙约48立方米，安全生产文明施工费及其他总金额：930277.31元，大写：玖拾叁万零贰佰柒拾柒元叁角壹分（据实结算）。

4.1.2各分项单价：各分项单价：混凝土地面（包含工料设备）：52.45元/平米，清理表土：3.96元/立方，石灰稳定土：19.31元/平方，原土碾压夯实：2.08元/平方，实心砖墙：48元/立方。（参考投标文件）

(工程价款包含材料费、人工费、安装费、机械费，税费等)。

4.2价款支付

4.2.1本工程验收合格后，乙方须向甲方开具等额真实合法有效的普通发票，否则甲方有权拒绝支付且不承担任何责任。甲方在收到发票

后以 转账的方式支付给乙方约定的工程款，工程款按照周期结合施工进度付款按照15天为一周期以实际施工工程量付款，付款金额为验收实际工程量的70%，完工后付款实际完成工程量的80%及取回履约保证金，经验收合格及结算完成后付款至完成量的95%。甲方付款时按照乙方提供的人工工资表，材料表，机械费表分批次付款，完成付款后乙方提供的收款回执清单。

4.2.2 结算：工程验收后15日内，甲方支付乙方合同总价的95%。 质保金：质保期结束15日内结清剩余工程总价的5%。

4.3本工程为单价合同，竣工结算按实际工程量及合同单价进行结算。结算依据有已标价的工程量清单、图纸及合同，未有相同项目的参照《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》（2012年）三类取费

5甲乙双方权利与义务

5.1 甲方权利与义务

5.1.1有权监督乙方履行本合同义务，并就其不符合合同约定或甲方要求的 行为提出整改意见，当发现乙方存在违约情况时，有权直接要求乙方按照合同约 定承担违约责任。

5.1.2 有权对工程施工全过程进行监督、检查；并有权参与工程各阶段的验 收工作，并就验收结果提出异议。有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材 料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

5.1.3 甲方认为乙方派驻本工程的项目经理或其他工作人员不符合要求或 不能胜任的，有权要求乙方撤换，乙方应当在接到甲方书面通知的1日内更换符 合相应资质的人员。

5.2 乙方权利与义务

5.2.1应当根据工程需要派驻具备相应资质的本工程施工场地的代表，确需 撤换的，应提前7日书面通知甲方，甲方同意的，可进行撤换，但撤换后新代表的权责不变。

5.2.2 乙方应制定并组织落实施工进度计划，确保按照约定的工期完成。

5.2.3 乙方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护 和安全生产等管理规定，并承担由此引起的一切经济及法律责任。

5.2.4安全施工

5.2.4.1 乙方应按有关规定，严格做好安全防护和防火措施，施工过程中如发生施工失误导致的住房和墙体等毁坏现象承担由于管 理不善造成的人员及财产损失。

5.2.4.2发生伤亡事故，乙方应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政 府有关部门的要求处理。事故引发的费用由责任方承担。

5.2.4.3 乙方负责按工程及安全需要提供看守和警卫乙方所有材料机械等自行保管，甲方概不负责。维修施工使用的照 明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临 时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护 费用由乙方承担。

5.2.4.4在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，应制定专用安全和防火措 施，以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意。

5.2.4.5已竣工工程在未正式交付甲方之前，乙方应负责工程成品保护工作， 工程满足交付使用条件后，由乙方向甲方履行交付义务、工程质量保修义务等。

5.2.4.6乙方负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

6工程结算

经甲方验收合格后，应在15日内支付结算价款。

7违约责任

7.1 由于乙方原因延误工期的，每延误一日，乙方应向甲方支付人民币壹仟 元整(¥:1000元)违约金；逾期超过十五日的，甲方有权单方解除本合同，甲 方可于应付未付款中扣除该部分款项。

7.2 由于乙方原因导致工程质量不达标的，乙方对工程质量不合格的部位应 进行彻底返工修理，对质量不达标的应进行全面综合治理，并承担全部费用，因 上述原因给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。由于以上原因造成工程延期 交付的视同延误工期。

7.3乙方施工质量未达到合同约定标准的，乙方应当无条件进行返工直至达 到合同约定标准，因此导致的工期延误责任由乙方承担。如返修后仍未达到合同 约定标准，甲方有权拒付工程款并视乙方违约情况决定是否解除合同，因此造成 甲方遭受损失的乙方应当承担全部赔偿责任。质保期内如乙方未履行质保责任， 甲方有权扣除质保金，如造成的损失超出质保金的，乙方还应当承担赔偿责任。

7.4违约方承担违约责任后，除符合以下情况而中止合同外，应继续履行 合同，以保持工程的连续性和已施工程的完好：

(1)甲乙双方协议停止施工。

(2)调解要求停止施工。

(3)仲裁要求停止施工。

(4)法院要求停止施工。

8 其他：有关保险、担保、保修等内容，甲乙双方可以书面形式另行约定， 作为本合同附件。

9不可抗力： 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全 部免除责任，但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，以减轻可能给他方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。

10 争议解决方式：因履行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决或申请 调解解决；协商或调解解决不成的，双方均有权向合同签订地有管辖权的人民法 院提起诉讼。

11 合同签订地： 定州市砖路镇丁村村民委员会

12. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 专用合同条款及其附件

(2) 中标通知书(如果有)；

(3) 投标函及其附录(如果有)；

(4) 通用合同条数；

(5) 技术标准和要求；

(6) 图纸；

(7) 已标价工程量清单戏预算书：

13合同的生效：本合同自甲乙双方盖章之日起生效。本合同正本一式肆份， 甲方贰份、乙方贰份。

甲方(盖章)：

定州市砖 会 四川霖冠

法定代 法定代表人

八、需要提供的其他投标资料

需要提供的其他投标资料：

8.1 营业执照

8.2 资质证书

8.3 安全生产许可证

8.4 基本账户信息

8.5 信用截图

8.6 投标保证金

8.7 智慧建筑平台相关截图

8.8 进粤平台截图

8.1 营业执照

统一社会信用代码

91510704MA6APP8P7C

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　四川霖冠建筑工程有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人独资)

法定代表人

经营范围　电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分生活垃圾经营性服务；公路管理与养护；特运）；住宅室内装饰装修；燃气燃烧器具安计；建设工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属门窗工程施工；机械设备租赁；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；土地整治服务；市政设施管理；电气设备修理；通用设备修理；建筑材料销售；物业管理；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；特种设备销售；建筑用钢筋产品销售；保温材料销售；润滑油销售；汽车零配件零售；普通机械设备安装服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；专业保洁、清洗、消毒服务；广告制作；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；信息系统集成服务；地质灾害治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　贰仟万元整

成立日期　2020年09月08日

住　　所　成都市青羊区西货站路6号南塔13层1305号

登记机关　成都市青羊区行政审批局

2024 年 8 月 21 日

国家企业信用信息公示系统网址：http//www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

8.2 资质证书

建筑业企业资质证书

企 业 名 称： 四川霖冠建筑工程有限公司

详 细 地 址： 成都市青羊区西货站路6号南塔13层1305号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）： [illegible]7C **经 济 性 质：** 有限责任公司(自然人独资)

证 书 编 号： **有 效 期：** 至2030年01月24日

法定代表人：

资质类别及等级：

石油化工工程施工总承包二级；建筑工程施工总承包二级；机电工程施工总承包二级；电力工程施工总承包二级；水利水电工程施工总承包二级；市政公用工程施工总承包二级；地基基础工程专业承包二级；钢结构工程专业承包二级；河湖整治工程专业承包二级；城市及道路照明工程专业承包二级；起重设备安装工程专业承包二级；环保工程专业承包二级；古建筑工程专业承包二级；输变电工程专业承包二级；建筑机电安装工程专业承包二级******

发证机关：

四川省住房和城乡建设厅

2023年1月24日

8.3 安全生产许可证

统一社会信用代码：91510704MA6APP8P7C

安全生产许可证

编号：（川）JZ安许证字[2022]012498

企 业 名 称：四川霖冠建筑工程有限公司

法 定 代 表

单 位 地

经 济 类 _

许 可 范 围：建筑施工

有 效 期：2025年06月09日 至 2028年06月09日

发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2025 年 06 月 09 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

8.4 基本账户信息

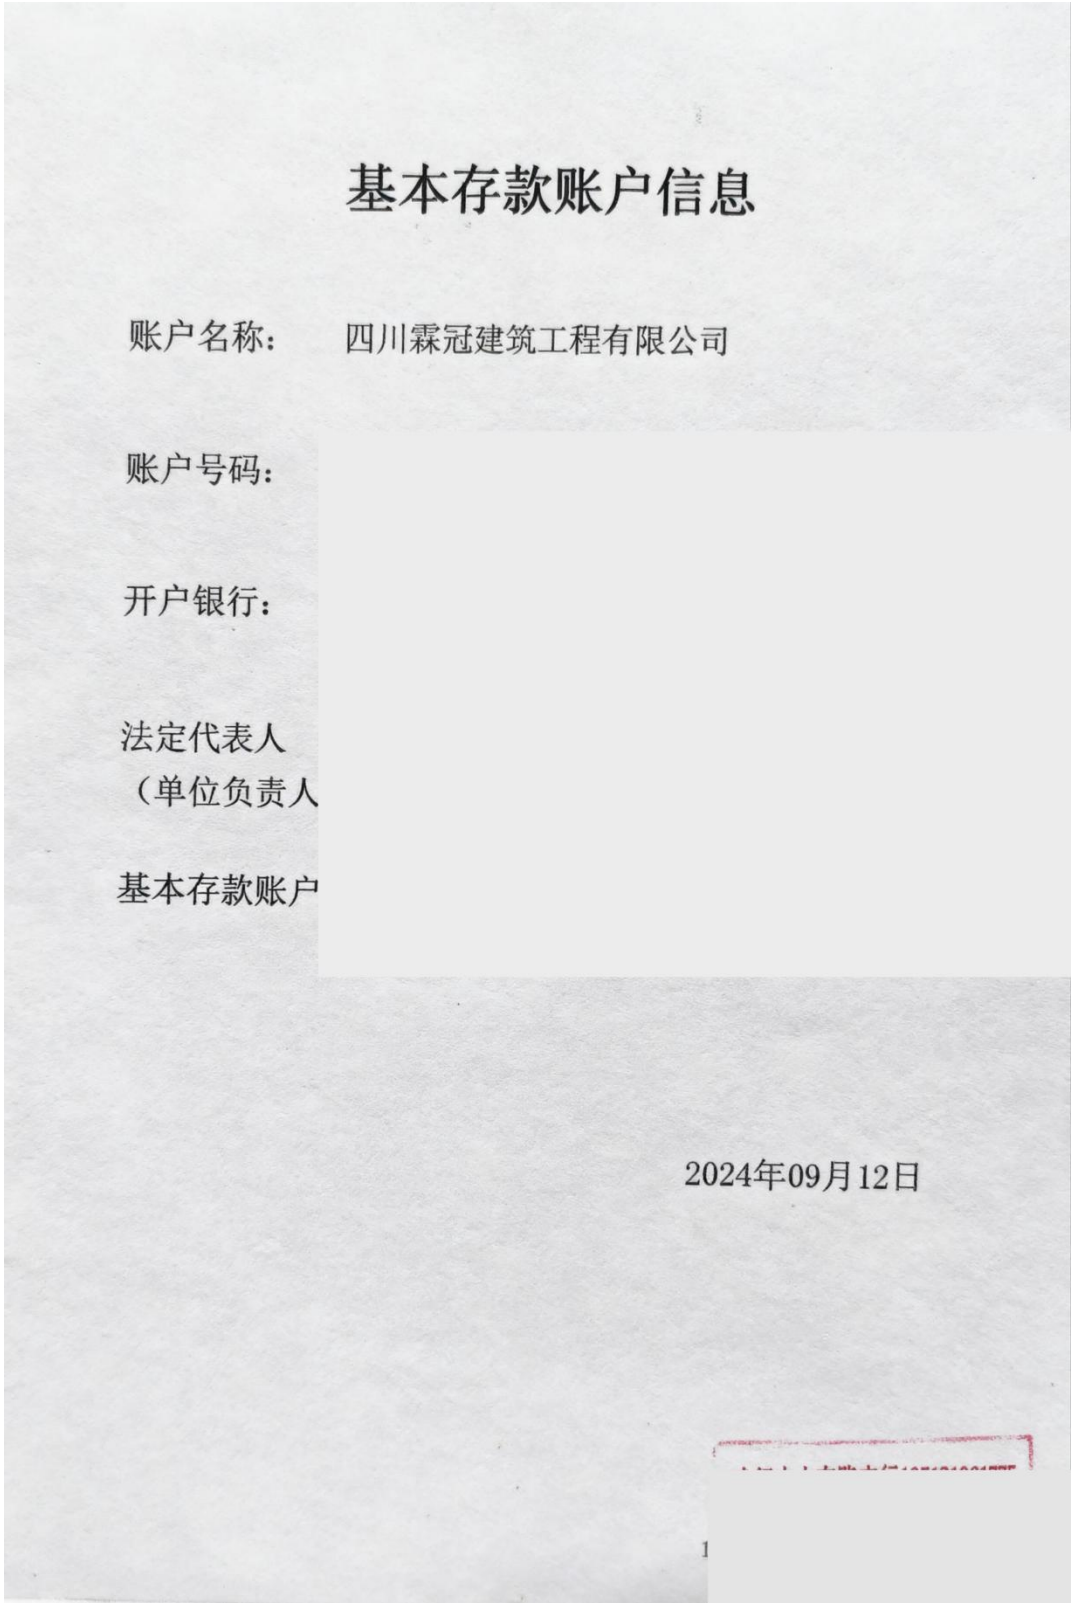

基本存款账户信息

账户名称：　四川霖冠建筑工程有限公司

账户号码：

开户银行：

法定代表人
（单位负责人

基本存款账户

2024年09月12日

8.5 信用截图

中国执行信息公开网
——司法为民 司法便民——
首页
执行公开服务
失信将受到信用惩戒！
失信被执行人(自然人)公布
姓名/名称
证件号码
失信被执行人(法人或其他组织)公布
姓名/名称
证件号码
查询条件
被执行人姓名/名称:
四川霖冠建筑工程有限公司
身份证号码/组织机构代码:
需完整填写
省份:
----------全部----------
验证码:
nwxf
NWXf
验证码正确!
查询
查询结果
在全国范围内没有找到 四川霖冠建筑工程有限公司相关的结果.
全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页
声明
限制高消费令
为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会公众通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：
一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。
二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。
国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。
三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。
被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。
四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。
五、本网站提供的信息仅供查阅人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。
六、查阅人必须依法使用查阅信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。
七、本网站信息查阅免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。
八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。
九、如对该查阅内容有异议，请与执行法院联系。
最高人民法院
2013年10月8日
地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号

8.6 投标保证金

阳光保险集团 财产保险
Sunshine Insurance Group P&C Insurance

阳光财产保险股份有限公司
投标履约保证保险保险单

保险单 0

鉴于投保人已向本公司递交了投保申请及附件，并已交纳了保险费，本公司依照承保险种及对应条款和特别约定，根据《中华人民共和国保险法》及投保人的要求，同意按下列条件订立本保险合同。

一、投保人：			
投保人名称：	四川霖冠建筑工程有限公司		
地址：	四川省-成都市-青羊区		
联系人：		联系电话：	
二、被保险人			
被保险人名称：	PUhugcv9gaME7Uz6MPyoAxrDmgLHcFLt2/Rzn/YTJKQSghK10JIL9XQHvUuZLVmb		
三、招标项目			
标段名称：	PUhugcv9gaME7Uz6MPyoA2gy/09uKAOuH9JdkBZvwfA444LkBTWnUnB2EVI6xr4imx7+rVFym2PhQYpEtFqITg==		
标段编号：	VvgKMArIgYdzBbpjJ6AEhm2SF37RyurJzmuucbKGIOk=		
四、保险合同要素摘要表			
保险条款	保险责任	保险金额	免赔率
阳光财产保险股份有限公司投标履约保证保险（2023版）条款	投标履约保证保险	80,000.00	0.0
保险费合计：300.00元(不含税保费:283.02元,增值税:16.98元)			
保险期限：	自2025-10-10 09:30:00至2026-04-08 09:30:00止		
五、争议处理			
诉讼			
六、特别约定			

一、投标保证保险的承保期间内，投保人在接受本投标保证保险时，视为已了解本保险公司的保险条款。二、如果出现下列情形之一给被保险人造成经济损失的，被保险人可以向我方提起索赔：

1、投保人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、投保人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署项目合同；

3、投保人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

4、投保人在投标过程中提供虚假材料或有其他违规行为的。三、保险人向被保险人赔偿后，保险人享有向投保人追偿的权利。四、在本保单的有效期内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，凭本保单正本原件，3个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向被保险人支付索赔款，直至本保证保险的最高保险金额。五、被保险人的索赔通知必须在投标保证保险的保险期间内送达我方。六、本投标保证保险项下的权利义务不得转让。七、本投标保证保险的保险期间届满，或我方已向被保险人支付本保证保险的保险金额，我方的保险责任终止。八、本投标保证保险适用适用中华人民共和国法律。九、本投标保证保险以中文文本为准，涂改无效。

七、明示告知	

1、本保险合同由保险单、保险条款、声明、批注及与本合同有关的投保单、变更申请、体检报告书及书面约定共同构成，任何口头或非书面约定均无法律效力。

2、请确认保险人已向您明确说明保险责任、责任免除、投保人、被保险人权利与义务、理赔程序及理赔材料等保险条款内容，特别对其中的保险人免责条款，您已充分理解且无异议。

3、收到本保险单后，请您仔细核对，如有错漏或与投保实际不符，请您立即通知本公司进行书面批改更正，其他方式的更改无效。

4、若发生保险事故，请您和本保险有关的人员在保险条款规定的时间内及时通知本公司。

5、保单查询方式提示：本保险单自签发（激活）之日起，可拨打全国统一客服专线95510查询保险单信息，并可在签发（激活）2日后，进入公司网站www.sinosig.com查询保险单信息。

保险
地址
电话
签发

1000
人(签章)：
专用章

8.7 智慧建筑平台相关截图

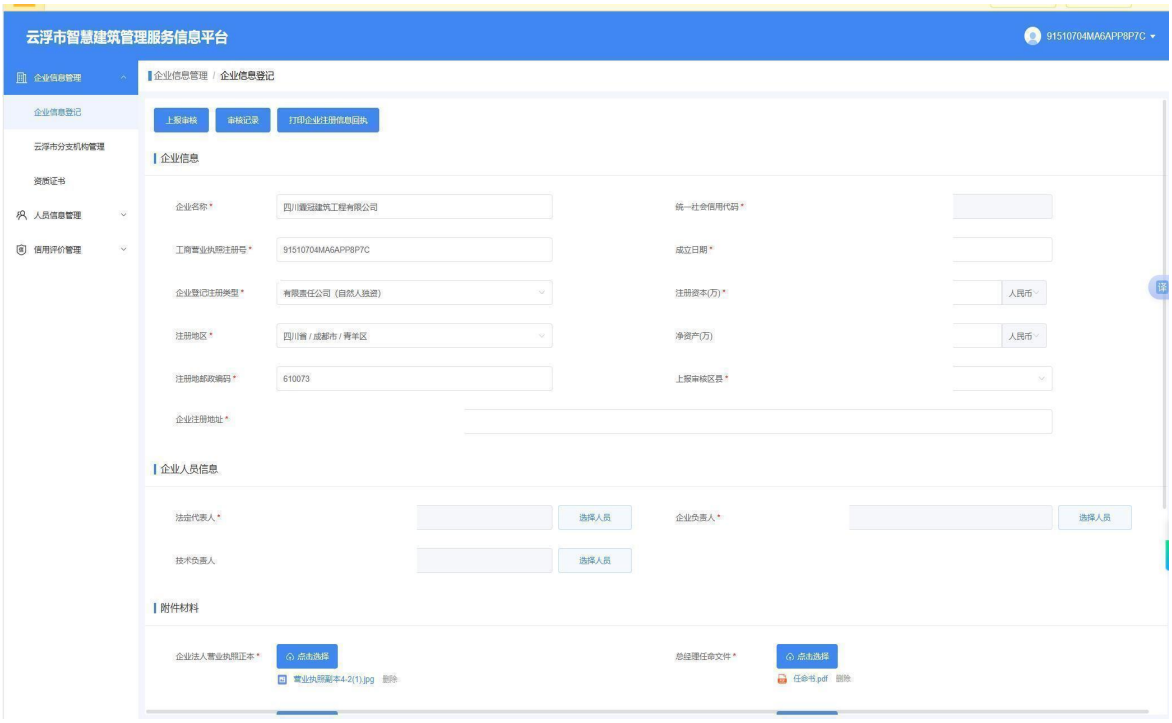

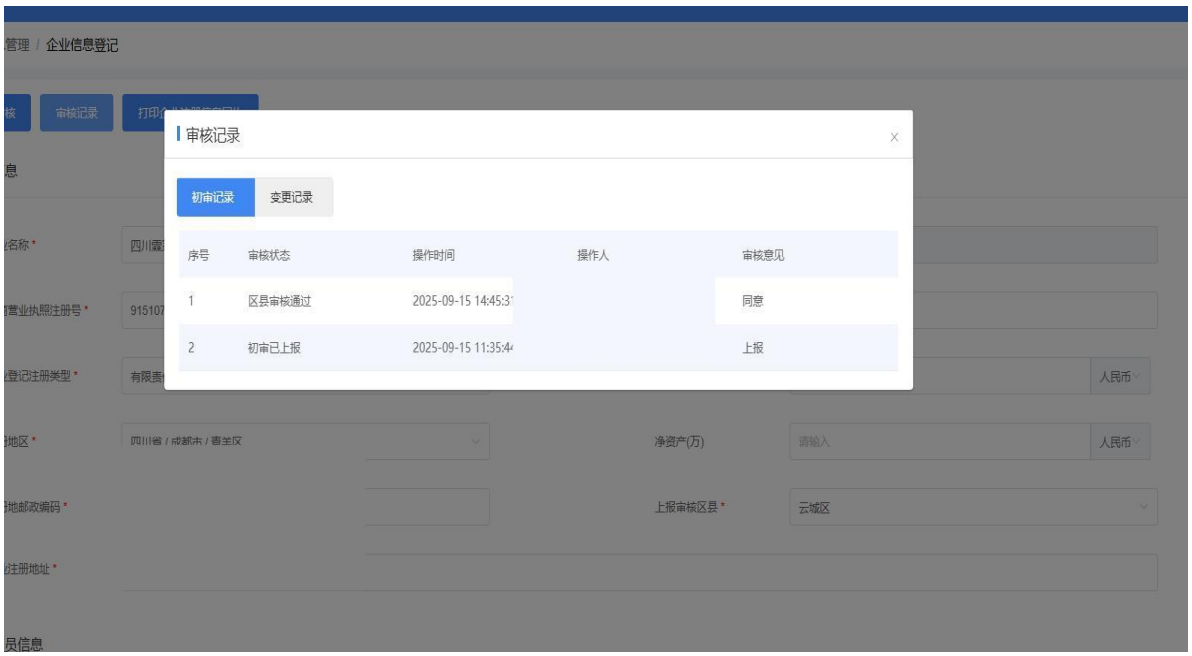

企业信息注册回执证明

企业名称：四川霖铭建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91510704MA6APP8P7C

信用评分：60

信用等级：A

打印日期：2025-10-02 23:45:04

云浮市智慧建筑管理服务信息平台
首页
政策文件
企业信用
个人信用
企业良好信用
企业不良信用
黑名单
企业名称
四川震冠建筑工程有限公司
企业类型
评价年度
评价月度
信用等级
查询
重置
序号
企业名称
统一社会信用代码
企业类型
评价年度
评价月度
等级
评分
1
四川震冠建筑工程有限公司
2025
9
A
60
共 1 条
10条/页
前往
1
页
系统入口
操作手册
黑红名单

8.8 进粤平台截图

https://jydj.gdcic.net/?t=3200000000998f775f01999026022900f3#/platform
进粤企业和人员诚信信息登记平台
欢迎您，四川霸冠建筑工程有限公司
访问管理中心
退出
已登记企业查询
办事进度查询
进粤企业来源分布
企业名称：
四川霸冠建筑工程有限公司
登记状态：
正常登记
暂停登记
资质类型：
建筑施工
工程设计与施工一体化
工程监理
工程勘察
工程造价咨询
工程招标代理
园林绿化
施工图设计文件审查
人防设计
人防监理
查找
管理办法
办事指南
帮助中心
操作指引
在线咨询
已登记企业
企业名称
法定代表人
技术负责人
驻粤负责人
登记状态
已登记人数
正常登记
13
共有 1 条数据
10 条/页

https://jydj.gdcic.net/?t=3200000000998f775f01999026022900f3#/home
查看企业信息
企业办事情况
企业基本信息
企业资质情况
分支机构信息
进粤人员信息
企业基本信息
企业名称
四川霸冠建筑工程有限公司
统一社会信用代码
91510704MA6APP8P7C
营业执照注册号
注册资本
人民币:2000万元
注册时间
2020-09-08
成立时间
邮政编码
注册地
四川省/绵阳市
注册详细地址
基本存款账户开户银行
开户账号
登记类型
登记状态
正常登记
安全生产许可证号
证书到期时间
2028-06-09 14:48:55
发证机关
四川省住房和城乡建设厅
法定代表人
姓名
证件类型
身份证
证件号码
职务
总经理
职称
联系电话
技术负责人
姓名
董雷
证件类型
身份证
证件号码
职务
技术负责人
职称

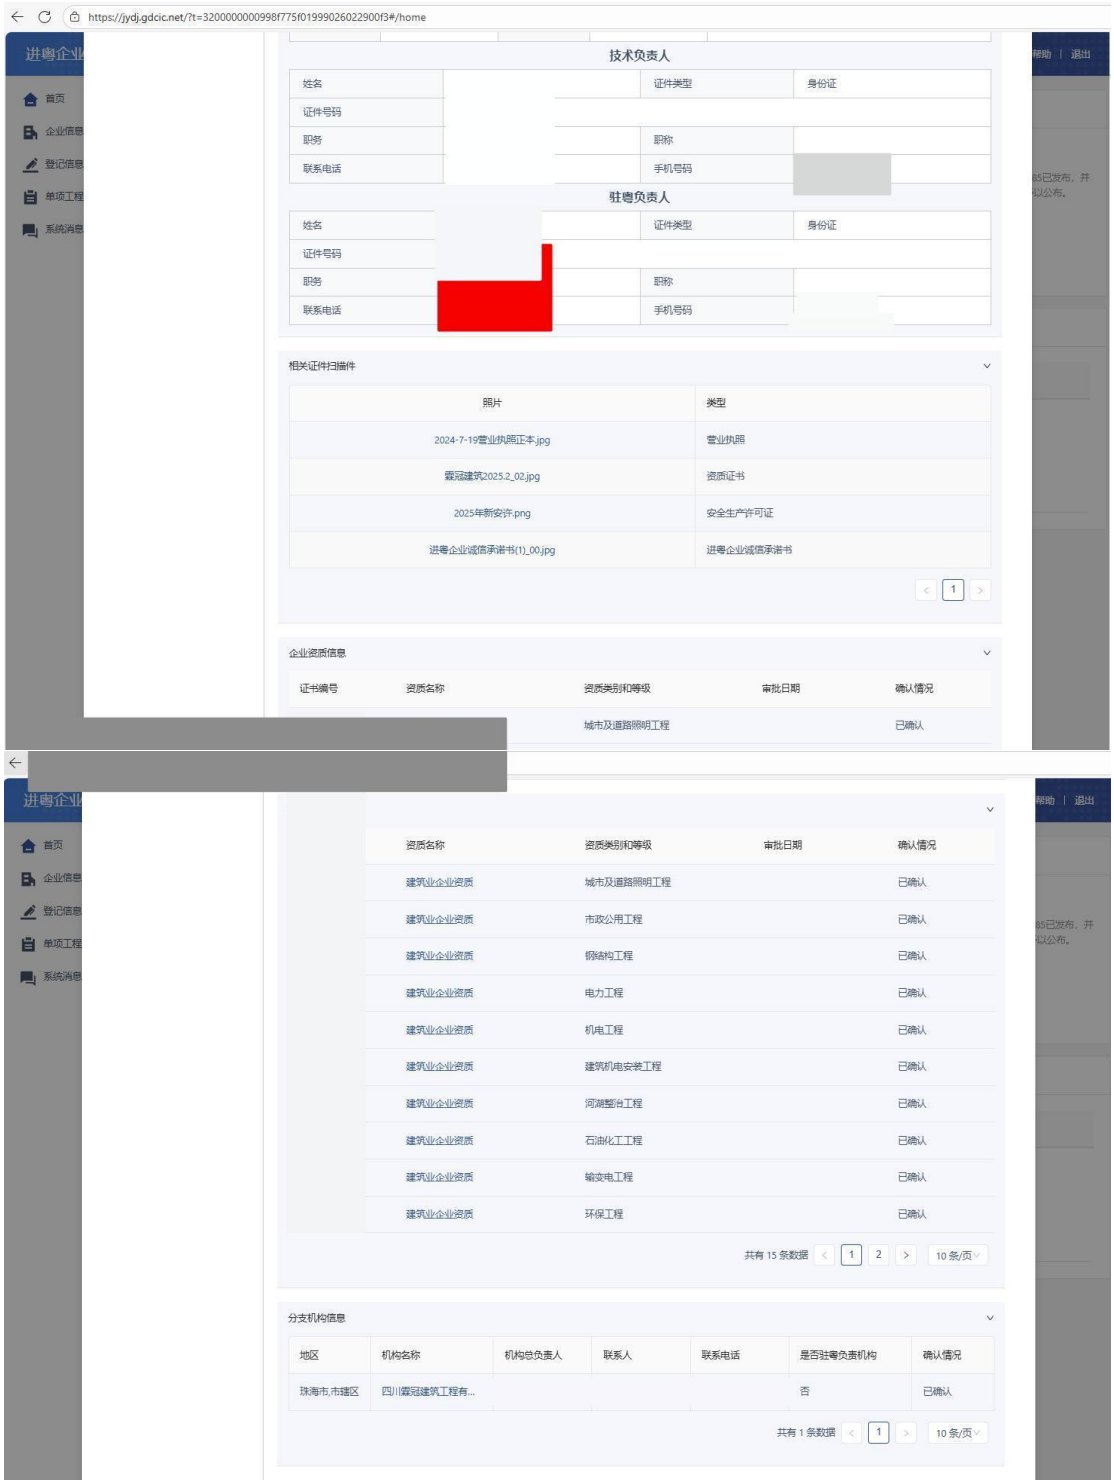
https://jydj.gdcic.net/?t=32000000009981775f01999026022900f3#/home
进粤企业
帮助 | 退出
首页
企业信息
登记信息
单项工程
系统消息
技术负责人
姓名
证件类型
身份证
证件号码
职务
职称
联系电话
手机号码
驻粤负责人
姓名
证件类型
身份证
证件号码
职务
职称
联系电话
手机号码
相关证件扫描件
照片
类型
2024-7-19营业执照正本.jpg
营业执照
霖冠建筑2025.2_02.jpg
资质证书
2025年新安许.png
安全生产许可证
进粤企业诚信承诺书(1)_00.jpg
进粤企业诚信承诺书
企业资质信息
证书编号
资质名称
资质类别和等级
审批日期
确认情况
城市及道路照明工程
已确认
资质名称
资质类别和等级
审批日期
确认情况
建筑业企业资质
城市及道路照明工程
已确认
建筑业企业资质
市政公用工程
已确认
建筑业企业资质
钢结构工程
已确认
建筑业企业资质
电力工程
已确认
建筑业企业资质
机电工程
已确认
建筑业企业资质
建筑机电安装工程
已确认
建筑业企业资质
河湖整治工程
已确认
建筑业企业资质
石油化工工程
已确认
建筑业企业资质
输变电工程
已确认
建筑业企业资质
环保工程
已确认
共有 15 条数据
10 条/页
分支机构信息
地区
机构名称
机构总负责人
联系人
联系电话
是否驻粤负责机构
确认情况
珠海市,市辖区
四川霖冠建筑工程有...
否
已确认
共有 1 条数据
10 条/页

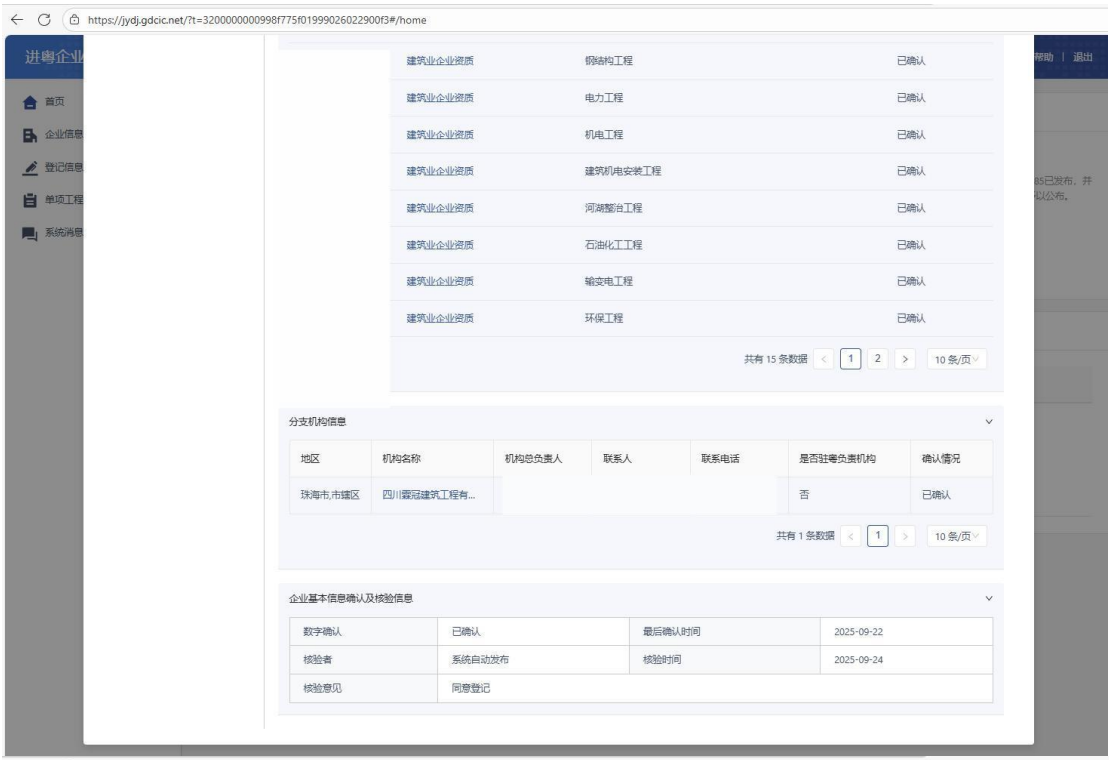
https://jydj.gdcic.net/?t=3200000000998f775f01999026022900f3#/home
进粤企业
首页
企业信息
登记信息
单项工程
系统消息
帮助 | 退出
建筑业企业资质 钢结构工程 已确认
建筑业企业资质 电力工程 已确认
建筑业企业资质 机电工程 已确认
建筑业企业资质 建筑机电安装工程 已确认
建筑业企业资质 河湖整治工程 已确认
建筑业企业资质 石油化工工程 已确认
建筑业企业资质 输变电工程 已确认
建筑业企业资质 环保工程 已确认
共有 15 条数据 1 2 10 条/页
分支机构信息
地区 机构名称 机构总负责人 联系人 联系电话 是否驻粤负责机构 确认情况
珠海市,市辖区 四川蜀冠建筑工程有... 否 已确认
共有 1 条数据 1 10 条/页
企业基本信息确认及核验信息
数字确认 已确认 最后确认时间 2025-09-22
核验者 系统自动发布 核验时间 2025-09-24
核验意见 同意登记

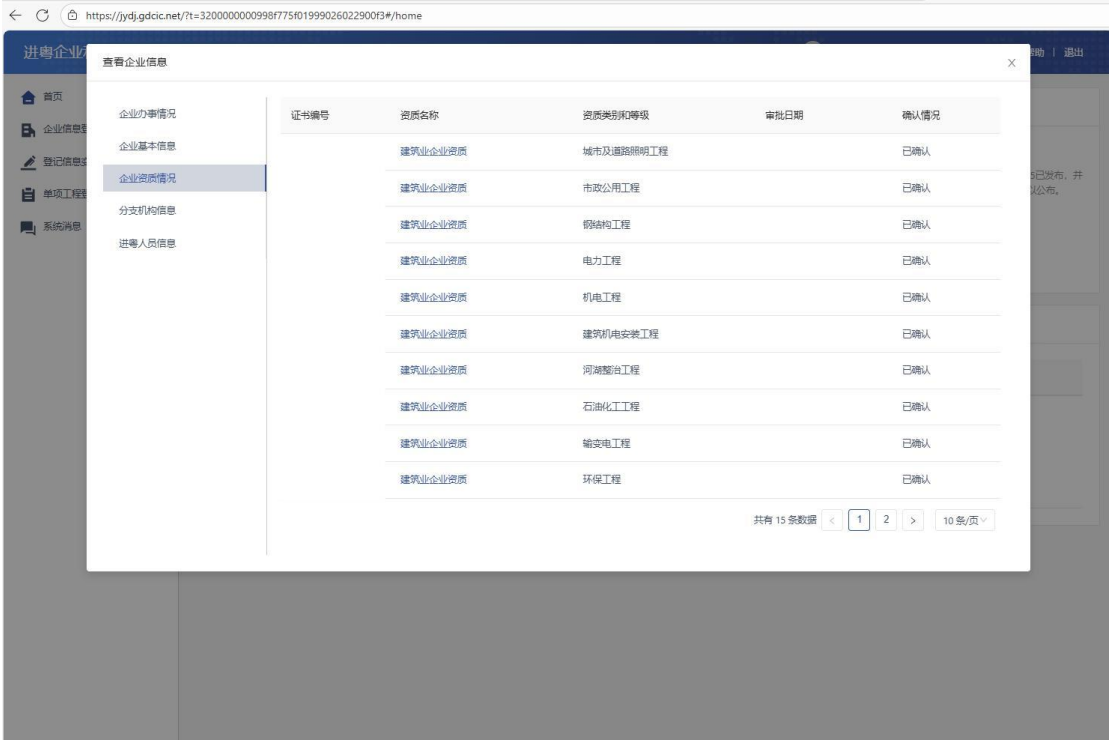
https://jydj.gdcic.net/?t=3200000000998f775f01999026022900f3#/home
进粤企业
帮助 | 退出
首页
企业信息
登记信息
单项工程
系统消息
查看企业信息
企业办事情况
企业基本信息
企业资质情况
分支机构信息
进粤人员信息
证书编号 资质名称 资质类别和等级 审批日期 确认情况
建筑业企业资质 城市及道路照明工程 已确认
建筑业企业资质 市政公用工程 已确认
建筑业企业资质 钢结构工程 已确认
建筑业企业资质 电力工程 已确认
建筑业企业资质 机电工程 已确认
建筑业企业资质 建筑机电安装工程 已确认
建筑业企业资质 河湖整治工程 已确认
建筑业企业资质 石油化工工程 已确认
建筑业企业资质 输变电工程 已确认
建筑业企业资质 环保工程 已确认
共有 15 条数据 1 2 10 条/页

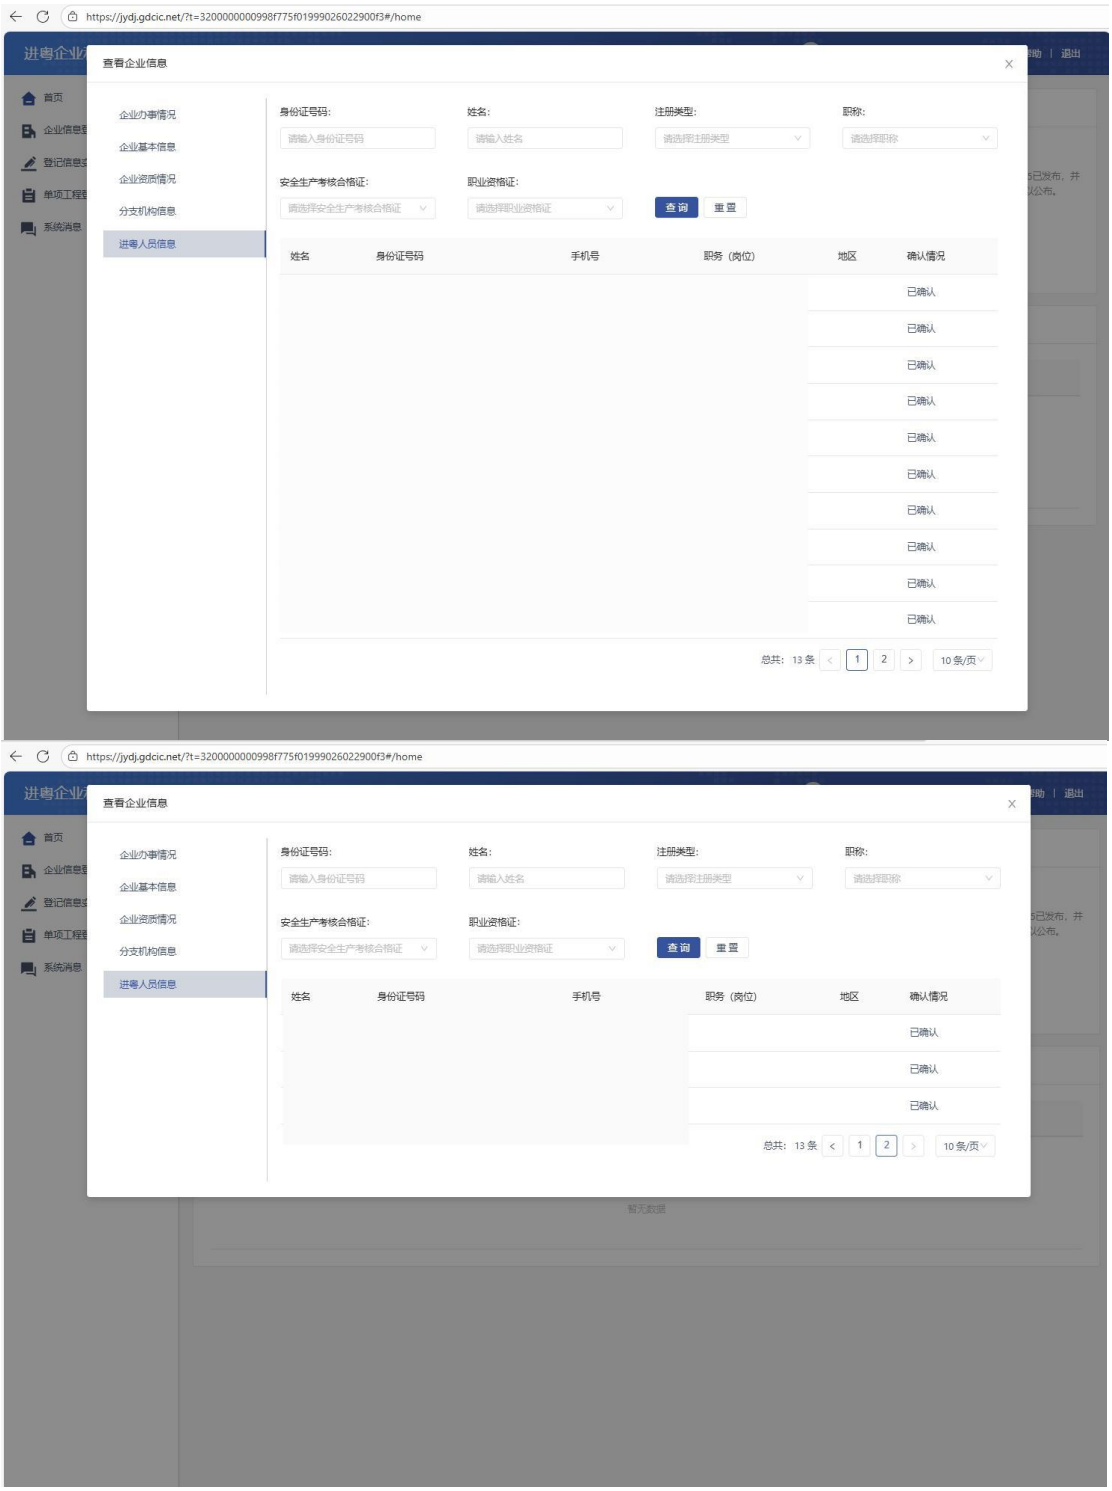
https://jydj.gdcic.net/?t=3200000000998f775f01999026022900f3#/home
进粤企业
首页
企业信息
登记信息
单项工程
系统消息
帮助 | 退出
查看企业信息
企业办事情况
企业基本信息
企业资质情况
分支机构信息
进粤人员信息
身份证号码:
请输入身份证号码
姓名:
请输入姓名
注册类型:
请选择注册类型
职称:
请选择职称
安全生产考核合格证:
请选择安全生产考核合格证
职业资格证:
请选择职业资格证
查询
重置
姓名
身份证号码
手机号
职务（岗位）
地区
确认情况
已确认
总共：13 条
1
2
10 条/页

https://jydj.gdcic.net/?t=3200000000998f775f01999026022900f3#/home
进粤企业
首页
企业信息
登记信息
单项工程
系统消息
帮助 | 退出
查看企业信息
企业办事情况
企业基本信息
企业资质情况
分支机构信息
进粤人员信息
身份证号码:
请输入身份证号码
姓名:
请输入姓名
注册类型:
请选择注册类型
职称:
请选择职称
安全生产考核合格证:
请选择安全生产考核合格证
职业资格证:
请选择职业资格证
查询
重置
姓名
身份证号码
手机号
职务（岗位）
地区
确认情况
已确认
总共：13 条
1
2
10 条/页
暂无数据

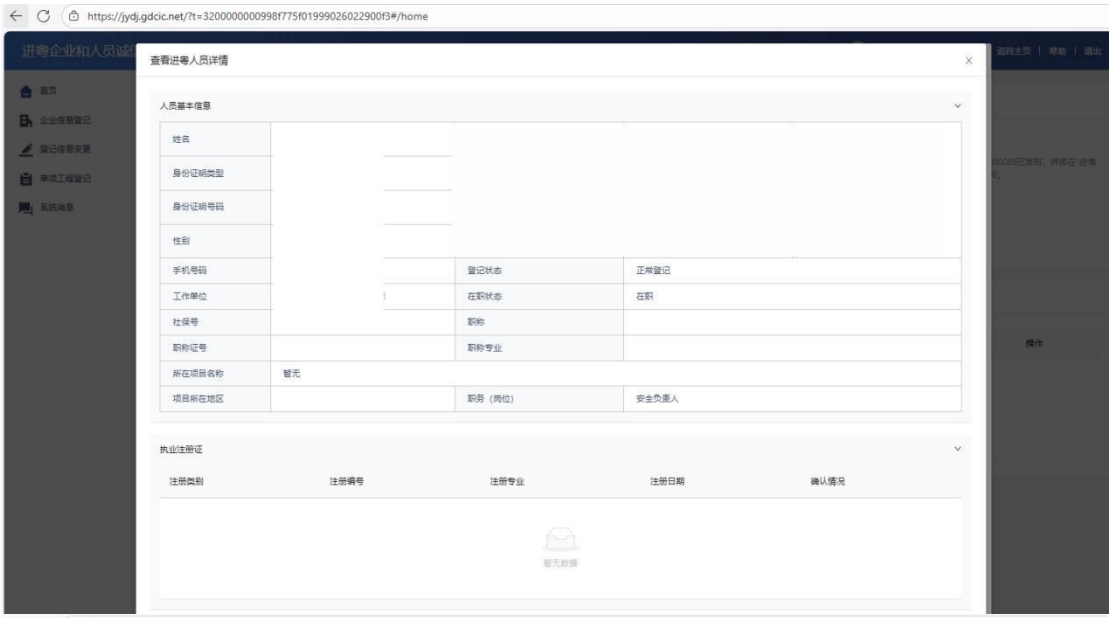
https://jydj.gdcic.net/?t=3200000000998f775f01999026022900f3#/home
查看进粤人员详情
人员基本信息
姓名
身份证明类型
身份证明号码
性别
手机号码
登记状态
正常登记
工作单位
在职状态
在职
社保号
职称
职称证号
职称专业
所在项目名称
暂无
项目所在地区
职务（岗位）
安全负责人
执业注册证
注册类别
注册编号
注册专业
注册日期
确认情况
暂无数据

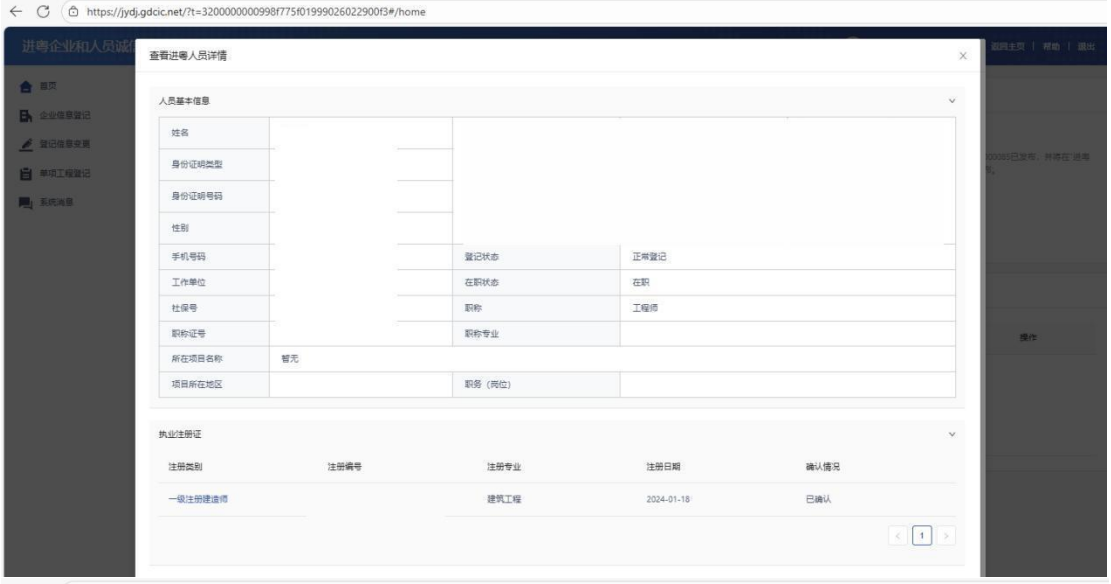
https://jydj.gdcic.net/?t=3200000000998f775f01999026022900f3#/home
查看进粤人员详情
人员基本信息
姓名
身份证明类型
身份证明号码
性别
手机号码
登记状态
正常登记
工作单位
在职状态
在职
社保号
职称
工程师
职称证号
职称专业
所在项目名称
暂无
项目所在地区
职务（岗位）
执业注册证
注册类别
注册编号
注册专业
注册日期
确认情况
一级注册建造师
建筑工程
2024-01-18
已确认

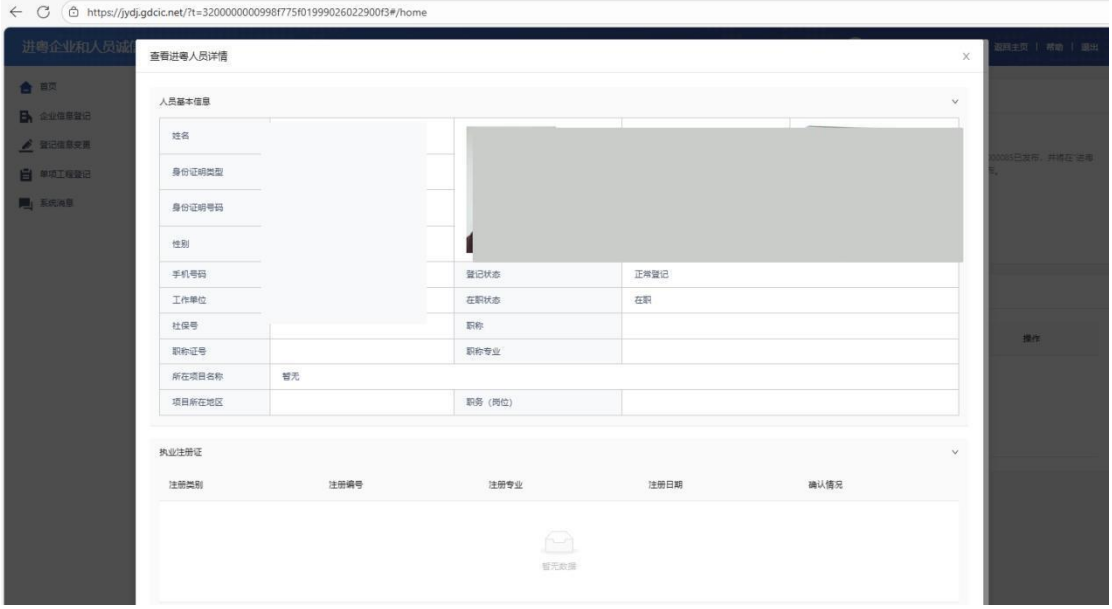
https://jydj.gdcic.net/?t=3200000000998f775f01999026022900f3#/home
查看进粤人员详情
人员基本信息
姓名
身份证明类型
身份证明号码
性别
手机号码
登记状态
正常登记
工作单位
在职状态
在职
社保号
职称
职称证号
职称专业
所在项目名称
暂无
项目所在地区
职务（岗位）
执业注册证
注册类别
注册编号
注册专业
注册日期
确认情况
暂无数据

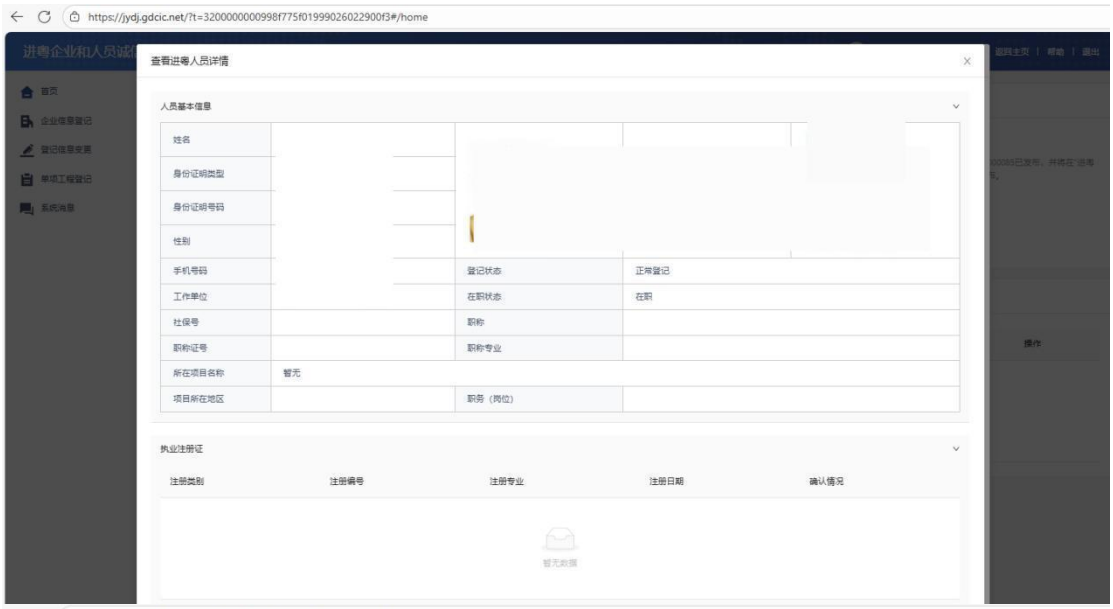
https://jydj.gdcic.net/?t=3200000000998f775f01999026022900f3#/home
进粤企业和人员诚
查看进粤人员详情
人员基本信息
姓名
身份证明类型
身份证明号码
性别
手机号码
登记状态
正常登记
工作单位
在职状态
在职
社保号
职称
职称证号
职称专业
所在项目名称
暂无
项目所在地区
职务（岗位）
执业注册证
注册类别
注册编号
注册专业
注册日期
确认情况
暂无数据

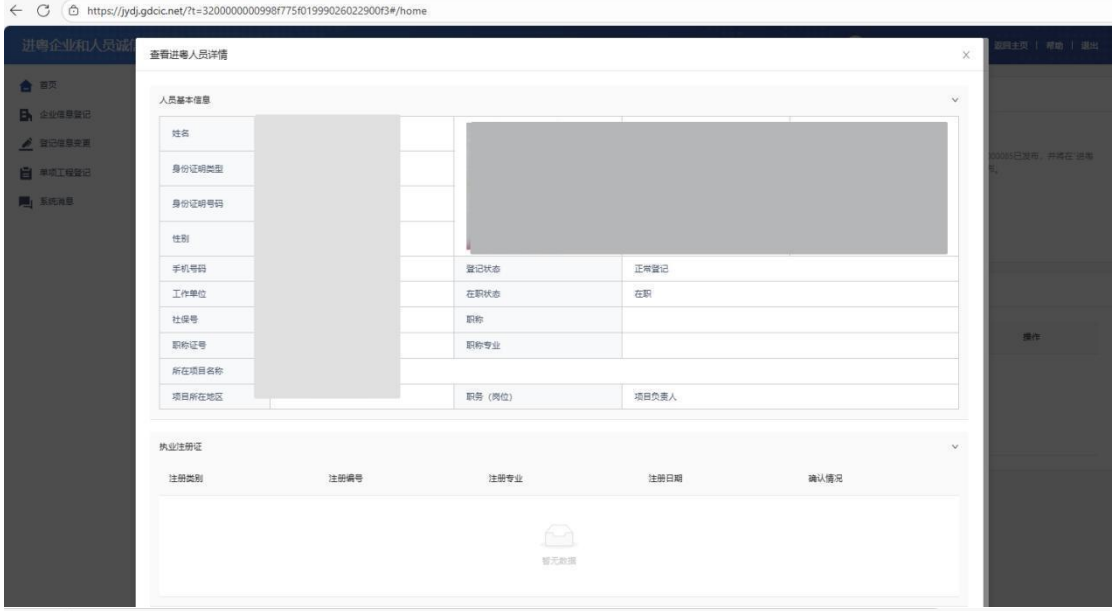
https://jydj.gdcic.net/?t=3200000000998f775f01999026022900f3#/home
进粤企业和人员诚
查看进粤人员详情
人员基本信息
姓名
身份证明类型
身份证明号码
性别
手机号码
登记状态
正常登记
工作单位
在职状态
在职
社保号
职称
职称证号
职称专业
所在项目名称
项目所在地区
职务（岗位）
项目负责人
执业注册证
注册类别
注册编号
注册专业
注册日期
确认情况
暂无数据

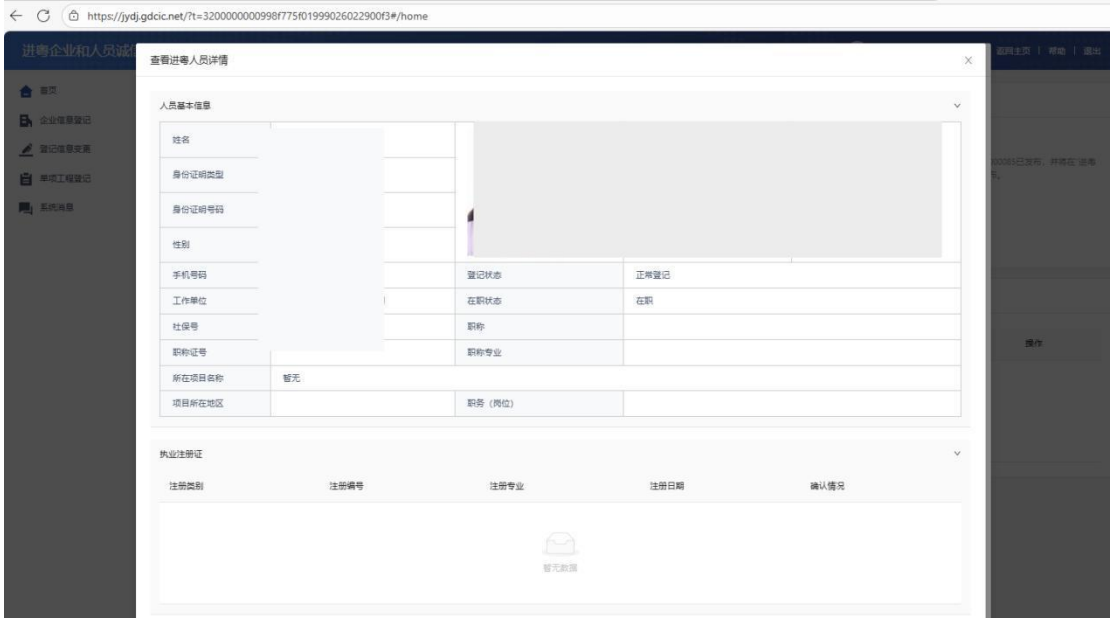
https://jydj.gdcic.net/?t=3200000000998f775f01999026022900f3#/home
进粤企业和人员诚
查看进粤人员详情
人员基本信息
姓名
身份证明类型
身份证明号码
性别
手机号码
登记状态
正常登记
工作单位
在职状态
在职
社保号
职称
职称证号
职称专业
所在项目名称
暂无
项目所在地区
职务（岗位）
执业注册证
注册类别
注册编号
注册专业
注册日期
确认情况
暂无数据

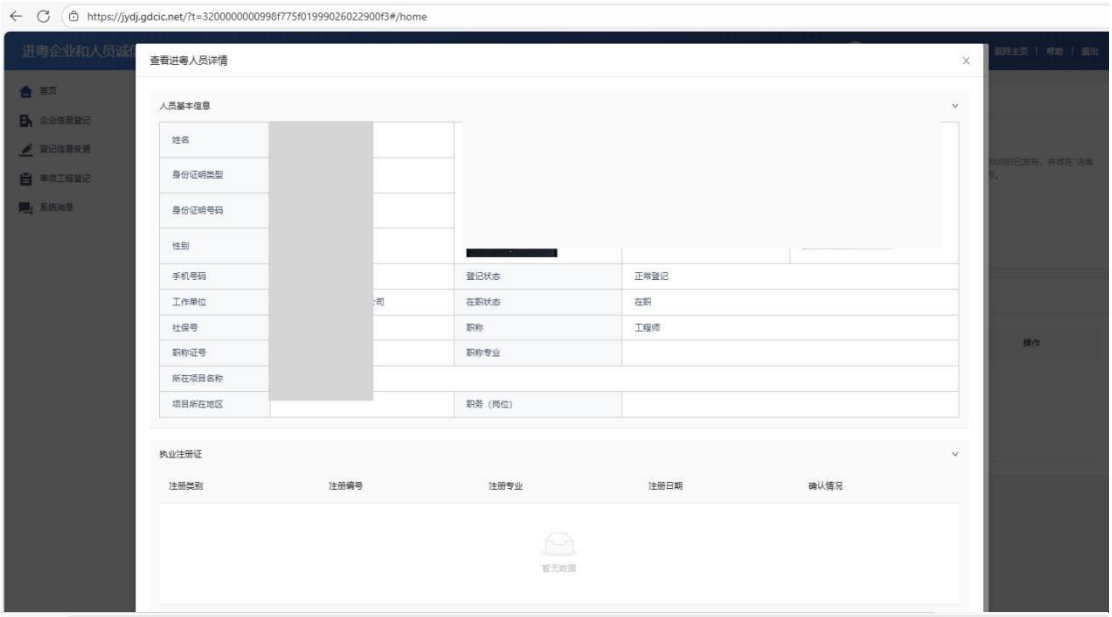
https://jydj.gdcic.net/?t=32000000009981775f019990260229003#/home
查看进粤人员详情
人员基本信息
姓名
身份证明类型
身份证明号码
性别
手机号码
登记状态
正常登记
工作单位
在职状态
在职
社保号
职称
工程师
职称证号
职称专业
所在项目名称
项目所在地区
职务（岗位）
执业注册证
注册类别
注册编号
注册专业
注册日期
确认情况
暂无数据

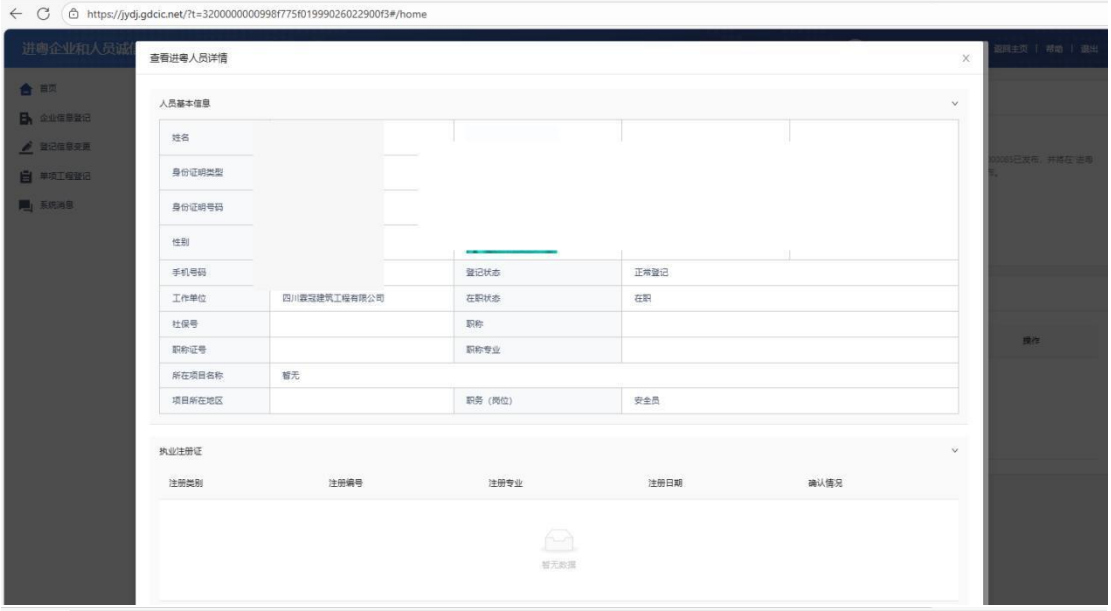
https://jydj.gdcic.net/?t=32000000009981775f019990260229003#/home
查看进粤人员详情
人员基本信息
姓名
身份证明类型
身份证明号码
性别
手机号码
登记状态
正常登记
工作单位
四川嘉冠建筑工程有限公司
在职状态
在职
社保号
职称
职称证号
职称专业
所在项目名称
暂无
项目所在地区
职务（岗位）
安全员
执业注册证
注册类别
注册编号
注册专业
注册日期
确认情况
暂无数据

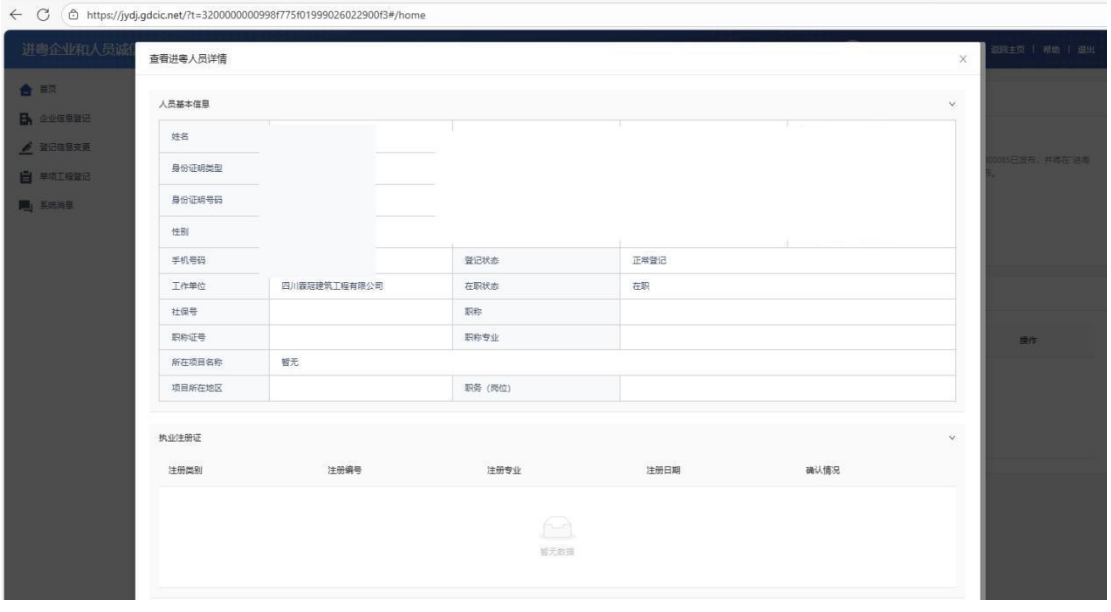
https://jydj.gdcic.net/?t=32000000009981775f019990260229003#/home
查看进粤人员详情
人员基本信息
姓名
身份证明类型
身份证明号码
性别
手机号码
登记状态
正常登记
工作单位
四川嘉冠建筑工程有限公司
在职状态
在职
社保号
职称
职称证号
职称专业
所在项目名称
暂无
项目所在地区
职务（岗位）
执业注册证
注册类别
注册编号
注册专业
注册日期
确认情况
暂无数据

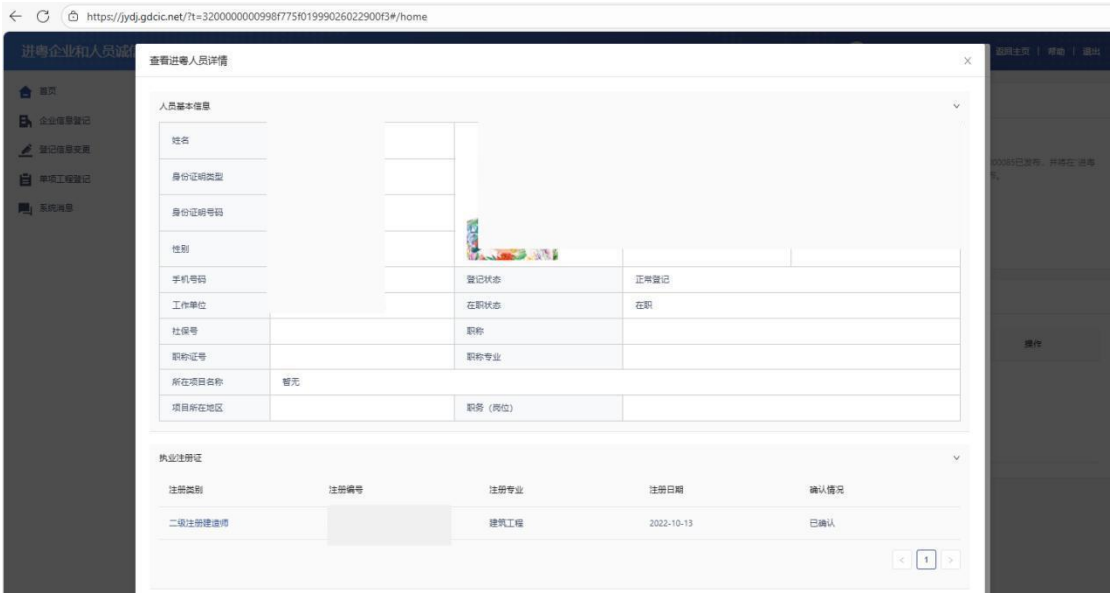
https://jydj.gdcic.net/?t=32000000009981775f01999026022900f3#/home
查看进粤人员详情
人员基本信息
姓名
身份证明类型
身份证明号码
性别
手机号码
登记状态
正常登记
工作单位
在职状态
在职
社保号
职称
职称证号
职称专业
所在项目名称
暂无
项目所在地区
职务（岗位）
执业注册证
注册类别
注册编号
注册专业
注册日期
确认情况
二级注册建造师
建筑工程
2022-10-13
已确认

进粤企业和人员诚信信息登记表

单位名称：	四川霖冠建筑工程有限公司
登记日期：	二〇二五年九月二十二日
打印日期：	二〇二五年一十月三日

进粤企业和人员诚信信息登记平台

一、企业（总部）基本情况

企业名称	四川霖冠建筑工程有限公司				
统一社会信用代码			营业执照注册号		
注册资本			注册时间	2020-09-08	
成立时间			邮政编码		
注 册 地			登记类型		
注册详细地址					
基本存款账号开户银行			银行账号		
安全生产许可证号			证书到期时间	2028-06-09	
发证机关	四川省住房和城乡建设厅				
法定代表人	姓 名		职 务	总经理	
	身份证明号码		职 称		
	联系电话		手机号码		
技术负责人	姓 名		职 务	技术负责人	职
	身份证明号码		联系电话		手机号码
驻粤负责人	姓 名		职 务	驻粤负责人	职 称
	身份证明号码		联系电话		手机号码
组织机构代码证					
银行账户开户证明书					
办公场所证明文件					

营业执照	
安全生产许可证	

资质证书	

建筑业企业资质证书

企 业 名 称：四川霖冠建筑工程有限公司

详 细 地 址：成都市青羊区西货站路6号南塔13层1305号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：APP8P7C　经 济 性 质：有限责任公司(自然人独资)

证 书 编 号：　　有 效 期：至2030年01月24日

法定代表人：

资质类别及等级：

石油化工工程施工总承包二级；建筑工程施工总承包二级；机电工程施工总承包二级；电力工程施工总承包二级；水利水电工程施工总承包二级；市政公用工程施工总承包二级；地基基础工程专业承包二级；钢结构工程专业承包二级；河湖整治工程专业承包二级；城市及道路照明工程专业承包二级；起重设备安装工程专业承包二级；环保工程专业承包二级；古建筑工程专业承包二级；输变电工程专业承包二级；建筑机电安装工程专业承包二级******

发证机关：

四川省住房和城乡建设厅

2025年01月24日

二、企业（总部）资质情况

证书编号　　资质名称：建筑业企业资质

资质类别	等级	审批机关	审批日期	资质有效期	业务范围
建筑机电安装工程	二级	四川省住房和城乡建设厅	2024-04-26	2025-04-26	
输变电工程	二级	四川省住房和城乡建设厅	2024-04-26	2025-04-26	
河湖整治工程	二级	四川省住房和城乡建设厅	2024-04-26	2025-04-26	
机电工程	二级	四川省住房和城乡建设厅	2024-04-26	2025-04-26	
环保工程	二级	四川省住房和城乡建设厅	2024-04-26	2025-04-26	
起重设备安装工程	二级	四川省住房和城乡建设厅	2024-04-26	2025-04-26	
城市及道路照明工程	二级	四川省住房和城乡建设厅	2024-04-26	2025-04-26	
古建筑工程	二级	四川省住房和城乡建设厅	2024-04-26	2025-04-26	
水利水电工程	二级	四川省住房和城乡建设厅	2024-04-26	2025-04-26	
石油化工工程	二级	四川省住房和城乡建设厅	2024-04-26	2025-04-26	
钢结构工程	二级	四川省住房和城乡建设厅	2024-04-26	2025-04-26	
房屋建筑工程	二级	四川省住房和城乡建设厅	2024-04-26	2025-04-26	
电力工程	二级	四川省住房和城乡建设厅	2024-04-26	2025-04-26	
市政公用工程	二级	四川省住房和城乡建设厅	2024-04-26	2025-04-26	
地基基础工程	二级	四川省住房和城乡建设厅	2024-04-26	2025-04-26	

三、进粤（分支机构）基本情况

（1）四川霖冠建筑工程有限公司

机构名称	四川霖冠建筑工程有限公司		
组织机构代码		设立时间	2024-05-01
所在地	珠海市,市辖区	邮政编码	519000
详细地址			
联 系 人		联系人移动电话	
邮　　箱		传真号码	
营业执照注册号		联系电话	
机构总负责人		证件类型	身份证
证件号码	1	手机号码	
职　　称		注册类别	
注册专业			
安全生产考核合格证号			
技术负责人		证件类型	身份证
证件号码		手机号码	
职　　称	工程师	注册类别	
注册专业			
安全生产考核合格证号			
安全负责人		证件类型	身份证
证件号码		手机号码	
职　　称		注册类别	
注册专业			

进粤企业和人员诚信信息查询平台

安全生产考核合格证号				
质量负责人		证件类型	身份证	
证件号码		手机号码		
职　称		注册类别		
注册专业				
安全生产考核合格证号				

进粤企业和人员诚信信息登记平台

四、进粤企业在粤技术管理人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	职称	职务（岗位）	注册专业	注册类别	注册章号	执业资格证书号	注册证有效期	安全生产考核合格证号	安全生产考核合格证有效期
1					项目负责人							7-04-23
2					技术负责人							6-12-19
3						建筑工程	二级注册建造师					6-07-06
4												
5												6-09-29
6				工程师								6-09-12
7					安全员							6-07-07
												6-05-24
8				级工程师	技术负责人							
9				工程师		建筑工程 航空航天工程 机场工程 水利水电工程 建筑工程	一级注册建造师					6-09-12
10				工程师								

1												25-07-01
1						建筑工程	二级注册建造师					25-06-22
1												25-07-01

进粤企业和人员诚信信息登记平台

五、进粤企业特种作业人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	证书名称	证书编号	作业/工种类别	发证机关	证书有效期	备注

进粤企业和人员诚信信息登记平台

六、施工图设计文件审查机构单项工程情况

进粤企业和人员诚信信息登记平台

九、投标人承诺书

致：云浮市云城区云城街道办事处（招标人）

我公司作为参与云浮市云城区富丰象山郊野公园项目招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：91510704MA6APP8P7C（统一社会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与云浮市云城区富丰象山郊野公园项目招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：四川霖冠[redacted]公章）

法定代表人（或授权代理人）：[redacted]盖章）

：[redacted] 10 日

十、投标报价

（一）投标报价说明

1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4．其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5．本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6、本报价的币种为人民币。

7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

（二）工程量清单报价书

工程量清单报价书由下列格式内容组成：

1．投标总价；

2．建设项目投标报价汇总表；

3．单位工程投标报价汇总表；

4．分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；

5．综合单价分析表（仅投标人中标后另册提供）；

6．总价措施项目清单与计价表；

7．其他项目清单与计价汇总表；

8．暂列金额明细表；

9．材料（工程设备）暂估单价及调整表；

10．专业工程暂估价及结算价表；

11．规费、税金项目清单与计价表；

12．发包人提供材料和工程设备一览表；

13．承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）；

14．投标报价需要的其他资料（当投标人填报的可竞争费用，在投标报价时以低价竞标的，投标人应在投标文件中对此提交相关说明资料和证明材料，以证明其不低于企业成本）。

说明：投标报价需要的其他资料或表格可以按工程量清单计价统一格式由投标人自行决定是否编制到投标报价书中。**工程量清单报价书格式以软件导出为准。**

云浮市云城区富丰象山郊野公园项目 工程

投 标 总 价

招　标　人：云浮市云城区云城街道办事处

工 程 名 称：云浮市云城区富丰象山郊野公园项目

投 标 总 价　（小写）：4785980.5

（大写）：肆佰柒拾捌万伍仟玖佰捌拾元伍角

投　标　人：四川霖冠建筑工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

编　制　人：

编 制 时 间：2025年10月10日

扉-3

建设项目投标报价汇总表

工程名称：云浮市云城区富丰象山郊野公园项目　　第 1 页　共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	象山部分	2641154.33		91349.67	
2	石板围村部分	2144826.17		73410.94	
合计		4785980.5		164760.61	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：象山部分　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	市政工程	1465108.61		54410.47	
2	建筑工程	432796.26		13262.15	
3	照明工程	65196.41		4108.75	
4	绿化工程	688052.85		19568.30	
合计		2641154.13		91349.67	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1058695.53	
1.1	园建	292371.44	
1.2	道路	766324.09	
2	措施合计	189594.81	
2.1	绿色施工安全防护措施费	54410.47	
2.2	其他措施费	135184.34	
3	其他项目	95846.00	—
3.1	暂列金额	76063.60	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	19782.40	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1344136.34	
5	增值税销项税额	120972.27	—
6	总造价	1465108.61	
7	人工费	278416.36	
投标报价合计=1+2+3+5		1,465,108.61	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		园建						
		登山径						
		2米宽登山径台阶						
1	040204001001	人行道整形碾压	1.部位:人行道整形碾压	m2	993.72	2.06	2047.06	
2	040202015001	石粉垫层	1.水泥含量:6% 2.石料规格:石粉 3.厚度:12cm	m2	993.72	27.98	27804.29	
3	010507004001	台阶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	149.058	503.73	75084.99	
		2米宽登山径台阶合计					104936.34	
		2/2.5米宽登山径(平缓段)						
4	040204001002	人行道整形碾压	1.部位:人行道整形碾压	m2	919.52	2.06	1894.21	
5	040202015002	石粉垫层	1.水泥含量:6% 2.石料规格:石粉 3.厚度:12cm	m2	919.52	27.98	25728.17	
6	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.厚度:15cm 3.养生:水	m2	919.52	76.27	70131.79	
		2/2.5米宽登山径(平缓段)合计					97754.17	
		仿木栏杆						
7	穗011503009001	成品混凝土护栏	1.材料种类:仿树皮栏杆 2.构件高度:1300mm	m	235.65	189.42	44636.82	
		仿木栏杆合计					44636.82	
		登山径合计					247327.33	
		休闲广场						
		混凝土地面						
8	040204001003	人行道整形碾压	1.部位:人行道整形碾压	m2	165.75	2.06	341.45	
本页小计							247668.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	040204003002	现浇混凝土人行道及进口坡	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.厚度:12cm 3.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚6%水泥石粉	m2	165.75	85.22	14125.22	
		混凝土地面合计					14466.67	
		休闲广场合计					14466.67	
		山顶观景台						
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:600*300*200芝麻白花岗石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:1:3水泥砂浆满浆座砌	m	15.25	196.35	2994.34	
		山顶观景台合计					2994.34	
		次入口广场/休闲广场三						
		印花混凝土地面						
11	040204001006	人行道整形碾压	1.部位:人行道整形碾压	m2	117.31	2.06	241.66	
12	040202011001	碎石基层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:10cm	m2	117.31	25.53	2994.92	
13	040203007001	水泥混凝土	1.面层:彩色压模 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.厚度:15cm 4.嵌缝材料:缩缝 5.养生:水	m2	117.31	207.54	24346.52	
		印花混凝土地面合计					27583.10	
		次入口广场/休闲广场三合计					27583.10	
		园建合计					292371.44	
		道路						
		土石方						
14	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	2471	5.63	13911.73	
本页小计							58614.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:本桩利用	m3	409	11.21	4584.89	
16	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:10km	m3	2000.65	30.53	61079.84	
		土石方合计					79576.46	
		路面						
17	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床碾压检验	m2	2936.66	2.36	6930.52	
18	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	2905.85	25.53	74186.35	
19	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:缩缝 4. 养生:水	m2	1970.83	111.80	220338.79	
20	040203007003	水泥混凝土	1. 面层:彩色压模 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 厚度:15cm 4. 嵌缝材料:缩缝 5. 养生:水	m2	767.1	134.19	102937.15	
21	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C30砼预制平石(50×20×10cm) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20砼靠背	m	613.68	35.81	21975.88	
		路面合计					426368.69	
		路基防护						
		仰斜式路肩墙						
22	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	59.11	9.33	551.50	
23	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:10km	m3	59.11	30.53	1804.63	
本页小计							494389.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 泄水孔材料品种、规格:φ75PVC管 3. 滤水层要求:碎(砾)石 4. 沉降缝要求:沥青木丝板	m3	102.65	575.85	59111.00	
		仰斜式路肩墙合计					61467.13	
		直立式路肩墙						
25	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	218.7	9.33	2040.47	
26	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:10km	m3	218.7	30.53	6676.91	
27	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 沉降缝要求:沥青木丝板	m3	330.17	576.05	190194.43	
		直立式路肩墙合计					198911.81	
		路基防护合计					260378.94	
		道路合计					766324.09	
		分部分项合计					1058695.53	
		措施项目						
28	011702027001	台阶	1. 构件类型:台阶模板	m2	993.72	37.39	37155.19	
29	041102037001	其他现浇构件模板	1. 构件类型:后座模板	m2	110.4624	26.86	2967.02	
30	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:挡墙模板	m2	1549	61.37	95062.13	
		单价措施合计					135184.34	
本页小计							393207.15	
合　计							1193879.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费			54410.47			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费						以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费						以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费						按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
								计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费						赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计					54410.47			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	76063.60		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	19782.40		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	95846.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元	76063.60	
合　计			76063.60	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程　　　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1344136.34	9	120972.27
合　计					120972.27

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：市政工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	人工费	元	281228.2498		0.99	0.99		
2	人工费调整	元	0.1152		1.00	1.00		
3	钢板 综合	kg	513.717		3.12	2.98		
4	尼龙帽 Φ1.5	个	552.993		2.14	2.04		
5	土工布	m2	14.1965		10.40	9.96		
6	圆钉 综合	kg	29.431		5.00	4.79		
7	圆钉 50~75	kg	171.0409		5.00	4.79		
8	低碳钢焊条 综合	kg	58.9125		6.32	6.04		
9	钢锯片 Φ300	片	11.9465		264.96	253.75		
10	铁件 综合	kg	1756.2767		7.50	7.19		
11	零星卡具	kg	368.662		5.47	5.24		
12	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	33.2703		350.00	335.19		
13	碎石 20~40	m3	321.8153		135.00	129.29		
14	碎石 40	m3	0.2699		135.00	129.29		
15	碎石 60	m3	91.9646		135.00	129.29		
16	石屑	m3	45.7102		105.00	100.55		
17	石粉	m3	342.3099		70.00	67.04		
18	板枋材 综合	m3	5.1357		1400.00	1340.73		
19	板枋材 综合	m3	0.0399		1400.00	1340.73		
20	松杂板枋材	m3	5.913		1240.00	1187.50		
21	木丝板 25×610×1830	m2	21.971		27.42	26.27		
22	石油沥青 30#	kg	206.786		3.80	3.64		
23	石油沥青 60~100#	t	1.0032		4200.00	4022.23		
24	石油沥青 60~100#	t	0.5445		4200.00	4022.23		
25	模板嵌缝料	kg	77.45		1.71	1.63		
26	嵌缝料	kg	49.686		0.58	0.57		
27	柴油	t	0.1408		7490.00	7490.00		
28	柴油	t	0.0764		7490.00	7490.00		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：市政工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
29	柴油	kg	13.9021		7.49	7.49		
30	隔离剂	kg	60.7322		7.05	6.75		
31	脱模剂	kg	182.7966		5.13	4.91		
32	PVC塑料排水管 Φ75	m	10.9956		8.35	7.98		
33	水	m3	883.1419		4.18	4.00		
34	钢模板	kg	380.0643		5.44	5.21		
35	组合钢模板	kg	913.91		5.18	4.95		
36	钢支撑	kg	864.342		3.88	3.72		
37	其他材料费	元	4620.6541		1.00	1.00		
38	材料费调整	元	0.5654		1.00	1.00		
39	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	448.3601		360.00	344.76		
40	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	311.523		370.00	354.33		
41	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	497.1591		380.00	363.89		
42	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15	m3	0.0961		425.00	407.00		
43	C30砼预制平石(50×20×10cm)	m	622.8852		14.62	14.01		
44	600*300*200芝麻白花岗石	m	15.4788		186.84	178.93		
45	成品混凝土仿树皮护栏 1300mm	m	236.8283		145.42	139.26		
46	预拌砂浆	m3	1.6917					
47	预拌混凝土	m3	1257.0422					
48	彩色压模	m2	767.1		30.00	28.72		
49	彩色压模	m2	117.31		30.00	28.72		
50	机上人工	工日	212.9282		227.70	227.70		
51	折旧费	元	18664.8798		1.00	1.00		
52	检修费	元	4336.6606		1.00	1.00		
53	维护费	元	13594.8477		1.00	1.00		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：市政工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
54	安拆费	元	902.7627		1.00	1.00		
55	汽油（机械用）国III93#	kg	7.4135		8.90	8.52		
56	柴油（机械用）0#	kg	4939.7332		7.49	7.49		
57	柴油（机械用）0#	kg	15.8818		7.49	7.49		
58	电（机械用）	kw·h	1757.6918		0.81	0.78		
59	机械费调整	元	0.0204		1.00	1.00		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	309529.33	
1.1	主入口广场	8066.52	
1.2	休闲广场二/松树观景台	41117.83	
1.3	山顶观景台	112723.59	
1.4	次入口广场/休闲广场三	9680.65	
1.5	标距柱（6个）	804.42	
1.6	标识牌（7个）	19896.27	
1.7	导向牌（10个）	23946.17	
1.8	垃圾箱（10个）	8560.40	
1.9	危险提示牌（2个）	547.06	
1.10	坐凳（28个）	17684.80	
1.11	教育科普宣传栏（3个）	44002.05	
1.12	入口标志牌（2个）	22499.57	
2	措施合计	51238.17	
2.1	绿色施工安全防护措施费	13262.15	
2.2	其他措施费	37976.02	
3	其他项目	27118.98	—
3.1	暂列金额	22237.18	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	4881.80	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	387886.48	
5	增值税销项税额	34909.78	—
6	总造价	422796.26	
7	人工费	83653.64	
投标报价合计=1+2+3+5		422,796.26	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		主入口广场						
		原有墙壁贴文化石						
1	011204003001	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色：文化石600*300*20 2.找平层:25mm厚1：2.5水泥砂浆	m2	42	192.06	8066.52	
		原有墙壁贴文化石合计					8066.52	
		主入口广场合计					8066.52	
		休闲广场二/松树观景台						
		松树观景台						
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	124.49	41.94	5221.11	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填	m3	109.61	19.38	2124.24	
4	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	2.352	428.19	1007.10	
5	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.912	447.96	3096.30	
6	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.918	599.80	550.62	
7	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.11	494.19	1536.93	
8	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.53	498.63	2258.79	
9	010507004001	台阶	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.01	547.14	1099.75	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ10以内	t	0.538	4292.76	2309.50	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ25以内	t	0.818	3987.53	3261.80	
12	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.321	5524.90	1773.49	
本页小计							32306.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:18厚芝麻灰花岗石，火烧面	m2	48.08	122.52	5890.76	
14	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:18厚芝麻白花岗石，火烧面	m2	9.15	269.39	2464.92	
15	穗011503009001	成品混凝土护栏	1. 材料种类:仿木栏杆 2. 构件高度:1250mm	m	47.4	179.80	8522.52	
		松树观景台合计					41117.83	
		休闲广场二/松树观景台合计					41117.83	
		山顶观景台						
16	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	165.98	41.94	6961.20	
17	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	144.77	19.38	2805.64	
18	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.136	428.19	1342.80	
19	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.216	447.96	4128.40	
20	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.6	599.80	1559.48	
21	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.7	494.19	8252.97	
22	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	27.77	498.63	13846.96	
23	010507004002	台阶	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.48	547.14	2451.19	
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ10以内	t	3.018	4292.76	12955.55	
本页小计							71182.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ25以内	t	1.807	3987.53	7205.47	
26	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.594	5524.90	3281.79	
27	011102001002	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:40厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:18厚芝麻灰花岗石，火烧面	m2	261.34	122.52	32019.38	
28	011107001002	石材台阶面	1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:18厚芝麻白花岗石，火烧面	m2	24.63	269.39	6635.08	
29	穗011503009002	成品混凝土护栏	1.材料种类:仿木栏杆 2.构件高度:1250mm	m	51.6	179.80	9277.68	
		山顶观景台合计					112723.59	
		次入口广场/休闲广场三						
		花基						
30	010101001002	素土夯实	1.素土夯实	m2	17.8	2.11	37.56	
31	010501001003	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	1.78	428.19	762.18	
32	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	5.2	573.79	2983.71	
33	011201001001	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	56.25	36.08	2029.50	
34	011204003002	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:文化石600*300*30	m2	25.67	150.67	3867.70	
		花基合计					9680.65	
		次入口广场/休闲广场三合计					9680.65	
		标距柱（6个）						
本页小计							68100.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	4.356	41.94	182.69	
36	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	3.99	19.38	77.33	
37	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:10km	m3	0.366	47.71	17.46	
38	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.15	428.19	64.23	
39	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.216	438.30	94.67	
40	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格:50*30不锈钢方柱，2mm不锈钢	t	0.0133437	21938.87	292.75	
41	011507001001	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:300*200*30，2mm不锈钢	m2	0.36	209.15	75.29	
		标距柱（6个）合计					804.42	
		标识牌（7个）						
42	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	21.42	41.94	898.35	
43	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	15.19	19.38	294.38	
44	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:10km	m3	5.0805	47.71	242.39	
45	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石	m3	2.1	241.32	506.77	
46	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.13	438.30	1810.18	
47	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ10以内	t	0.0973	4292.76	417.69	
48	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.10864	11801.69	1282.14	
49	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	4.2	17.67	74.21	
50	011102001004	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:光面芝麻黑花岗岩100厚1000X300	m2	2.1	428.72	900.31	
51	011507001002	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:标识牌 2200*1030 4厚镀锌钢板造型	m2	15.862	849.19	13469.85	
本页小计							20700.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		标识牌（7个）合计					19896.27	
		导向牌（10个）						
52	010101004005	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	29.3	41.94	1228.84	
53	010103001005	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填	m3	21	19.38	406.98	
54	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:余泥渣土 2.运距:10km	m3	5.15	47.71	245.71	
55	010404001002	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石	m3	2.8	241.32	675.70	
56	010501003005	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.6	438.30	2454.48	
57	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ10以内	t	0.1304	4292.76	559.78	
58	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件	t	0.1438	11801.69	1697.08	
59	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	6	17.67	106.02	
60	011102001005	石材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:光面芝麻黑花岗岩100厚1000X300	m2	3	428.72	1286.16	
61	011507001003	平面、箱式招牌	1.面层材料种类:标识牌 2000*900 4厚镀锌钢板造型	m2	18	849.19	15285.42	
		导向牌（10个）合计					23946.17	
		垃圾箱（10个）						
62	011507004001	垃圾箱	1.面层材料种类:成品垃圾箱 2.箱体规格:1170*1430 4厚镀锌钢板	个	10	856.04	8560.40	
		垃圾箱（10个）合计					8560.40	
		危险提示牌（2个）						
63	010101004006	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	0.72	41.94	30.20	
64	010103001006	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填	m3	0.46	19.38	8.91	
本页小计							32545.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:10km	m3	0.191	47.71	9.11	
66	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.04	438.30	17.53	
67	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格:芝麻白花岗岩荔枝面1300X200X150	m3	0.08	5546.85	443.75	
68	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:4厚镀锌钢板，砖红色漆	m2	0.22	155.11	34.12	
69	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:2厚镀锌钢板，砖红色漆	m2	0.04	86.05	3.44	
		危险提示牌（2个）合计					547.06	
		坐凳（28个）						
70	050305006001	石桌石凳	1. 石材种类:成品坐凳，芝麻白花岗岩 1600*400*400 2. 凳面尺寸、支墩高度:凳面1200X400X60，凳脚400X400X300	个	28	631.60	17684.80	
		坐凳（28个）合计					17684.80	
		教育科普宣传栏（3个）						
71	010101004007	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	7.11	41.94	298.19	
72	010103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	1.41	19.38	27.33	
73	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:10km	m3	5.4885	47.71	261.86	
74	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.04	428.19	873.51	
75	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.66	438.30	1604.18	
76	010606012002	钢支架	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢综合	t	2.25708	13608.64	30715.79	
77	011507001004	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:2mm厚不锈钢板+高清喷画	m2	23.64	250.87	5930.57	
78	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:6mm厚阳光板	m2	32.4	83.76	2713.82	
本页小计							60618.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
79	011508004001	金属字	1.镌字材料品种、颜色:钛金不锈钢字 2.字体规格:200*200	个	27	58.40	1576.80	
		教育科普宣传栏（3个）合计					44002.05	
		入口标志牌（2个）						
80	010101004008	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	17.1	41.94	717.17	
81	010103001008	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填	m3	11.04	19.38	213.96	
82	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:余泥渣土 2.运距:10km	m3	4.404	47.71	210.11	
83	010404001003	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石	m3	0.972	257.70	250.48	
84	010501001006	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.98	435.79	427.07	
85	010501003008	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.12	438.30	1805.80	
86	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋Φ10以内	t	0.06582	4292.76	282.55	
87	010401012001	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:非粘土砖240×115×53 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	1.78	725.10	1290.68	
88	011204001002	石材墙面	1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚100~200毛石块 3.找平层:20厚1：2.5水泥砂浆	m2	8.52	98.84	842.12	
89	011507001005	平面、箱式招牌	1.面层材料种类:入口标志牌4400*2650 1.5厚镀锌钢板造型	m2	23.32	644.90	15039.07	
90	011508004002	金属字	1.镌字材料品种、颜色:金属字，1.5厚304#不锈钢哑光面 2.字体规格:300*300*20	个	12	75.34	904.08	
91	011508004003	金属字	1.镌字材料品种、颜色:动物造型，5厚耐候钢板 2.字体规格:600*700*50	个	2	258.24	516.48	
本页小计							24076.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		入口标志牌（2个）合计					22499.57	
		分部分项合计					309529.33	
		措施项目						
92	011702001001	基础	1.基础类型:垫层模板	m2	36.61	28.53	1044.48	
93	011702001002	基础	1.基础类型:独立基础	m2	139.72	48.48	6773.63	
94	011702002001	矩形柱	1.支模高度:3.6m内	m2	39.49	54.82	2164.84	
95	011702006001	矩形梁	1.支撑高度:3.6m内	m2	167.92	64.73	10869.46	
96	011702014001	有梁板	1.支撑高度:3.6m内	m2	268.98	60.65	16313.64	
97	011702027001	台阶	1.台阶模板	m2	21.06	38.46	809.97	
		单价措施合计					37976.02	
本页小计							37976.02	
合　计							347505.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费			13262.15			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费						以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费						以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费						赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					13262.15			

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22237.18		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	4881.80		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	27118.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元	22237.18	
合　计			22237.18	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	387886.48	9	34909.78
合　计					34909.78

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	人工费	元	84498.5797		0.99	0.99		
2	人工费调整	元	-0.0534		1.00	1.00		
3	不锈钢型钢 综合	t	0.0144		13150.00	12671.91		
4	螺纹钢筋 Φ25以内	t	2.6907		3160.00	3045.11		
5	螺纹钢筋 Φ10以内	t	4.8598		3300.00	3180.02		
6	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	159.1773		4.54	4.36		
7	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	35.7984		5.03	4.84		
8	镀锌方钢 综合	kg	2031.372		4.50	4.34		
9	钢板 综合	kg	215.82		3.12	2.98		
10	钢板 2~2.5	kg	406.2744		3.27	3.15		
11	4厚镀锌钢板，砖红色漆	m2	0.2508		126.70	122.22		
12	2厚镀锌钢板，砖红色漆	m2	0.0456		63.90	61.64		
13	标识牌 2200*1030 4厚镀锌钢板造型	m2	16.8137		800.00	770.91		
14	入口标志牌 4400*2650 1.2厚镀锌钢板造型	m2	24.7192		600.00	578.18		
15	导向牌 2000*900 4厚镀锌钢板造型	m2	19.08		800.00	770.91		
16	2mm厚不锈钢板	m2	25.0584		173.40	167.10		
17	不锈钢装饰板 2mm	m2	0.3816		173.40	167.10		
18	密封胶圈	个	1.6773		13.33	12.84		
19	土工布	m2	186.4737		10.40	9.96		
20	麻袋	个	80.1931		1.89	1.82		
21	镀锌木螺钉 M6×100	十套	43.182		1.79	1.73		
22	六角螺栓 综合	kg	7.2001		5.58	5.38		
23	对拉螺栓	kg	0.6331		5.38	5.18		
24	镀锌六角螺栓 M12×40	十套	3.01		4.72	4.55		
25	膨胀螺栓 M8×80	十套	6.534		4.54	4.36		
26	圆钉 综合	kg	17.1513		5.00	4.79		
27	圆钉 50~75	kg	34.1904		5.00	4.79		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
28	低碳钢焊条 综合	kg	128.484		6.32	6.04		
29	不锈钢焊丝	kg	0.1311		30.00	28.90		
30	粗焊锡	kg	0.0078		30.09	28.99		
31	铁件 综合	kg	263.5454		7.50	7.19		
32	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.9885		350.00	335.19		
33	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0378		500.00	481.82		
34	碎石 20~40	m3	6.2499		135.00	129.29		
35	碎石 60	m3	1.786		135.00	129.29		
36	石屑	m3	0.8876		105.00	100.55		
37	芝麻白花岗岩荔枝面 1300X200X150	m3	0.077		5722.27	5514.22		
38	非粘土砖 240×115×53	千块	0.9815		410.00	395.08		
39	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	2.8252		410.00	395.08		
40	松杂板枋材	m3	2.5984		1240.00	1187.50		
41	防水胶合板 模板用 18mm	m2	94.3677		35.00	33.73		
42	10厚100~200毛石块	m2	8.6904		1.05	1.00		
43	光面芝麻黑花岗岩 100厚1000X300	m2	5.1765		301.77	290.81		
44	18厚芝麻灰花岗石，火烧面	m2	314.0613		66.37	63.96		
45	18厚芝麻白花岗石，火烧面	m2	52.994		82.74	79.73		
46	文化石 600*300*20	m2	34.8096		87.00	83.83		
47	文化石 600*300*30	m2	21.2753		87.00	83.83		
48	6mm厚阳光板	m2	33.372		35.04	33.77		
49	铝合金压条 30×1.2	m	34.2144		13.43	12.94		
50	高清喷画	m2	25.0584		25.00	24.08		
51	油性防锈漆	kg	19.2529		7.52	7.26		
52	嵌缝料	kg	1.053		0.58	0.57		
53	清油	kg	0.0452		13.00	12.53		
54	松节油	kg	0.0511		7.30	7.30		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
55	灯用煤油	kg	0.3408		14.94	14.38		
56	石蜡	kg	9.8882		3.00	2.89		
57	环氧树脂 综合	kg	0.1238		24.89	23.98		
58	草酸	kg	3.6956		5.59	5.39		
59	隔离剂	kg	66.325		7.05	6.75		
60	氩气	m3	0.3687		12.08	11.65		
61	氧气	m3	9.1638		5.16	4.96		
62	乙炔气	kg	3.9724		13.30	12.80		
63	202胶 FSC-2	kg	16.5611		19.76	19.03		
64	耐候胶	L	3.7765		61.79	59.54		
65	胶粘剂	kg	3.5784		1.88	1.81		
66	高压橡胶管 综合	m	0.5591		59.37	57.21		
67	管箍	个	0.3728		9.29	8.94		
68	白棉纱	kg	5.5529		12.42	11.96		
69	白棉纱	kg	0.6767		11.47	11.04		
70	水	m3	25.6932		4.18	4.00		
71	钢支撑	kg	395.9363		3.88	3.72		
72	其他材料费	元	1079.4635		1.00	1.00		
73	材料费调整	元	0.0044		1.00	1.00		
74	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	9.5999		350.00	337.27		
75	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.9947		360.00	344.76		
76	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	17.9437		370.00	354.33		
77	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	16.2893		380.00	363.89		
78	普通预拌混凝土（泵送）碎石粒径综合考虑 C30	m3	63.05		380.00	366.17		
79	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M7.5	m3	1.5092		380.00	366.18		
80	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	2.6817		440.00	424.01		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
81	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m3	15.4877		395.00	380.63		
82	成品混凝土仿木护栏 1250mm	m	99.495		133.00	128.18		
83	预拌水泥砂浆 1:2	m3	1.0769					
84	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	7.3033					
85	预拌水泥砂浆 1:3	m3	7.2073					
86	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	0.0113					
87	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m3	1.5092					
88	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m3	2.6246					
89	预拌混凝土	m3	107.8776					
90	成品垃圾箱 1170*1430 4厚镀锌钢板	个	10		888.33	856.04		
91	成品坐凳 芝麻白花岗岩 1600*400*400	个	28		655.43	631.60		
92	钛金不锈钢字200*200	个	27		28.78	27.73		
93	金属字 300*300*20，1.5厚304#不锈钢哑光面	个	12		46.36	44.67		
94	动物造型 600*700*50，5厚耐候钢板	个	2		215.49	207.64		
95	机上人工	工日	4.5559		227.70	227.70		
96	折旧费	元	1034.5654		1.00	1.00		
97	检修费	元	161.6577		1.00	1.00		
98	维护费	元	518.1417		1.00	1.00		
99	安拆费	元	433.5407		1.00	1.00		
100	柴油 （机械用）0#	kg	137.9248		7.49	7.49		
101	电 （机械用）	kw·h	2058.8294		0.81	0.78		
102	机械费调整	元	0.0004		1.00	1.00		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：照明工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	50777.93	
1.1	道路	9518.16	
1.2	路灯	41259.77	
2	措施合计	4241.45	
2.1	绿色施工安全防护措施费	4108.75	
2.2	其他措施费	132.70	
3	其他项目	4793.84	—
3.1	暂列金额	3646.41	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1147.43	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	59813.22	
5	增值税销项税额	5383.19	—
6	总造价	65196.41	
7	人工费	7101.58	
投标报价合计=1+2+3+5		65,196.41	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		道路						
		迁移路灯						
1	041001010001	拆除电杆	1. 结构形式:6m高太阳能路灯	根	12	39.69	476.28	
2	030412007001	一般路灯	1. 名称:6m高太阳能路灯 2. 其他:利旧安装	套	12	753.49	9041.88	
		迁移路灯合计					9518.16	
		道路合计					9518.16	
		路灯						
3	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	22.82	8.67	197.85	
4	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:2:8灰土垫层	m3	0.54	204.69	110.53	
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土回填	m3	18.64	19.36	360.87	
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:10km	m3	1.384	31.72	43.90	
7	030412007002	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 规格:60W，太阳能电池板1*70W,锂蓄电池:1*60AH 3. 灯杆材质、规格:φ130*6m金属灯杆，采用Q235碳素钢板整板卷,整体镀锌喷塑处理,壁厚不小于3.0mm 4. 基础形式、砂浆配合比:C25混凝土基础	套	18	2252.59	40546.62	
		路灯合计					41259.77	
		分部分项合计					50777.93	
		措施项目						
8	031302007001	高层施工增加		项	1			
9	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	132.70	132.70	
		单价措施合计					132.70	
本页小计							50910.63	
合　计							50910.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费			4108.75			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用						按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费						按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费						按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费						赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费						按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费						按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费						以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
								或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计					4108.75			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3646.41		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1147.43		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	4793.84		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：照明工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元	3646.41	
合　计			3646.41	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：照明工程　　　　标段：　　　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：照明工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	59813.22	9	5383.19
合　计					5383.19

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：照明工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：照明工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	人工费	元	7039.0706		0.99	0.99		
2	人工费调整	元	132.6956		1.00	1.00		
3	三色塑料带 20mm×40m	m	0.18		0.09	0.09		
4	白布	kg	15		2.75	2.64		
5	六角螺栓 M16×65~80	十套	24.48		5.94	5.72		
6	弹簧垫圈 M16~30	十个	24.6		1.75	1.68		
7	圆钉 50~75	kg	1.7259		5.00	4.79		
8	扒钉	kg	2.6037		7.03	6.77		
9	生石灰	t	0.0846		455.00	438.17		
10	粘土	m3	0.6851		34.50	33.23		
11	木枋 综合	m3	0.3475		1707.86	1644.67		
12	木板	m3	0.102		1630.62	1570.29		
13	枕木	m3	0.0243		1329.20	1280.01		
14	酚醛磁漆	kg	15		13.27	12.79		
15	防锈漆 C53-1	kg	7.5		13.70	13.19		
16	电力复合脂	kg	0.18		14.45	13.92		
17	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	30.3		17.05	16.42		
18	飞保险(羊角熔断器) 10A	个	30.9		1.55	1.49		
19	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	6		2.40	2.31		
20	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2	m	6.6		1.77	1.71		
21	水	m3	2.9633		4.18	4.00		
22	钢模板	kg	24.9925		5.44	5.21		
23	脚手架直角扣(含螺丝)	套	61.8		5.24	5.24		
24	钢垫板 2.5~5	kg	15		4.23	4.08		
25	其他材料费	元	93.8584		1.00	1.00		
26	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	6.075		370.00	354.33		
27	太阳能电池板 1*70W	组	18		106.19	102.27		
28	太阳能路灯 60W	套	18.18		360.00	346.68		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：照明工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
29	Φ130*6m金属灯杆 采用Q235碳素钢板整板卷,整体镀锌喷塑处理,壁厚不小于3.0mm	根	18		823.01	792.56		
30	锂蓄电池 1*60AH	个	18		376.99	363.04		
31	M16×960地脚螺栓	根	24.3		5.98	5.75		
32	机上人工	工日	9.2511		227.70	227.70		
33	折旧费	元	514.6167		1.00	1.00		
34	检修费	元	178.84		1.00	1.00		
35	维护费	元	378.2874		1.00	1.00		
36	安拆费	元	95.4171		1.00	1.00		
37	汽油 (机械用)国III93#	kg	30.576		8.90	8.52		
38	柴油 (机械用)0#	kg	126.9113		7.49	7.49		
39	电 (机械用)	kw·h	22.9005		0.81	0.78		
40	校验费	元	2.718		1.00	1.00		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	533871.25	
1.1	道路	51151.12	
1.2	绿化	482720.13	
2	措施合计	47361.10	
2.1	绿色施工安全防护措施费	19568.30	
2.2	其他措施费	27792.80	
3	其他项目	50008.80	—
3.1	暂列金额	38273.62	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	11735.18	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	631241.15	
5	增值税销项税额	56811.70	—
6	总造价	688052.85	
7	人工费	143551.11	
投标报价合计=1+2+3+5		688,052.85	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		道路						
		迁移乔木						
1	粤050101016001	迁移	1. 苗木种类:乔木 2. 苗木规格:胸径5-8cm,冠幅2-3m,高3-4m 3. 运距:5km内	株	78	86.30	6731.40	
		迁移乔木合计					6731.40	
		三维网植草防护						
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:70mm 2. 回填土质要求:耕植土	m3	81	47.83	3874.23	
3	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:草籽	m2	1157.12	12.90	14926.85	
4	050102015001	挂网	1. 种类:三维土工网	m2	1157.12	22.14	25618.64	
		三维网植草防护合计					44419.72	
		道路合计					51151.12	
		绿化						
5	050101010001	整理绿化用地	1. 名称:绿化地铲除杂草 2. 弃渣运距:10km	m2	5780.46	5.04	29133.52	
6	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填厚度:500mm 2. 回填土质要求:种植土 3. 弃土运距:10km	m3	106.96	71.21	7616.62	
7	050102001001	栽植乔木	1. 种类:紫花风铃木 2. 胸径或干径:胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1500-2000mm 3. 养护期:12个月	株	114	792.61	90357.54	
8	050102001002	栽植乔木	1. 种类:凤凰木 2. 胸径或干径:胸径120-140mm，株高3500-4000mm，冠幅2000-2500mm 3. 养护期:12个月	株	52	674.66	35082.32	
9	050102001003	栽植乔木	1. 种类:造型勒杜鹃 2. 胸径或干径:头径31mm，胸径不少于80mm，株高2000mm，冠幅1500mm 3. 养护期:12个月	株	2	349.76	699.52	
本页小计							214040.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	050102001004	栽植乔木	1.种类:桃金娘球 2.胸径或干径:胸径30-40mm，株高1300-1500mm，冠幅800-1000mm 3.养护期:12个月	株	30	270.66	8119.80	
11	050102001005	栽植乔木	1.种类:紫薇 2.胸径或干径:胸径30mm，株高1300-1500mm，冠幅800-1000mm 3.养护期:12个月	株	9	258.59	2327.31	
12	050102003001	栽植竹类	1.竹种类:琴丝竹 2.竹胸径或根盘丛径:胸径20-30mm，株高3500-4000mm 3.养护期:12个月	株	264	64.62	17059.68	
13	050102001006	栽植乔木	1.种类:红花风铃木 2.胸径或干径:胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1500-2000mm 3.养护期:12个月	株	140	228.21	31949.40	
14	050102001007	栽植乔木	1.种类:润楠 2.胸径或干径:胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1000-1500mm 3.养护期:12个月	株	128	182.24	23326.72	
15	050102001008	栽植乔木	1.种类:山乌桕 2.胸径或干径:胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1000-1500mm 3.养护期:12个月	株	128	155.75	19936.00	
16	050102001009	栽植乔木	1.种类:南洋楹 2.胸径或干径:胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1000-1500mm 3.养护期:12个月	株	404	189.81	76683.24	
17	050102001010	栽植乔木	1.种类:木棉 2.胸径或干径:胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1000-1500mm 3.养护期:12个月	株	404	162.98	65843.92	
本页小计							245246.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	050102001011	栽植乔木	1.种类:红花鸡蛋花(大) 2.胸径或干径:胸径160-180mm，株高3000-3500mm，冠幅4000-4500mm 3.养护期:12个月	株	1	2380.78	2380.78	
19	050102001012	栽植乔木	1.种类:红花鸡蛋花(小) 2.胸径或干径:胸径120-150mm，株高2200-2500mm，冠幅3000-3500mm 3.养护期:12个月	株	1	1448.87	1448.87	
20	050102001013	栽植乔木	1.种类:细叶紫薇 2.胸径或干径:胸径120-150mm，株高3000-3500mm，冠幅4000mm 3.养护期:12个月	株	1	433.52	433.52	
21	050102001014	栽植乔木	1.种类:凤凰木(大) 2.胸径或干径:胸径330-350mm，株高7000-7500mm，冠幅4000-4500mm 3.养护期:12个月	株	1	6562.74	6562.74	
22	050102001015	栽植乔木	1.种类:黄花风铃木(大) 2.胸径或干径:胸径160-180mm，株高5000-6000mm，冠幅4000-5000mm 3.养护期:12个月	株	1	2866.81	2866.81	
23	050102001016	栽植乔木	1.种类:黄花风铃木(小) 2.胸径或干径:胸径120-150mm，株高3000-4500mm，冠幅3000-4000mm 3.养护期:12个月	株	2	1291.87	2583.74	
24	050102002001	栽植灌木	1.种类:非洲茉莉球 2.冠丛高:冠幅1200mm，株高1200mm 3.养护期:12个月	株	8	215.95	1727.60	
本页小计							18004.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	050102002002	栽植灌木	1. 种类:红继木球 2. 冠丛高:冠幅1200mm，株高1200mm 3. 养护期:12个月	株	9	221.56	1994.04	
26	050102002003	栽植灌木	1. 种类:球型桃金娘 2. 冠丛高:冠幅600mm，株高600mm 3. 养护期:12个月	株	360	57.69	20768.40	
27	050102002004	栽植灌木	1. 种类:灰莉球 2. 冠丛高:冠幅1200-1300mm，株高1300-1400mm 3. 养护期:12个月	株	4	246.69	986.76	
28	050102002005	栽植灌木	1. 种类:黄杨球 2. 冠丛高:冠幅1000-1100mm，株高1100-1200mm 3. 养护期:12个月	株	2	286.33	572.66	
29	050102002006	栽植灌木	1. 种类:黄纹万年麻 2. 冠丛高:冠幅500mm，株高500mm 3. 养护期:12个月	株	4	94.42	377.68	
30	050102002007	栽植灌木	1. 种类:苏铁 2. 冠丛高:冠幅1200-1800mm，株高1200-1500mm 3. 养护期:12个月	株	2	414.24	828.48	
31	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:蓝雪花 2. 株高或蓬径:株高450mm，冠幅450mm 3. 单位面积株数:36株/m2，七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	31.72	282.56	8962.80	
32	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:三角梅 2. 株高或蓬径:株高300mm，冠幅250mm 3. 单位面积株数:36株/m2，七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	87.19	179.71	15668.91	
本页小计							50159.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	050102008003	栽植花卉	1.花卉种类:鹅掌木 2.株高或蓬径:株高500mm，冠幅500mm 3.单位面积株数:16株/m2，带土球 4.养护期:12个月	m2	10	246.40	2464.00	
34	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:大叶油草 2.养护期:12个月	m2	85	46.55	3956.75	
		绿化合计					482720.13	
		分部分项合计					533871.25	
		措施项目						
35	050403001001	树木支撑架	1.支撑类型、材质:松木桩 杆长1.2m内	株	1418	19.60	27792.80	
		单价措施合计					27792.80	
本页小计							34213.55	
合　计							561664.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费			19568.30			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费						以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费						以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费						赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58　（0.8≤δ＜1式中：δ=合同工期/定额工期）
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					19568.30			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	38273.62		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	11735.18		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	50008.80		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元	38273.62	
合　计			38273.62	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	631241.15	9	56811.70
合　计					56811.7

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	人工费	元	145000.8321		0.99	0.99		
2	人工费调整	元	-0.0005		1.00	1.00		
3	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	141.8		4.80	4.80		
4	塑料篾	kg	7.995		3.73	3.56		
5	稻草	kg	214.5		0.13	0.12		
6	镀锌钢丝网 Φ2×22×22	m2	93.6		4.40	4.21		
7	三维土工网	m2	1272.832		10.62	10.15		
8	余土外运	m3	330.6738					
9	熟耕土(松方)	m3	177.8215		30.00	28.67		
10	通用种植土(松方)	m3	151.3078		43.00	41.09		
11	篙竹 4m内	条	119.34		8.00	7.64		
12	草籽混合物	kg	206.5459		19.00	18.14		
13	杀虫剂	kg	189.5658		17.09	16.32		
14	无机肥(复合肥)	kg	835.3272		3.21	3.07		
15	有机肥	t	17.5804		432.00	412.80		
16	松木桩(支撑) 1.2m内	条	4339.08		5.00	4.77		
17	水	m3	1943.0766		4.18	4.00		
18	其他材料费	元	2118.9697		1.00	1.00		
19	材料费调整	元	0.3415		1.00	1.00		
20	紫薇 胸径30mm，株高1300-1500mm，冠幅800-1000mm	株	9.36		184.15	175.97		
21	紫花风铃木 胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1500-2000mm	株	118.56		685.22	654.77		
22	红花风铃木 胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1500-2000mm	株	145.6		117.30	112.08		
23	桃金娘球 胸径30-40mm，株高1300-1500mm，冠幅800-1000mm	株	31.2		160.00	152.90		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
24	润楠 胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1000-1500mm	株	133.12		71.03	67.88		
25	山乌桕 胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1000-1500mm	株	133.12		44.39	42.41		
26	南洋楹 胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1000-1500mm	株	420.16		78.65	75.16		
27	木棉 胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1000-1500mm	株	420.16		51.66	49.36		
28	造型勒杜鹃 头径31mm，胸径不少于80mm，株高2000mm，冠幅1500mm	株	2.08		178.46	170.53		
29	凤凰木 胸径120-140mm，株高3500-4000mm，冠幅2000-2500mm	株	54.08		287.03	274.28		
30	红花鸡蛋花(小) 胸径120-150mm，株高2200-2500mm，冠幅3000-3500mm	株	1.04		1066.08	1018.71		
31	细叶紫薇 胸径120-150mm，株高3000-3500mm，冠幅4000mm	株	1.04		44.39	42.41		
32	黄花风铃木(小) 胸径120-150mm，株高3000-4500mm，冠幅3000-4000mm	株	2.08		908.10	867.75		
33	红花鸡蛋花(大) 胸径160-180mm，株高3000-3500mm，冠幅4000-4500mm	株	1.04		1975.23	1887.49		
34	黄花风铃木(大) 胸径160-180mm，株高5000-6000mm，冠幅4000-5000mm	株	1.04		2464.31	2354.83		
35	凤凰木(大) 胸径330-350mm，株高7000-7500mm，冠幅	株	1.04		5832.63	5573.50		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
	4000-4500mm							
36	球型桃金娘 冠幅600mm，株高600mm	丛	374.4		4.34	4.15		
37	黄纹万年麻 冠幅500mm，株高500mm	丛	4.16		41.31	39.47		
38	非洲茉莉球 冠幅1200mm，株高1200mm	丛	8.32		100.18	95.72		
39	红继木球 冠幅1200mm，株高1200mm	丛	9.36		105.83	101.12		
40	黄杨球 冠幅1000-1100mm，株高1100-1200mm	丛	2.08		171.00	163.39		
41	灰莉球 冠幅1200-1300mm，株高1300-1400mm	丛	4.16		93.15	89.01		
42	苏铁 冠幅1200-1800mm，株高1200-1500mm	丛	2.08		222.41	212.52		
43	蓝雪花 株高450mm，冠幅450mm	株	1199.016		5.82	5.57		
44	鸭脚木 株高500mm，冠幅500mm	株	168		11.19	10.70		
45	大叶油草	m2	89.25		6.70	6.40		
46	三角梅 株高300mm，冠幅250mm	株	3295.782		3.31	3.17		
47	琴丝竹 胸径20-30mm，株高3500-4000mm	株	277.2		20.76	19.83		
48	机上人工	工日	81.7864		227.70	227.70		
49	折旧费	元	8164.0159		1.00	1.00		
50	检修费	元	1507.8873		1.00	1.00		
51	维护费	元	5690.9138		1.00	1.00		
52	汽油 （机械用）国III93#	kg	254.1309		8.90	8.52		
53	柴油 （机械用）0#	kg	2763.6351		7.49	7.49		
54	机械费调整	元	0.0768		1.00	1.00		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单项工程投标报价汇总表

工程名称：石板围村部分　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	土方工程	40099.29		982.60	
2	市政工程	707538.46		31313.52	
3	建筑工程	22413.04		1758.43	
4	管网工程	229830.11		7695.32	
5	绿化工程	1144945.47		31661.07	
合计		2144826.37		73410.94	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土方工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	32144.49	
2	措施合计	982.60	
2.1	绿色施工安全防护措施费	982.60	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	3661.25	—
3.1	暂列金额	2306.66	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1354.59	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	36788.34	
5	增值税销项税额	3310.95	—
6	总造价	40099.29	
7	人工费	3346.28	
投标报价合计=1+2+3+5		40,099.29	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101001001	平整场地	1. 土壤类别:机械平整场地	m2	3685.79	1.21	4459.81	
2	040101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	204.74	5.63	1152.69	
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:本班利用	m3	204.74	11.21	2295.14	
4	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:远运利用 3. 填方来源、运距:石板围村取土	m3	1448.68	14.03	20324.98	
5	040103001003	回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:砂砾	m3	30.4	128.68	3911.87	
		分部分项合计					32144.49	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							32144.49	
合　计							32144.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费			982.60			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费						以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费						以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费						按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
								计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费						赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计					982.60			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2306.66		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1354.59		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	3661.25		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：土方工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1			2306.66	
合　计			2306.66	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程　　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：土方工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	36788.34	9	3310.95
合　计					3310.95

编制人（造价人员）：[redacted]　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：土方工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	人工费	元	3380.1003		0.99	0.99		
2	砂砾	t	40.736		98.00	78.62		
3	水	m3	28.8749		4.18	4.00		
4	其他材料费	元	15.2209		1.00	1.00		
5	机上人工	工日	31.4852		227.70	227.70		
6	折旧费	元	2065.2565		1.00	1.00		
7	检修费	元	734.3271		1.00	1.00		
8	维护费	元	2227.2993		1.00	1.00		
9	安拆费	元	10.6856		1.00	1.00		
10	汽油（机械用）国III93#	kg	29.9683		8.90	8.52		
11	柴油（机械用）0#	kg	910.1041		7.49	7.49		
12	电（机械用）	kw·h	25.232		0.81	0.78		
13	机械费调整	元	-0.0024		1.00	1.00		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	521855.03	
1.1	土方		
1.2	园建	521855.03	
2	措施合计	78777.44	
2.1	绿色施工安全防护措施费	31313.52	
2.2	其他措施费	47463.92	
3	其他项目	48485.38	—
3.1	暂列金额	37473.07	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	11012.31	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	649117.85	
5	增值税销项税额	58420.61	—
6	总造价	707538.46	
7	人工费	148366.97	
投标报价合计=1+2+3+5		707,538.46	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土方						
		土方合计						
		园建						
		砖砌台阶						
1	040101001002	平整场地	1. 土壤类别:人工平整场地	m3	96.75	5.13	496.33	
2	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:100mm	m2	67.86	27.03	1834.26	
3	010507004001	台阶	1. 混凝土台阶 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.33	494.06	3127.40	
4	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:青砖240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m2	26.94	424.52	11436.57	
5	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m2	27.6	107.06	2954.86	
6	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm 水泥砂浆1:2.5	m2	57.56	50.50	2906.78	
7	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰花岗岩拼花 20mm	m2	25.49	98.59	2513.06	
		砖砌台阶合计					25269.26	
		砖砌墙体						
8	040101001006	素土夯实	1. 素土夯实	m2	292.93	2.03	594.65	
9	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	29.29	528.47	15478.89	
10	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型:外墙120mm 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖 240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	30.49	363.93	11096.23	
本页小计							52439.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	010401003002	实心砖墙	1.墙体类型:外墙240mm 2.砖品种、规格、强度等级:红砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	12.22	336.04	4106.41	
12	010401003003	实心砖墙	1.墙体类型:外墙480mm 2.砖品种、规格、强度等级:红砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	3.56	306.53	1091.25	
13	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	432.22	41.32	17859.33	
		砖砌墙体合计					50226.76	
		砖砌花基						
14	040101001007	素土夯实	1.素土夯实	m2	99.98	2.03	202.96	
15	040303002002	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	9.99	528.47	5279.42	
16	010401003004	实心砖墙	1.墙体类型:外墙120mm 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	5.73	584.28	3347.92	
17	010401003005	实心砖墙	1.墙体类型:外墙240mm 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	9.37	547.51	5130.17	
		砖砌花基合计					13960.47	
		片石挡土墙						
18	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	2070.48	8.81	18240.93	
19	040103001004	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原土回填	m3	1791.46	12.20	21855.81	
20	040303002003	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20片石混凝土 2.嵌料(毛石)比例:3:7	m3	264.97	450.40	119342.49	
本页小计							196456.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20商品混凝土	m3	2.75	525.85	1446.09	
22	040303002004	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	0.68	528.47	359.36	
23	040305003001	浆砌块料	1.材料品种、规格:片石 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 3.泄水孔材料品种、规格:PVC塑料管Φ100 4.滤水层要求:碎石滤水层 5.沉降缝要求:沥青麻筋	m3	233.97	438.99	102710.49	
24	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.泄水孔材料品种、规格:PVC塑料管Φ100 3.滤水层要求:碎石滤水层 4.沉降缝要求:沥青麻筋	m3	13.69	585.96	8021.79	
25	040305003002	浆砌块料	1.材料品种、规格:片石 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	3.6	416.20	1498.32	
26	011102001001	石材楼地面（亲水平台）	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm芝麻灰花岗岩	m2	152	89.84	13655.68	
27	011101001001	水泥砂浆楼地面（亲水平台）	1.面层厚度、砂浆配合比:2cm厚1:2水泥砂浆	m2	13	17.51	227.63	
		片石挡土墙合计					287358.59	
		石墙						
28	040303002005	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25	m3	2.7	528.47	1426.87	
29	040305003003	浆砌块料	1.材料品种、规格:片石 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	8.87	416.20	3691.69	
		石墙合计					5118.56	
		成品风车						
30	040303002006	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20商品混凝土	m3	1.8	518.80	933.84	
31	040303002007	成品风车	1.成品风车（3m高）	座	1	8181.10	8181.10	
		成品风车合计					9114.94	
		砖砌排水沟						
本页小计							142152.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	040501016001	砌筑方沟	1.断面规格:450×570mm 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5 5.勾缝、抹面要求:20厚1：2水泥砂浆	m	48	189.42	9092.16	
33	040501016002	砌筑方沟	1.断面规格:300×700mm 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5 5.勾缝、抹面要求:1：2水泥砂浆	m	66.1	240.38	15889.12	
34	040501016003	砌筑方沟	1.断面规格:沟壁高420mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 4.勾缝、抹面要求:1：2水泥砂浆	m	14.1	60.15	848.12	
		砖砌排水沟合计					25829.40	
		人行道（含景墙三前广场）						
35	040204001001	人行道整形碾压	1.部位:人行道整形碾压	m2	388.8	2.06	800.93	
36	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:全彩色(灰色)环保砖 240×120×60mm 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm 1:3干硬性水泥砂浆 3.基础、垫层:材料品种、厚度: 120厚C20混凝土垫层	m2	388.8	154.47	60057.94	
		人行道（含景墙三前广场）合计					60858.87	
		沙池						
37	040103001005	回填方	1.填方材料品种:细沙	m3	4.2	188.70	792.54	
本页小计							87480.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:封开花岗岩侧石 500×100×200mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土后座	m	16	104.17	1666.72	
		沙池合计					2459.26	
		混凝土路面						
39	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床碾压检验	m2	104.03	2.36	245.51	
40	040202011002	石屑	1. 石料规格:石屑 2. 厚度:80mm	m2	96.5	13.40	1293.10	
41	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:100mm 3. 路面养生:水养生	m2	96.5	65.87	6356.46	
42	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:50mm 3. 路面养生:水养生	m2	7.53	40.97	308.50	
		混凝土路面合计					8203.57	
		汀步						
43	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压	m2	85.05	2.06	175.20	
44	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:80mm	m2	85.05	41.65	3542.33	
45	050201013001	石汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格:芝麻灰石板 800×500×15mm 2. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆 20mm	m3	50.4	69.99	3527.50	
		汀步合计					7245.03	
		素砼汀步						
46	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	3.2	535.52	1713.66	
47	040303002008	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	6.48	528.47	3424.49	
		素砼汀步合计					5138.15	
		其他部分						
48	040101003001	挖树洞	1. 人工挖树洞	m3	14.87	21.34	317.33	
49	040103001006	挖树洞回填	1. 挖树洞回填	m3	14.87	33.09	492.05	
本页小计							23062.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	粤R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1.结构类型:拆砖房 2.建筑层数、高度:三层以内 3.废料外运:10km	m2	157	81.37	12775.09	
51	040101001005	平整场地	1.清杂及平整场地	m3	984	1.21	1190.64	
52	010401012003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:封门洞 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.3888	1004.23	390.44	
53	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆	m2	99.06	41.32	4093.16	
54	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙批荡 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2水泥砂浆	m2	1.5	25.69	38.54	
55	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆	m2	10	17.51	175.10	
56	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2水泥砂浆	m2	32	12.59	402.88	
57	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:石墙 2.废料外运:10km	m3	4.37	161.25	704.66	
58	040103001007	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:远运利用 3.填方来源、运距:石板围村取土	m3	31	15.88	492.28	
		其他部分合计					21072.17	
		园建合计					521855.03	
		分部分项合计					521855.03	
		措施项目						
59	041101001001	墙面脚手架	1.墙高:4.5m以内	m2	445.83	2.22	989.74	
60	011702027001	台阶	1.构件类型:台阶模板	m2	42.21	37.39	1578.23	
61	041102002001	基础模板	1.构件类型:基础模板	m2	713.09	59.80	42642.78	
62	041102001001	垫层模板	1.构件类型:垫层模板	m2	19.87	39.69	788.64	
63	041102017001	挡墙模板	1.构件类型:砼墙模板	m2	36.49	61.37	2239.39	
本页小计							68501.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	041102037001	其他现浇构件模板	1.构件类型:后座模板	m2	8	26.86	214.88	
		单价措施合计					48453.66	
本页小计							214.88	
合　计							570308.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费			30323.78			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费						以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费						以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费						按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
								计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费						赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计					30323.78			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	37473.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	11012.31		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	48485.38		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元	37473.07	
合　计			37473.07	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	649117.85	9	58420.61
合　计					58420.61

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：市政工程　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	综合工日	工日	25.4923		95.22	90.58		
2	人工费	元	147532.5508		0.99	0.99		
3	人工费调整	元	0.0155		1.00	1.00		
4	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	1.3194		5.03	4.84		
5	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	0.4725		4.80	4.80		
6	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	297.929		4.54	4.32		
7	塑料薄膜	m2	25.5882		2.17	2.06		
8	尼龙帽 Φ1.5	个	13.0269		2.14	2.04		
9	土工布	m2	88.0491		10.40	9.96		
10	麻袋	个	50.1358		1.89	1.82		
11	油麻丝	kg	9.744		8.60	8.18		
12	铁钉	kg	0.2878		5.00	4.76		
13	圆钉 综合	kg	152.1294		5.00	4.79		
14	圆钉 50~75	kg	8.8958		5.00	4.79		
15	铁件 综合	kg	43.7629		7.50	7.19		
16	零星卡具	kg	140.2497		5.47	5.24		
17	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.649		350.00	335.19		
18	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0227		500.00	481.82		
19	细砂	m3	5.418		135.00	128.43		
20	碎石 20~40	m3	7.2237		135.00	129.29		
21	碎石 40	m3	3.2436		135.00	129.29		
22	碎石 60	m3	2.0643		135.00	129.29		
23	片石	m3	371.323		105.00	99.88		
24	石屑	m3	11.256		105.00	100.55		
25	灰砂砖 240×115×53	千块	8.138		410.00	390.03		
26	青砖 240×115×53	千块	3.2112		2800.00	2663.62		
27	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	11.9473		410.00	395.08		
28	红砖	块	3.2899		0.42	0.40		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：市政工程　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
29	红砖 240×115×53	块	25.4601		0.42	0.40		
30	板枋材 综合	m3	1.7269		1400.00	1340.73		
31	松杂板枋材	m3	0.3561		1240.00	1187.50		
32	定型板 1000×500×15	件	4.05		6.83	6.83		
33	松杂直边板	m3	0.0203		1350.00	1350.00		
34	芝麻灰花岗岩 20mm	m2	154.28		49.56	47.14		
35	芝麻灰石板 800×500×15mm	m2	51.156		37.17	35.35		
36	芝麻灰花岗岩拼花 20mm	m2	25.7449		49.56	47.14		
37	氧气	m3	4.71		5.05	4.80		
38	乙炔气	kg	2.041		7.57	7.20		
39	酚醛红丹防锈漆	kg	3.8138		16.60	16.60		
40	石油沥青 30#	kg	10.3936		3.80	3.64		
41	模板嵌缝料	kg	1.8245		1.71	1.63		
42	嵌缝料	kg	2.1105		0.58	0.57		
43	松节油	kg	1.1948		7.30	7.30		
44	石蜡	kg	6.0391		3.00	2.89		
45	草酸	kg	2.2562		5.59	5.39		
46	隔离剂	kg	2.9105		7.05	6.75		
47	脱模剂	kg	77.5207		5.13	4.91		
48	PVC塑料排水管 φ100	m	114.0564		16.03	15.25		
49	草板纸 80#	张	213.927		4.53	4.31		
50	白棉纱	kg	3.4184		12.42	11.96		
51	水	m3	351.9556		4.18	4.00		
52	复合木模板面板	m2	11.5521		29.91	28.45		
53	钢模板	kg	13.053		5.44	5.21		
54	组合钢模板	kg	21.5291		5.18	4.95		
55	脚手架接驳管 φ43×350	支	1.5053		5.74	5.74		
56	脚手架钢管底座	个	1.4648		7.05	7.05		
57	脚手架钢管 φ51×3.5	m	8.3768		13.08	13.08		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：市政工程　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
58	木支撑	m3	5.2697		1651.95	1571.48		
59	脚手架活动扣(含螺丝)	套	2.2613		5.62	5.62		
60	脚手架直角扣(含螺丝)	套	5.9333		5.24	5.24		
61	钢支撑	kg	20.3614		3.88	3.72		
62	其他材料费	元	2407.9081		1.00	1.00		
63	其他材料费	元	1505.963		1.00	1.00		
64	材料费调整	元	0.0125		1.00	1.00		
65	成品风车 3m高	座	1		8600.00	8181.10		
66	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	6.9401		350.00	337.27		
67	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	286.9355		360.00	344.76		
68	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	63.0904		370.00	354.33		
69	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	21.6588		380.00	366.18		
70	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	m3	88.2256		390.00	371.01		
71	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	17.2022		440.00	424.01		
72	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m3	11.975		395.00	380.63		
73	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m3	6.4346		410.00	390.03		
74	全彩色(灰色)环保砖 240×120×60mm	m2	396.576		58.70	55.83		
75	封开花花岗岩侧石 500×100×200mm	m	16.24		62.28	59.24		
76	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.088					
77	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	9.4241					
78	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.6214					
79	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	5.3313					
80	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3	4.863					
81	预拌砂浆	m3	11.9801					

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：市政工程　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
82	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m3	16.2191					
83	预拌水泥石灰砂浆 1:2:8	m3	9.1919					
84	预拌混凝土	m3	380.4953					
85	机上人工	工日	100.339		227.70	227.70		
86	折旧费	元	6790.3561		1.00	1.00		
87	检修费	元	2074.1845		1.00	1.00		
88	维护费	元	5343.9245		1.00	1.00		
89	安拆费	元	434.2063		1.00	1.00		
90	汽油（机械用）国III93#	kg	33.0346		8.90	8.52		
91	柴油（机械用）0#	kg	1825.4545		7.49	7.49		
92	电（机械用）	kw·h	353.5904		0.81	0.78		
93	折旧费	元	1222.0106		1.00	1.00		
94	大修理费	元	267.0427		1.00	1.00		
95	经常修理费	元	683.8926		1.00	1.00		
96	汽油（机械用）国III93#	kg	237.1883		8.90	8.47		
97	柴油（机械用）0#	kg	251.2		7.49	7.49		
98	其他费用	元	247.4786		1.00	1.00		
99	机上人工	工日	13.5781		95.22	95.22		
100	机械费调整	元	3.7057		1.00	1.00		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	16831.24	
1.1	砖砌景墙	16831.24	
2	措施合计	2279.98	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1758.43	
2.2	其他措施费	521.55	
3	其他项目	1451.20	—
3.1	暂列金额	1209.26	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	241.94	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	20562.42	
5	增值税销项税额	1850.62	—
6	总造价	22413.04	
7	人工费	4306.26	
投标报价合计=1+2+3+5		22,413.04	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		砖砌景墙						
1	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.9	438.30	832.77	
2	010401009001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:青砖 260×125×70mm 2.柱类型:矩形 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.95	1393.48	1323.81	
3	010401009002	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:青砖 240×115×53mm 2.柱类型:矩形 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.76	1911.73	1452.91	
4	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:红砖 240×115×53mm 2.墙体类型:120mm外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	3.58	374.88	1342.07	
5	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:青砖 260×125×70mm 2.墙体类型:260mm外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	3.31	1283.59	4248.68	
6	010401003004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:青砖 240×115×53mm 2.墙体类型:120mm外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	1.46	1861.75	2718.16	
7	010401007001	空花墙	1.砖品种、规格、强度等级:青砖 260×125×70mm 2.墙体类型:空花墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.83	1077.34	894.19	
8	010401007002	空花墙	1.砖品种、规格、强度等级:青砖 240×115×53mm 2.墙体类型:空花墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.27	1442.26	389.41	
本页小计							13202.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	010401007003	空花墙	1.砖品种、规格、强度等级:红砖 240×115×53mm 2.墙体类型:空花墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.46	376.97	173.41	
10	011201003001	墙面勾缝	1.勾缝类型:凹缝	m2	28.87	29.22	843.58	
11	011204003001	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:瓦片叠放 180*180*7mm小青瓦	m2	6.63	79.17	524.90	
12	011204003002	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:叠放仿古12墙青瓦	m2	5.27	79.17	417.23	
13	011204003003	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:叠放仿古12墙青瓦2层	m2	2.4	158.36	380.06	
14	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:小青瓦盖瓦160×160×11mm 2.粘结层砂浆的配合比:水泥砂浆1:2	m2	9.22	139.92	1290.06	
		砖砌景墙合计					16831.24	
		分部分项合计					16831.24	
		措施项目						
15	粤011701009001	单排钢脚手架	1.单排钢脚手架 高度(m以内)10	m2	126.49	8.71	1101.73	
16	011702001001	基础	1.基础类型:基础模板	m2	11.18	46.65	521.55	
		单价措施合计					1623.28	
本页小计							5252.52	
合　计							18454.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费			656.70			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费						以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费						以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费						赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					656.70			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1209.26		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	241.94		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	1451.20		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元	1209.26	
合　计			1209.26	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

四川蔡福建筑工程有限公司

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	20562.42	9	1850.62
合　计					1850.62

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	人工费	元	4349.7372		0.99	0.99		
2	土工布	m2	2.2344		10.40	9.96		
3	圆钉 综合	kg	0.1159		5.00	4.79		
4	圆钉 50~75	kg	2.5866		5.00	4.79		
5	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.1114		350.00	335.19		
6	中砂	m3	0.0004		135.00	131.32		
7	生石灰	t	0.0001		455.00	438.17		
8	青砖 260×125×70	千块	1.7007		2800.00	2723.67		
9	青砖 240×115×53	千块	1.3548		2800.00	2663.62		
10	红砖	块	0.184		0.42	0.40		
11	红砖 240×115×53	块	1.9987		0.42	0.40		
12	小青瓦盖瓦 160×160×11	千块	0.8552		1100.00	1070.94		
13	松杂板枋材	m3	0.1051		1240.00	1187.50		
14	防水胶合板 模板用 18mm	m2	1.677		35.00	33.73		
15	酚醛红丹防锈漆	kg	2.9093		16.80	16.80		
16	松节油	kg	0.3162		7.39	7.39		
17	隔离剂	kg	1.118		7.05	6.75		
18	钢管 Φ48.3×3.6	m	4.3007		13.08	13.08		
19	水	m3	1.4927		4.18	4.00		
20	脚手架接驳管 Φ43×350	支	1.4673		5.74	5.74		
21	脚手架钢管底座	个	0.2909		7.05	7.05		
22	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.4933		5.62	5.62		
23	脚手架直角扣(含螺丝)	套	3.2887		5.24	5.24		
24	其他材料费	元	47.6824		1.00	1.00		
25	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.919		370.00	354.33		
26	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	2.3084		380.00	366.18		
27	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.1023		440.00	424.01		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
28	预拌石灰砂浆 1:3	m3	0.1023					
29	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m3	1.9732					
30	预拌水泥石灰砂浆 M7.5	m3	0.3352					
31	预拌混凝土	m3	1.9285					
32	瓦片叠放 180*180*7mm小青瓦	m2	6.63		81.40	79.17		
33	叠放仿古12墙青瓦	m2	5.27		81.40	79.17		
34	叠放仿古12墙青瓦2层	m2	2.4		162.80	158.36		
35	机上人工	工日	0.1141		227.70	227.70		
36	折旧费	元	6.813		1.00	1.00		
37	检修费	元	1.2555		1.00	1.00		
38	维护费	元	7.1311		1.00	1.00		
39	安拆费	元	0.5077		1.00	1.00		
40	柴油（机械用）0#	kg	3.5268		7.49	7.49		
41	电（机械用）	kw·h	1.0837		0.81	0.78		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：管网工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	176689.95	
2	措施合计	18683.64	
2.1	绿色施工安全防护措施费	7695.32	
2.2	其他措施费	10988.32	
3	其他项目	15479.72	—
3.1	暂列金额	12682.35	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	2797.37	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	210853.31	
5	增值税销项税额	18976.80	—
6	总造价	229830.11	
7	人工费	34291.45	
投标报价合计=1+2+3+5		229,830.11	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	1307.2	9.33	12196.18	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:本桩利用	m3	946.39	11.21	10609.03	
3	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:石屑垫层 300mm 2. 管座材质:C15混凝土（120°） 3. 规格:II级钢筋混凝土管DN800*80 4. 接口方式:水泥砂浆、胶圈 5. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	196.06	634.34	124368.70	
4	040501001002	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:石屑垫层 300mm 2. 管座材质:C15混凝土（120°） 3. 规格:II级钢筋混凝土管DN500*55 4. 接口方式:水泥砂浆、胶圈 5. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	13.65	332.09	4533.03	
5	040501001003	混凝土管	1. 管座材质:C30混凝土包封 2. 规格:II级钢筋混凝土管DN500*55 3. 接口方式:水泥砂浆、胶圈 4. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	14	366.11	5125.54	
6	040501001004	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:石屑垫层 300mm 2. 管座材质:C15混凝土（120°） 3. 规格:II级钢筋混凝土管DN300*40 4. 接口方式:水泥砂浆、胶圈 5. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	6.03	205.73	1240.55	
本页小计							158073.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:石屑垫层 200mm 2. 材质及规格:双壁波纹管DN300, 环刚度8KN/m2 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	40.12	196.97	7902.44	
8	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:石屑垫层 200mm 2. 材质及规格:PVC管DN200 3. 连接形式:粘接 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	4.87	92.58	450.86	
9	040504001001	砌筑井	1. 名称:DN1250mm圆形检查井 2. 结构及做法:详图集06MS201-13, 页9	座	3	2614.04	7842.12	
10	040504001002	砌筑井	1. 名称:方形检查井 980×1180×1000mm 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53mm 4. 勾缝、抹面要求:20mm 1:2水泥砂浆 5. 砂浆强度等级、配合比:M10 6. 井圈混凝土强度等级:C25 7. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 700×500mm	座	1	1177.01	1177.01	
11	040504001003	砌筑井	1. 名称:方形检查井 1450×1000×700mm 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53mm 4. 勾缝、抹面要求:20mm 1:2水泥砂浆 5. 砂浆强度等级、配合比:M10 6. 井圈混凝土强度等级:C25 7. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 970×520mm	座	1	1244.49	1244.49	
本页小计							18616.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					176689.95	
		措施项目						
12	041102002001	基础模板	1.构件类型:钢筋混凝土管座	m2	178.31	59.47	10604.10	
13	041102001001	垫层模板	1.构件类型:垫层模板	m2	1.08	39.69	42.87	
14	041102037001	其他现浇构件模板	1.构件类型:井圈模板	m3	0.69	494.71	341.35	
		单价措施合计					10988.32	
本页小计							10988.32	
合　计							187678.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费			7695.32			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费						以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费						以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费						按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
								计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费						赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计					7695.32			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12882.35		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2797.37		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	15479.72		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：管网工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元	12682.35	
合　计			12682.35	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管网工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：管网工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	210853.31	9	18976.80
合　计					18976.8

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管网工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：管网工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	人工费	元	34637.6645		0.99	0.99		
2	人工费调整	元	0.1558		1.00	1.00		
3	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	0.3367		5.03	4.84		
4	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	1.835		4.54	4.32		
5	塑料薄膜	m2	240.2725		2.17	2.06		
6	圆钉 综合	kg	37.8282		5.00	4.79		
7	水砂纸	张	5.9378		0.77	0.75		
8	铁砂布 0~2#	张	0.0916		0.94	0.90		
9	零星卡具	kg	39.3031		5.47	5.24		
10	石屑	m3	165.262		105.00	100.55		
11	标准砖 240×115×53	千块	4.5833		420.00	404.67		
12	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	0.4141		410.00	395.08		
13	板枋材 综合	m3	0.3773		1400.00	1340.73		
14	润滑脂	kg	0.7222		34.61	33.34		
15	丙酮	kg	0.0964		9.74	9.37		
16	脱模剂	kg	19.2279		5.13	4.91		
17	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0643		14.02	13.51		
18	焊接钢管 DN40	m	0.0809		16.09	15.51		
19	橡胶管 综合	m	4.048		17.09	16.46		
20	塑钢踏步	kg	12.309		6.29	6.05		
21	草板纸 80#	张	53.493		4.53	4.31		
22	水	m3	188.2509		4.18	4.00		
23	复合木模板面板	m2	3.6732		29.91	28.45		
24	钢模板	kg	1.6208		5.44	5.21		
25	木支撑	m3	1.0716		1651.95	1571.48		
26	其他材料费	元	1292.2677		1.00	1.00		
27	材料费调整	元	-0.15		1.00	1.00		
28	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	72.9051		350.00	337.27		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：管网工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
29	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.1313		370.00	354.33		
30	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	4.4884		380.00	363.89		
31	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M7.5	m3	2.3881		380.00	366.18		
32	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M10	m3	0.3699		390.00	371.01		
33	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.9759		440.00	424.01		
34	湿拌防水砂浆：P10 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	0.432		400.00	385.40		
35	橡胶圈 DN500	个	12.36		41.80	40.27		
36	橡胶圈 DN300	个	3.09		14.53	13.99		
37	橡胶圈 DN400	个	8.2647		19.12	18.42		
38	橡胶圈 DN800	个	100.94		54.91	52.90		
39	双壁波纹管 DN400,环刚度8 KN/m2	m	40.5212		146.00	140.66		
40	PVC-U排水管 Φ200*4.9	m	4.8359		50.98	49.12		
41	II级钢筋混凝土管 DN800*80	m	198.0206		256.78	247.40		
42	II级钢筋混凝土管 DN300*40	m	6.0903		70.44	67.87		
43	II级钢筋混凝土管 DN500*55	m	27.9265		109.49	105.50		
44	PVC-U排水管直通 Φ200	个	0.2338		18.41	17.73		
45	井盖球墨铸铁轻型井盖(带防盗锁) DN700	套	3		510.00	491.37		
46	铸铁井盖 700×500mm	套	1		315.00	303.50		
47	铸铁井盖 970×520mm	套	1		480.00	462.46		
48	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.7759					
49	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	2.7762					
50	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3	0.7011					
51	预拌混凝土	m3	75.9288					

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：管网工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
52	预拌混凝土 C15	m3	1.596					
53	机上人工	元	30.5728		227.70	227.70		
54	折旧费	元	2513.3384		1.00	1.00		
55	检修费	元	866.4846		1.00	1.00		
56	维护费	元	2202.3428		1.00	1.00		
57	安拆费	元	157.8493		1.00	1.00		
58	汽油（机械用）国III93#	kg	21.4582		8.90	8.52		
59	柴油（机械用）0#	kg	699.4527		7.49	7.49		
60	电（机械用）	kw·h	241.7619		0.81	0.78		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	924143.99	
2	措施合计	40934.11	
2.1	绿色施工安全防护措施费	31661.07	
2.2	其他措施费	9273.04	
3	其他项目	85330.59	—
3.1	暂列金额	66338.40	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	18992.19	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1050408.69	
5	增值税销项税额	94536.78	—
6	总造价	1144945.47	
7	人工费	164821.75	
投标报价合计=1+2+3+5		1,144,945.47	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 名称:绿化地带除杂草 2. 弃渣运距:10km	m2	4489	5.04	22624.56	
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:500mm 2. 回填土质要求:种植土 3. 弃土运距:10km	m3	2244.5	71.21	159830.85	
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类:紫花风铃木 2. 胸径或干径:胸径50-60mm，株高3000-4000mm，冠幅2500-3000mm 3. 养护期:12个月	株	87	942.95	82036.65	
4	050102001002	栽植乔木	1. 种类:芒果 2. 胸径或干径:胸径60-100mm，株高2500-3000mm，冠幅1200-1500mm 3. 养护期:12个月	株	173	364.42	63044.66	
5	050102001003	栽植乔木	1. 种类:冬青 2. 胸径或干径:胸径150-160mm，株高4000-4500mm，冠幅3000-4000mm 3. 养护期:12个月	株	1	1347.66	1347.66	
6	050102001004	栽植乔木	1. 种类:凤凰 2. 胸径或干径:胸径150-160mm，株高4000-4500mm，冠幅3000-4000mm 3. 养护期:12个月	株	1	1591.03	1591.03	
7	050102001005	栽植乔木	1. 种类:树菠萝 2. 胸径或干径:胸径40-50mm，株高2000-2500mm，冠幅1200mm 3. 养护期:12个月	株	2	269.96	539.92	
8	050102001006	栽植乔木	1. 种类:紫荆 2. 胸径或干径:胸径300-330mm，株高7000-8000mm，冠幅4000-4500mm 3. 养护期:12个月	株	1	4712.25	4712.25	
本页小计							335727.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	050102001007	栽植乔木	1.种类:加拿果 2.胸径或干径:胸径40mm，株高1700-1800mm，冠幅1000-1200mm 3.养护期:12个月	株	13	473.87	6160.31	
10	050102001008	栽植乔木	1.种类:红千层 2.胸径或干径:胸径30-40mm，株高1800-2000mm，冠幅1200-1500mm 3.养护期:12个月	株	27	392.89	10608.03	
11	050102001009	栽植乔木	1.种类:黄皮 2.胸径或干径:胸径40-50mm，株高2000-2500mm，冠幅1200mm 3.养护期:12个月	株	5	211.36	1056.80	
12	050102001010	栽植乔木	1.种类:造型勒杜鹃 2.胸径或干径:头径31mm，胸径不少于80mm，株高2000mm，冠幅1500mm 3.养护期:12个月	株	6	349.76	2098.56	
13	050102001011	栽植乔木	1.种类:桂花 2.胸径或干径:胸径60-80mm，株高2000-2500mm，冠幅1200-1500mm 3.养护期:12个月	株	3	456.35	1369.05	
14	050102001012	栽植乔木	1.种类:紫甘露 2.胸径或干径:胸径30mm，株高1700-1800mm，冠幅1000-1200mm 3.养护期:12个月	株	13	360.55	4687.15	
15	050102001013	栽植乔木	1.种类:罗汉松A 2.胸径或干径:胸径80-100mm，株高3500-4000mm，冠幅2000-2500mm 3.养护期:12个月	株	1	1126.54	1126.54	
16	050102001014	栽植乔木	1.种类:高杆黄金柳 2.胸径或干径:胸径50mm，株高1800-2000mm，冠幅600mm 3.养护期:12个月	株	1	199.10	199.10	
本页小计							27305.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	050102001015	栽植乔木	1.种类:罗汉松B 2.胸径或干径:胸径30mm，株高2000-2500mm，冠幅800mm 3.养护期:12个月	株	1	259.97	259.97	
18	050102001016	栽植乔木	1.种类:罗汉松C 2.胸径或干径:胸径30mm，株高1800-2000mm，冠幅600mm 3.养护期:12个月	株	5	244.92	1224.60	
19	050102001017	栽植乔木	1.种类:高桩亮晶 2.胸径或干径:胸径30mm，株高1800-2000mm，冠幅600mm 3.养护期:12个月	株	1	271.98	271.98	
20	050102001018	栽植乔木	1.种类:红枫 2.胸径或干径:胸径30mm，株高1300-1500mm，冠幅800-1000mm 3.养护期:12个月	株	2	174.18	348.36	
21	050102001019	栽植乔木	1.种类:幌伞枫 2.胸径或干径:胸径250mm，株高4000-4500mm，冠幅3000-4000mm 3.养护期:12个月	株	1	2609.71	2609.71	
22	050102001020	栽植乔木	1.种类:幌伞枫B 2.胸径或干径:胸径400-450mm，株高7000-8000mm，冠幅4000-4500mm 3.养护期:12个月	株	1	6597.90	6597.90	
23	050102001021	栽植乔木	1.种类:秋枫 2.胸径或干径:胸径300-330mm，株高7000-8000mm，冠幅4000-4500mm 3.养护期:12个月	株	3	5952.75	17858.25	
24	050102001022	栽植乔木	1.种类:紫花风铃木 2.胸径或干径:胸径30mm，株高1300-1500mm，冠幅800-1000mm 3.养护期:12个月	株	9	531.10	4779.90	
本页小计							33950.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	050102001023	栽植乔木	1.种类:紫薇 2.胸径或干径:胸径30mm，株高1300-1500mm，冠幅800-1000mm 3.养护期:12个月	株	46	258.59	11895.14	
26	050102001024	栽植乔木	1.种类:乌桕 2.胸径或干径:胸径10mm，株高2000-2500mm，冠幅600mm 3.养护期:12个月	株	1	147.25	147.25	
27	050102001025	栽植乔木	1.种类:红刺林头树 2.胸径或干径:胸径350-400mm，株高6000-7000mm，冠幅4000-4500mm 3.养护期:12个月	株	1	2567.77	2567.77	
28	050102001026	栽植乔木	1.种类:造型大红花 2.胸径或干径:胸径40mm，株高2000-2500mm，冠幅600mm 3.养护期:12个月	株	1	246.24	246.24	
29	050102001027	栽植乔木	1.种类:鸡蛋花 2.胸径或干径:胸径35mm，株高1500-1800mm，冠幅800mm 3.养护期:12个月	株	1	468.56	468.56	
30	050102001028	栽植乔木	1.种类:桩景洒金榕 2.胸径或干径:胸径50mm，株高3000-3500mm，冠幅1000mm 3.养护期:12个月	株	1	214.59	214.59	
31	050102002001	栽植灌木	1.种类:非洲茉莉球 2.苗高、冠径:冠幅1000mm，株高1000mm 3.养护期:12个月	株	48	176.89	8490.72	
32	050102002002	栽植灌木	1.种类:老鸭嘴 2.苗高、冠径 :冠幅700mm，株高300-400mm 3.养护期:12个月	株	9	84.71	762.39	
33	050102002003	栽植灌木	1.种类:亮晶球 2.苗高×冠径:冠幅600mm，株高400mm 3.养护期:12个月	株	5	77.17	385.85	
本页小计							25178.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	050102002004	栽植灌木	1. 种类:茶花 2. 苗高×冠径:冠幅800mm，株高500mm 3. 养护期:12个月	株	13	144.90	1883.70	
35	050102002005	栽植灌木	1. 种类:塔型红车 2. 冠丛高:冠幅1200mm，株高600mm 3. 养护期:12个月	株	7	155.68	1089.76	
36	050102002006	栽植灌木	1. 种类:罗汉松球 2. 苗高×冠径:冠幅2000-2500mm，株高800mm 3. 养护期:12个月	株	3	370.28	1110.84	
37	050102002007	栽植灌木	1. 种类:毛杜鹃 2. 苗高、冠径:冠幅1000mm，株高1000mm 3. 养护期:12个月	株	3	166.43	499.29	
38	050102002008	栽植灌木	1. 种类:红珊瑚 2. 苗高×冠径:冠幅600mm，株高400mm 3. 养护期:12个月	株	1	59.77	59.77	
39	050102002009	栽植灌木	1. 种类:红继木球 2. 冠丛高:冠幅1200mm，株高1200mm 3. 养护期:12个月	株	7	221.56	1550.92	
40	050102002010	栽植灌木	1. 种类:苏铁 2. 苗高×冠径:冠幅2000-2200mm，株高1300mm 3. 养护期:12个月	株	1	414.98	414.98	
41	050102002011	栽植灌木	1. 种类:变叶木 2. 苗高、冠径:冠幅1000mm，株高1000mm 3. 养护期:12个月	株	3	172.81	518.43	
42	050102002012	栽植灌木	1. 种类:粉红金花 2. 苗高×冠径:冠幅600mm，株高600mm 3. 养护期:12个月	株	17	108.20	1839.40	
本页小计							8967.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:矮花翠芦莉 2. 株高或蓬径:株高250mm，冠幅150mm 3. 单位面积株数:36株/m2，七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	29	126.45	3667.05	
44	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 株高或蓬径:株高450mm，冠幅150mm 3. 单位面积株数:36株/m2，七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	1725	137.03	236376.75	
45	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:海南洒金 2. 株高或蓬径:株高250mm，冠幅150mm 3. 单位面积株数:36株/m2，七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	177	188.41	33348.57	
46	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类:红檵木 2. 株高或蓬径:株高250mm，冠幅150mm 3. 单位面积株数:36株/m2，七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	35	150.99	5284.65	
47	050102008005	栽植花卉	1. 花卉种类:红绒球 2. 株高或蓬径:株高250mm，冠幅150mm 3. 单位面积株数:36株/m2，七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	20	124.90	2498.00	
48	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类:花叶连翘 2. 株高或蓬径:株高250mm，冠幅150mm 3. 单位面积株数:36株/m2，七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	1	142.67	142.67	
本页小计							281317.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	050102008007	栽植花卉	1. 花卉种类:花叶鸭脚木 2. 株高或蓬径:株高250mm，冠幅150mm 3. 单位面积株数:36株/m2，七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	18	129.06	2323.08	
50	050102008008	栽植花卉	1. 花卉种类:蓝雪花 2. 株高或蓬径:株高450mm，冠幅450mm 3. 单位面积株数:36株/m2，七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	10	282.56	2825.60	
51	050102008009	栽植花卉	1. 花卉种类:亮叶朱蕉 2. 株高或蓬径:株高450mm，冠幅250mm 3. 单位面积株数:36株/m2，七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	151	154.01	23255.51	
52	050102008010	栽植花卉	1. 花卉种类:龙船花 2. 株高或蓬径:株高250mm，冠幅150mm 3. 单位面积株数:36株/m2，七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	79	139.65	11032.35	
53	050102008011	栽植花卉	1. 花卉种类:美人蕉 2. 株高或蓬径:株高500mm，冠幅450mm 3. 单位面积株数:36株/m2，七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	55	138.84	7636.20	
54	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:格桑花种子 2. 养护期:12个月	m2	2763	18.90	52220.70	
55	050102008012	栽植花卉	1. 花卉种类:星花 2. 株高或蓬径:株高250mm，冠幅150mm 3. 单位面积株数:36株/m2，七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	24	122.29	2934.96	
本页小计							102228.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	050102008013	栽植花卉	1.花卉种类:银边草 2.株高或蓬径:株高250mm，冠幅150mm 3.单位面积株数:36株/m2，七斤袋 4.养护期:12个月	m2	127	109.44	13898.88	
57	050102008014	栽植花卉	1.花卉种类:紫杜丹 2.株高或蓬径:株高250mm，冠幅150mm 3.单位面积株数:36株/m2，七斤袋 4.养护期:12个月	m2	15	118.89	1783.35	
58	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:台湾草 300X300 2.养护期:12个月	m2	2023	46.36	93786.28	
		分部分项合计					924143.99	
		措施项目						
59	050403001001	树木支撑架	1.支撑类型、材质:成品镀锌钢管三脚桩	株	7	201.92	1413.44	
60	050403001002	树木支撑架	1.支撑类型、材质:松木桩 杆长1.2m内	株	401	19.60	7859.60	
		单价措施合计					9273.04	
本页小计							118741.55	
合　计							933417.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费			31661.07			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费						以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费						以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费						赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58 （0.8≤δ＜1式中：δ=合同工期/定额工期）
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					31661.07			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	66338.40		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	18992.19		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	85330.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元	66338.40	
合　计			66338.40	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

四川豪信建筑工程有限公司

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1050408.69	9	94536.78
合　计					94536.78

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	人工费	元	166486.2357		0.99	0.99		
2	镀锌低碳钢丝　Φ1.2~2.5	kg	40.1		4.80	4.80		
3	余土外运	m3	2529.9377					
4	熟耕土(松方)	m3	104.581		30.00	28.67		
5	通用种植土(松方)	m3	1806.8225		43.00	41.09		
6	格桑花种子	kg	493.1955		19.00	18.20		
7	杀虫剂	kg	94.281		17.09	16.32		
8	无机肥(复合肥)	kg	1134.207		3.21	3.07		
9	有机肥	t	74.8798		432.00	412.80		
10	成品镀锌钢管护树桩（三脚桩）	套	7		164.98	158.17		
11	松木桩(支撑) 1.2m内	条	1227.06		5.00	4.77		
12	水	m3	4912.3022		4.18	4.00		
13	其他材料费	元	4416.3109		1.00	1.00		
14	材料费调整	元	-1.163		1.00	1.00		
15	紫薇 胸径30mm，株高1300-1500mm，冠幅800-1000mm	株	47.84		184.15	175.97		
16	紫甘露 胸径30mm，株高1700-1800mm，冠幅1000-1200mm	株	13.52		285.80	274.01		
17	树菠萝 胸径40-50mm，株高2000-2500mm，冠幅1200mm	株	2.08		158.77	152.22		
18	桩景洒金榕 胸径50mm，株高3000-3500mm，冠幅1000mm	株	1.04		103.24	98.98		
19	红千层 胸径30-40mm，株高1800-2000mm，冠幅1200-1500mm	株	28.08		282.05	270.43		
20	鸡蛋花 胸径35mm，株高1500-1800mm，冠幅800mm	株	1.04		357.95	343.19		
21	紫花风铃木B 胸径50-60mm，株高3000-4000mm，冠幅2500-3000m	株	90.48		833.69	799.33		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
	m							
22	加宝果 胸径40mm，株高1700-1800mm，冠幅1000-1200mm	株	13.52		363.27	348.29		
23	黄皮 胸径40-50mm，株高2000-2500mm，冠幅1200mm	株	5.2		100.00	95.88		
24	高杆黄金柳 胸径50mm，株高1800-2000mm，冠幅600mm	株	1.04		87.71	84.09		
25	高桩亮晶 胸径30mm，株高1800-2000mm，冠幅600mm	株	1.04		160.80	154.17		
26	乌桕 胸径40mm，株高2000-2500mm，冠幅600mm	株	1.04		35.69	34.23		
27	造型大红花 胸径40mm，株高2000-2500mm，冠幅600mm	株	1.04		135.00	129.42		
28	桂花 胸径60-80mm，株高2000-2500mm，冠幅1200-1500mm	株	3.12		284.77	273.02		
29	造型勒杜鹃 头径31mm，胸径不少于80mm，株高2000mm，冠幅1500mm	株	6.24		178.46	170.53		
30	芒果 胸径60-100mm，株高2500-3000mm，冠幅1200-1500mm	株	179.92		168.81	161.84		
31	罗汉松A 胸径80-100mm，株高3500-4000mm，冠幅2000-2500mm	株	1.04		933.09	894.64		
32	冬青 胸径150-160mm，株高4000-4500mm，冠幅3000-4000mm	株	1.04		932.55	894.11		
33	凤凰 胸径150-160mm，株高4000-4500mm，冠幅3000-4000mm	株	1.04		1176.61	1128.12		
34	幌伞枫 胸径250mm，株高4000-4500mm，冠幅3000-4000mm	株	1.04		2076.91	1991.31		
35	罗汉松B 胸径30mm，株高2000-2500mm，冠幅800mm	株	1.04		184.93	177.30		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
36	罗汉松C 胸径30mm，株高1800-2000mm，冠幅600mm	株	5.2		169.83	162.83		
37	红枫 胸径30mm，株高1300-1500mm，冠幅800-1000mm	株	2.08		98.91	94.81		
38	秋枫 胸径300-330mm，株高7000-8000mm，冠幅4000-4500mm	株	3.12		5201.33	4986.97		
39	紫花风铃木 胸径30mm，株高1300-1500mm，冠幅800-1000mm	株	9.36		456.82	438.00		
40	紫荆 胸径300-330mm，株高7000-8000mm，冠幅4000-4500mm	株	1.04		3957.30	3794.19		
41	红刺林头树 胸径350-400mm，株高6000-7000mm，冠幅4000-4500mm	株	1.04		1613.24	1546.75		
42	幌伞枫B 胸径400-450mm，株高7000-8000mm，冠幅4000-4500mm	株	1.04		5532.02	5304.04		
43	非洲茉莉球 冠幅1000mm，株高1000mm	从	49.92		80.14	76.83		
44	毛杜鹃 冠幅1000mm，株高1000mm	从	3.12		69.64	66.77		
45	变叶木 冠幅1000mm，株高1000mm	从	3.12		76.04	72.91		
46	亮晶球 冠幅600mm，株高400mm	从	5.2		23.86	22.88		
47	红珊瑚 冠幅600mm，株高400mm	从	1.04		6.43	6.15		
48	粉红金花 冠幅600mm，株高600mm	从	17.68		55.00	52.72		
49	老鸭嘴 冠幅700mm，株高300-400mm	从	9.36		16.87	16.17		
50	茶花 冠幅800mm，株高500mm	从	13.52		77.23	74.05		
51	塔型红车 冠幅1200mm，株高600mm	从	7.28		39.40	37.77		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
52	红继木球 冠幅1200mm，株高1200mm	丛	7.28		105.83	101.12		
53	罗汉松球 冠幅2000-2500mm，株高800mm	丛	3.12		177.57	170.25		
54	苏铁 冠幅2000-2200mm，株高1300mm	丛	1.04		222.41	213.23		
55	翠芦莉 株高450mm，冠幅150mm	株	65205		1.81	1.72		
56	蓝雪花 株高450mm，冠幅450mm	株	378		5.82	5.57		
57	美人蕉 株高500mm，冠幅450mm	株	2079		2.00	1.91		
58	星花 株高250mm，冠幅150mm	株	907.2		1.39	1.33		
59	银边草 株高250mm，冠幅150mm	株	4800.6		1.05	0.99		
60	紫牡丹 株高250mm，冠幅150mm	株	567		1.31	1.24		
61	矮化翠芦莉 株高250mm，冠幅150mm	株	1096.2		1.51	1.44		
62	台湾草 300X300	m2	2124.15		6.50	6.22		
63	红檵木 株高250mm，冠幅150mm	株	1323		2.50	2.41		
64	红绒球 株高250mm，冠幅150mm	株	756		1.80	1.72		
65	花叶连翘 株高250mm，冠幅150mm	株	37.8		2.29	2.19		
66	花叶鸭脚木 株高250mm，冠幅150mm	株	680.4		1.90	1.83		
67	亮叶朱蕉 株高450mm，冠幅250mm	株	5707.8		2.59	2.49		
68	龙船花 株高250mm，冠幅150mm	株	2986.2		2.20	2.11		
69	海南洒金 株高250mm，冠幅150mm	株	6690.6		3.56	3.40		
70	机上人工	工日	212.2593		227.70	227.70		
71	折旧费	元	24115.9503		1.00	1.00		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
72	检修费	元	4664.9819		1.00	1.00		
73	维护费	元	15856.3107		1.00	1.00		
74	汽油 （机械用）国III93#	kg	194.7357		8.90	8.52		
75	柴油 （机械用）0#	kg	7883.3686		7.49	7.49		
76	机械费调整	元	-0.2929		1.00	1.00		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21
