



省道 S537 线(云安区段)细友石场至湾边村段改建工程-供水管道迁改工程施工
(项目名称) (施工)

投 标 文 件

投 标 人：深圳市景鹏建设工程有限公司（盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（签字或盖章）

日 期：2025年02月25日

目 录

一、法定代表人身份证明书.....	3
二、授权委托书（如果有）.....	5
三、投 标 函.....	7
四、投标函附录.....	8
五、拟投入本工程项目主要施工人员简介.....	9
六、投标人声明函.....	68
七、投标人的其他评审情况.....	69
八、需要提供的其他投标资料.....	117
九、投标人承诺书.....	135
十、投标报价.....	136
十一、施工组织设计方案.....	152

（投标人可自行调整目录格式。）

一、法定代表人身份证明书
(或采用工商部门格式)



单位名称：深圳市景鹏建设工程有限公司

单位性质：有限责任公司（法人独资）

地 址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华旺路 221 号科泰大厦 103

成立时间：2017 年 04 月 19 日

经营期限：长期

姓 名： 性别： 年龄： 职务：总经理

系深圳市景鹏建设工程有限公司（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。



投标人：深圳市景鹏建设工程有限公司（盖公章）

日 期：2025 年 02 月 25 日

注：后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。

附法定代表人二代身份证复印件或扫描件



二、授权委托书（如果有）
（或采用工商部门格式）

本授权委托书声明：我_____（姓名）系 深圳市景鹏建设工程有限公司（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托 深圳市景鹏建设工程有限公司（投标人单位名称）的_____（姓名）为我公司参加投标、签署 省道 S537 线(云安区段)细友石场至湾边村段改建工程-供水管道迁改工程施工（项目名称）的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托权限：从本授权委托书发出之日起至 2025 年 12 月 31 日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人 _____（签字） 性别：_ _ 年龄：_ _ 岁

身份证号码：_____ 手机号码：_____

投标人：深圳市景鹏建设工程有限公司（盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托日期：2025 年 02 月 25 日

注：1、后附授权委托人二代身份证复印件或扫描件。

2、本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。

附授权委托人二代身份证复印件或扫描件



三、投标函

致 广东省鲲鹏城市建设投资集团有限公司（招标人）：

1、根据你方的 省道 S537 线(云安区段)细友石场至湾边村段改建工程-供水管道迁改工程施工（项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）陆佰玖拾肆万零肆佰壹拾伍元柒角肆分（RMB: 6940415.74 元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担一切质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 90 个日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第 3.3.1 条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，与贵方的相应施工合同将得到签署及履行，从而使双方共同地受到法律约束。

7、我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认定位的。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标保证金。

10、此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

11、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。

投标人：深圳市景鹏建设工程有限公司（盖公章）

单位地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华旺路 221 号科泰大厦 103

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

邮政编码：518000 电话：_____ 真：_____


开户银行名称：_____

开户银行账号：_____

日期：2025 年 02 月 25 日

四、投标函附录

序号	项目内容	约定内容	是否响应	备注
1	履约保证金	按合同文件约定	是	/
2	施工准备时间	按合同文件约定	是	/
3	误期违约金额	按招标文件规定	是	/
4	误期赔偿费限额	按合同文件约定	是	/
5	提前工期奖	按合同文件约定	是	/
6	提前工期奖限额	按合同文件约定	是	/
7	工期	(90个)日历天	是	/
8	质量标准	按招标文件约定	是	/
9	工程质量违约金最高限额	按合同文件约定	是	/
10	预付款金额	按合同文件约定	是	/
11	预付款保函金额	按合同文件约定	是	/
12	进度款付款时间	按合同文件约定	是	/
13	竣工结算款付款时间	按合同文件约定	是	/
14	保修期	按合同文件约定	是	/
15	投标有效期	按招标文件约定	是	/
16	投标范围	按招标文件约定	是	/
17	第二章“投标人须知”中“投标人须知前附表”1.4.1项规定	按招标文件约定	是	/


 投标人： 深圳市景册建设工程有限公司 (盖公章)

法定代表人或授权委托人： _____ 字或盖章)

日期：2025年02月25日

五、拟投入本工程项目主要施工人员简介

职务	姓名	职称	职称证号	上岗执业或职业资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
施工负责人 (项目经理)		工程师		中华人民共和国一级建造师注册证书	一级		市政公用工程
		工程师		建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(B证)	/		/
项目技术负责人 (项目总工)		工程师		职称证书	中级		市政工程
安全员		/	/	建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证)	/		/
施工员		/	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/		/
质量员		/	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/		/
材料员		/	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/		/
资料员		/	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/		/
注册安全工程师		高级工程师		中华人民共和国注册安全工程师执业证	/		/
造价负责人		/	/	一级注册造价工程师	一级		土木建筑
其他人员		工程师		职称证书	中级		市政工程施工

施工负责人(项目经理)



使用有效期: 2024年11月06日
- 2025年05月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名:

性别:

出生日期:

注册编号:

聘用企业: 深圳市景鹏建设工程有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-08-07至2026-08-06)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名:

签名日期: 2024.11.6

中华人民共和国
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年11月07日



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: []

姓 名: []

性 别: []

出生年月: []

企业名称: 深圳市景鹏建设工程有限公司

职 务: 项目负责人 (项目经理)

初次领证日期: 2022年11月24日

有效 期: 2022年11月24日 至 2025年11月24日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年09月11日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: _____ 社保电脑号: _____ 身份证号码: _____ 页码: 1
 参保单位名称: 深圳市景鹏建设工程有限公司 单位编号: _____ 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08		2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09		2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01		3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02		3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03		3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12		4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01		4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计			8751.78	4762.96			1697.67	565.95			537.69		303.24	323.04	96.76		



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码() 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:

单位名称
深圳市景鹏建设工程有限公司



企业管理

人员信息管理 / 人员信息登记

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

查询条件

企业名称

统一社会信用代码

姓名

证件号码

查询

重置

展开

导出数据

添加人员

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报审核区县	操作
1	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-11-06 15:49:37	初审区县审核通过	云城区	审核记录 操作
2	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-11-06 14:10:29	初审区县审核通过	云城区	审核记录 操作
3	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-28 15:05:30	初审区县审核通过	云城区	审核记录 操作
4	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-28 15:02:06	初审区县审核通过	云城区	审核记录 操作
5	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-20 23:12:00	初审区县审核通过	云城区	审核记录 操作
6	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-18 19:58:00	初审区县审核通过	云城区	审核记录 操作
7	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-18 11:27:16	初审区县审核通过	云城区	审核记录 操作
8	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-18 11:11:53	初审区县审核通过	云城区	审核记录 操作
9	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-18 11:08:49	初审区县审核通过	云城区	审核记录 操作
10	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:04:52	初审区县审核通过	云城区	审核记录 操作



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

证件类型	居民身份证	证件号码		性别	
注册证书所在单位名称	深圳市景鹏建设工程有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册建造师

注册单位: 深圳市景鹏建设工程有限公司 注册编号/执业印章号:

注册专业: 市政公用工程 有效期: 2026年08月06日

项目技术负责人（项目总工）



陕西省专业技术职业证书

本证书表明持证人已参加相应专业类别培训考试并取得合格成绩，具有相应的专业水平及职业能力。

姓 名： _____

身份证号： _____

级 别： _____ 中级 _____

职业名称： _____ 工程师 _____

专业名称： _____ 市政工程 _____

批准文号： _____

证书编号： _____

授予时间： _____ 2023-11-20 _____

唯一在线验证网址：
www.sxhrcdr.org.cn

陕西省人力资源发展研究中心
Shaanxi development research center of human resources



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: _____ 社保电脑号: _____ 身份证号码: _____ 页码: 1
 参保单位名称: 深圳市景鹏建设工程有限公司 单位编号: _____ 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	02		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	06		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	07		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	08		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01		3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02		3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03		3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12		4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01		4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计			10734.18	5896.76			2008.83	617.77			608.49		352.92		427.16	139.24	



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明, 向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 () 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号 _____ 单位名称
 深圳市景鹏建设工程有限公司



- 人员信息管理
- 人员信息登记
- 信用评价管理

查询条件

企业名称 统一社会信用代码 姓名 证件号码

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	操作
1	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:07	初审区县审核通过	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
2	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:10	初审区县审核通过	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
3	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:13	初审区县审核通过	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
4	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:16	初审区县审核通过	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
5	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:19	初审区县审核通过	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
6	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:23	初审区县审核通过	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
7	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:27	初审区县审核通过	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
8	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:32	初审区县审核通过	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
9	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:36	初审区县审核通过	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
10	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:39	初审区县审核通过	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>

项目技术负责人企业聘书



企业聘书

兹聘请_____工程师，担任本公司项目技术负责人职务。生效日期：2024年4月1日。聘期三年。特此聘任！

签发日期：2024年4月1日

深圳市景鹏建设工程有限公司（盖章）

2024年4月1日





建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：□

姓 名：□

性 别：□

出生年月：□

企业名称：深圳市景鹏建设工程有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年11月04日

有效 期：2022年10月17日 至 2025年11月03日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年04月17日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: _____ 社保电脑号: _____ 身份证号码: _____ 页码: 1
 参保单位名称: 深圳市景鹏建设工程有限公司 单位编号: _____ 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	02		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	06		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	07		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	08		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01		3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02		3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03		3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12		4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01		4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计			10734.18	5896.76			2008.83	617.77			608.49		352.92		427.16	139.24	



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 () 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号 _____ 单位名称
 深圳市景鹏建设工程有限公司



打印日期: 2025年2月5日
 社保费缴纳清单证明专用章

企业信息管理

人员信息管理 / 人员信息登记

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

查询条件

企业名称 请输入 统一社会信用代码 请输入 姓名 请输入 证件号码 请输入

查询 重置 展开

导出数据 添加人员

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报	操作
1	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:07	初审区县审核通过	云城	审核记录 操作
2	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:10	初审区县审核通过	云城	审核记录 操作
3	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:13	初审区县审核通过	云城	审核记录 操作
4	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:16	初审区县审核通过	云城	审核记录 操作
5	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:19	初审区县审核通过	云城	审核记录 操作
6	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:23	初审区县审核通过	云城	审核记录 操作
7	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:27	初审区县审核通过	云城	审核记录 操作
8	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:32	初审区县审核通过	云城	审核记录 操作
9	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:36	初审区县审核通过	云城	审核记录 操作
10	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:39	初审区县审核通过	云城	审核记录 操作





证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名：

身份证号：

岗位名称： 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构： 广东省

发证时间： 2021年 08月 16日

扫码验证

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

查询条件

企业名称 请输入 统一社会信用代码 请输入 姓名 请输入 证件号码 请输入

查询 重置 展开

导出数据 添加人员

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报时间	审核记录	操作
1	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:07	初审区县审核通过	云城	审核记录	操作
2	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:10	初审区县审核通过	云城	审核记录	操作
3	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:13	初审区县审核通过	云城	审核记录	操作
4	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:16	初审区县审核通过	云城	审核记录	操作
5	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:19	初审区县审核通过	云城	审核记录	操作
6	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:23	初审区县审核通过	云城	审核记录	操作
7	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:27	初审区县审核通过	云城	审核记录	操作
8	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:32	初审区县审核通过	云城	审核记录	操作
9	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:36	初审区县审核通过	云城	审核记录	操作
10	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:39	初审区县审核通过	云城	审核记录	操作



质量员



证书编码:

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名:

身份证号:

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。

培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 08月 19日

扫码验证

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

查询条件

企业名称

请输入

统一社会信用代码

请输入

姓名

请输入

证件号码

请输入

重置

展开

查询

导出教程

添加人员



序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报	操作
1	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:07	初审区县审核通过	云城	审核记录
2	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:10	初审区县审核通过	云城	审核记录
3	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:13	初审区县审核通过	云城	审核记录
4	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:16	初审区县审核通过	云城	审核记录
5	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:19	初审区县审核通过	云城	审核记录
6	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:23	初审区县审核通过	云城	审核记录
7	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:27	初审区县审核通过	云城	审核记录
8	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:32	初审区县审核通过	云城	审核记录
9	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:36	初审区县审核通过	云城	审核记录
10	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:39	初审区县审核通过	云城	审核记录



证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名：

身份证号：

岗位名称： 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构： 广东省

发证时间： 2021年 08月 17日

扫码验证

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名： 社保电脑号： 身份证号码： 页码： 1
 参保单位名称： 深圳市景鹏建设工程有限公司 单位编号： 计算单位： 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	02		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	06		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	07		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	08		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10		2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11		2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12		2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01		3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02		3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03		3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12		4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01		4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计			11471.15	5896.76			9181.71	3300.52			608.49		352.92	2360	427.16	139.24	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位名称
 深圳市景鹏建设工程有限公司



查询条件

企业名称

统一社会信用代码

注册所在区县

姓名

证件号码

查询

重置

展开

导出数据

添加人员

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报操作
1	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:07	初审区县审核通过	审核记录
2	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:10	初审区县审核通过	审核记录
3	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:13	初审区县审核通过	审核记录
4	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:16	初审区县审核通过	审核记录
5	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:19	初审区县审核通过	审核记录
6	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:23	初审区县审核通过	审核记录
7	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:27	初审区县审核通过	审核记录
8	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:32	初审区县审核通过	审核记录
9	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:36	初审区县审核通过	审核记录
10	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:39	初审区县审核通过	审核记录





证书编码:

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名:

身份证号:

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。

培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 08月 18日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 社保电脑号: 身份证号: 页码: 1
 参保单位名称: 深圳市景鹏建设工程有限公司 单位编号: 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	02		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	06		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	07		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	08		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10		2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11		2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12		2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01		3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02		3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03		3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12		4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01		4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计			11471.15	5896.76			9181.71	3300.52			608.49		352.92		427.16	139.24	



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 () 核查, 验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 单位名称
 深圳市景鹏建设工程有限公司



查询条件

企业名称

统一社会信用代码

统一社会信用代码

姓名

姓名

证件号码

查询

重置

展开

导出数据

添加人员



序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报审核区县	是否通过	操作
1	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:13:22	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录
2	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-12-16 21:12:12	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录
3	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-12-06 09:56:11	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录
4	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-11-06 15:49:37	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录
5	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-11-06 14:10:29	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录
6	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-28 15:05:30	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录
7	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-28 15:02:06	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录
8	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-20 23:12:00	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录
9	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-18 19:58:00	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录
10	深圳市景源建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-18 11:27:16	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录

姓名 _____


性别 _____

执业资格证书编号 _____

发证日期 2013年05月16日

持证人签名 _____

执业证号 _____

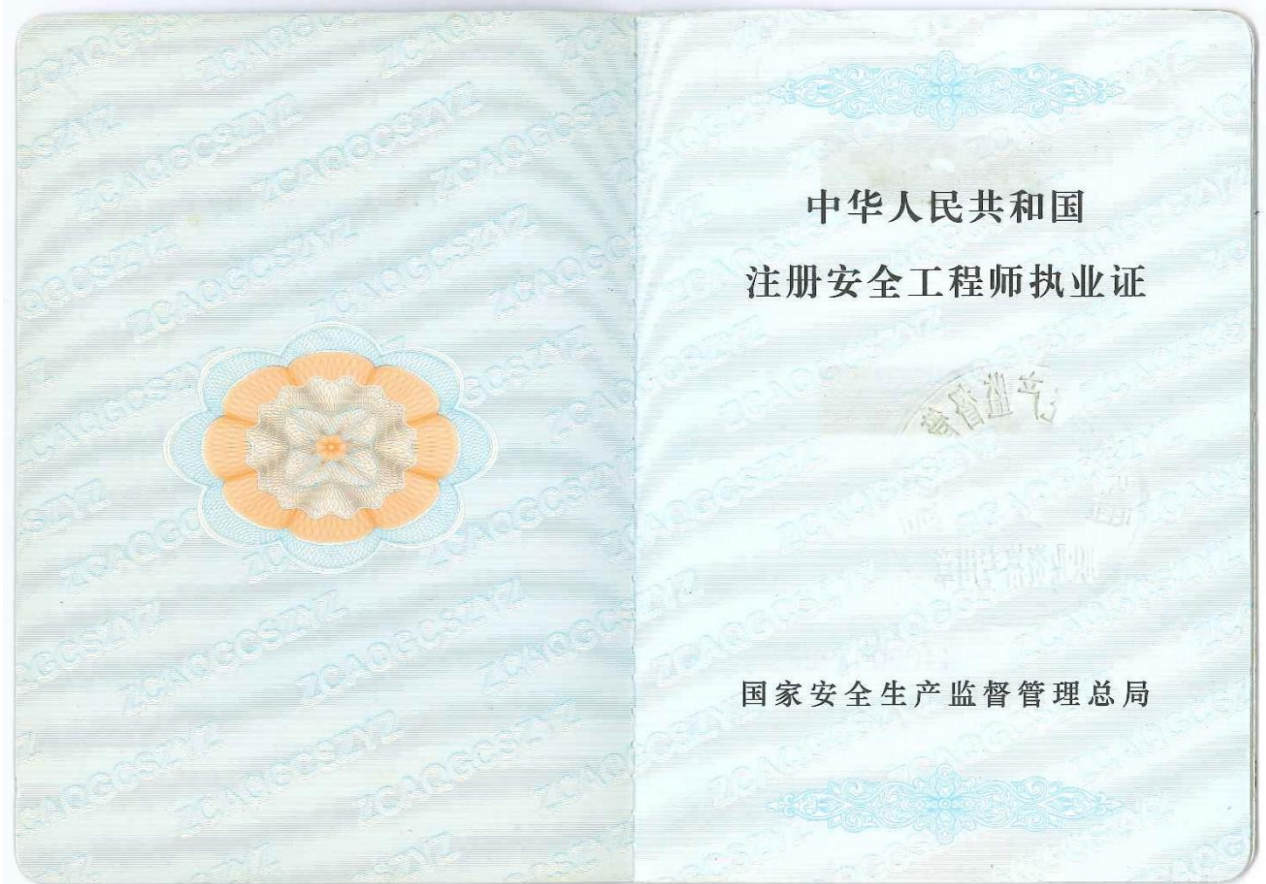

注册记录

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市鹏城建筑集团有限公司

有效期至：2016年05月15日

注册专用章

100000065338

注册记录

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市景鹏建设工程有限公司

有效期：2023年8月1日至2028年8月1日



广东省高级专业技术
资格证

广东省人事厅

1272

于二〇〇八年十一月，经深圳市建筑工程高级专业技术资格

评审委员会评审通过，具备施工高级工程师资格。特发此证

发证机关：广东省人事厅
二〇〇九年二月十七日




深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 社保电脑号: 身份证号码: 页码: 1
 参保单位名称: 深圳市景鹏建设工程有限公司 单位编号: 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	02		12816.0	1922.4	1025.28	1	12816	794.59	256.32	1	12816	64.08	12816	39.99	2360	16.52	7.08
2023	03		12816.0	1922.4	1025.28	1	12816	794.59	256.32	1	12816	64.08	12816	39.99	2360	16.52	7.08
2023	04		12816.0	1922.4	1025.28	1	12816	794.59	256.32	1	12816	64.08	12816	39.99	2360	16.52	7.08
2023	05		12816.0	1922.4	1025.28	1	12816	794.59	256.32	1	12816	64.08	12816	49.98	2360	16.52	7.08
2023	06		12816.0	1922.4	1025.28	1	12816	794.59	256.32	1	12816	64.08	12816	49.98	2360	16.52	7.08
2023	07		12816.0	1922.4	1025.28	1	12816	794.59	256.32	1	12816	64.08	12816	49.98	2360	16.52	7.08
2023	08		12816.0	1922.4	1025.28	1	12816	794.59	256.32	1	12816	64.08	12816	49.98	2360	16.52	7.08
2023	09		12816.0	1922.4	1025.28	1	12816	794.59	256.32	1	12816	64.08	12816	49.98	2360	16.52	7.08
2023	10		12816.0	1922.4	1025.28	1	12816	768.96	256.32	1	12816	64.08	12816	49.98	2360	16.52	7.08
2023	11		12816.0	1922.4	1025.28	1	12816	768.96	256.32	1	12816	64.08	12816	49.98	2360	16.52	7.08
2023	12		12816.0	1922.4	1025.28	1	12816	768.96	256.32	1	12816	64.08	12816	49.98	2360	16.52	7.08
2024	01		12816.0	1922.4	1025.28	1	12816	640.8	256.32	1	12816	64.08	12816	49.98	12816	102.53	25.63
2024	02		12816.0	1922.4	1025.28	1	12816	640.8	256.32	1	12816	64.08	12816	49.98	12816	102.53	25.63
2024	03		12816.0	1922.4	1025.28	1	12816	640.8	256.32	1	12816	64.08	12816	99.96	12816	102.53	25.63
2024	04		12816.0	2050.56	1025.28	1	12816	640.8	256.32	1	12816	64.08	12816	99.96	12816	102.53	25.63
2024	05		12816.0	2050.56	1025.28	1	12816	640.8	256.32	1	12816	64.08	12816	99.96	12816	102.53	25.63
2024	06		12816.0	2050.56	1025.28	1	12816	640.8	256.32	1	12816	64.08	12816	99.96	12816	102.53	25.63
2024	07		12816.0	2050.56	1025.28	1	12816	640.8	256.32	1	12816	64.08	12816	128.16	12816	102.53	25.63
2024	08		12816.0	2050.56	1025.28	1	12816	640.8	256.32	1	12816	64.08	12816	128.16	12816	102.53	25.63
2024	09		12816.0	2050.56	1025.28	1	12816	640.8	256.32	1	12816	64.08	12816	128.16	12816	102.53	25.63
2024	10		12816.0	2050.56	1025.28	1	12816	640.8	256.32	1	12816	64.08	12816	128.16	12816	102.53	25.63
2024	11		12816.0	2050.56	1025.28	1	12816	640.8	256.32	1	12816	64.08	12816	128.16	12816	102.53	25.63
2024	12		12816.0	2050.56	1025.28	1	12816	640.8	256.32	1	12816	64.08	12816	128.16	12816	102.53	25.63
2025	01		12816.0	2178.72	1025.28	1	12816	640.8	256.32	1	12816	64.08	12816	128.16	12816	102.53	25.63
合计			47547.36	24606.72			16994.0	6151.68			1537.92		1916.73	1514.61		411.07	



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 () 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 单位名称: 深圳市景鹏建设工程有限公司



查询条件

企业名称

统一社会信用代码

姓名

证件号码

查询

重置

展开

导出数据

添加人员

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报审核区县	是否省内	操作
1	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:23	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
2	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:27	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
3	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:32	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
4	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:36	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
5	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:39	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
6	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:42	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
7	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:45	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作



328

姓名: [Redacted]
 身份证号码: [Redacted]
 性别: [Redacted]
 专业: 土木建筑
 聘用单位: 深圳市景鹏建设工程有限公司



证书编号: [Redacted]
 初始注册日期: 2023 年 07 月 17 日

颁发机关盖章: 
 发证日期: 2023 年 07 月 17 日

全国工程造价咨询管理系统

深圳市景鹏建设工程有限公司

企业基本信息

统一社会信用代码		企业法定代表人	
企业登记注册类型	有限责任公司(其他)	企业所在地	广东省
企业地址		原造价咨询资质等级	未定级
发证日期			

企业简介

展开

一级造价工程师 (3) 二级造价工程师 (1) 企业业绩 企业不良行为 企业良好行为 修改记录

序号	姓名	身份证号	注册号(执业印章号)	专业
1				土建
2				土建
3				安装



当前您正在进行：一级造价工程师注册信息查询操作

一级造价工程师注册信息查询

序号	姓名	性别	注册机构	注册单位	分公司	注册编号	执业状态	有效期
1			广东省	深圳市景鹏建设工程有限公司			正常	2027-07-16



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词, 例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >



证件类型	居民身份证	证件号码		性别	
注册证书所在单位名称	深圳市景鹏建设工程有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位: 深圳市景鹏建设工程有限公司

证书编号: [REDACTED]

注册编号/执业印章号: [REDACTED]

注册专业: 土建

有效期: 2027年07月16日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: _____ 社保电脑号: _____ 身份证号码: _____ 页码: 1
 参保单位名称: 深圳市景鹏建设工程有限公司 单位编号: _____ 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	02		2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03		2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04		2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05		2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	06		2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	07		2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	08		2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09		2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01		3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02		3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03		3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12		4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01		4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计			10734.18	5896.76			2164.35	721.53			608.49		352.92		427.16	139.24	



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明, 向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 () 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号 _____ 单位名称
 深圳市景鹏建设工程有限公司



查询条件

企业名称

统一社会信用代码

姓名


证件号码

[查询](#) [重置](#) [展开](#)

[导出数据](#) [添加人员](#)

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报审核区县	是否首次	操作
1	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 17:07:08	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
2	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:40:31	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
3	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:38:44	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
4	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:34:58	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
5	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:31:40	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
6	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:26:52	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
7	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:24:10	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
8	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:20:17	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
9	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:17:23	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
10	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:13:22	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作



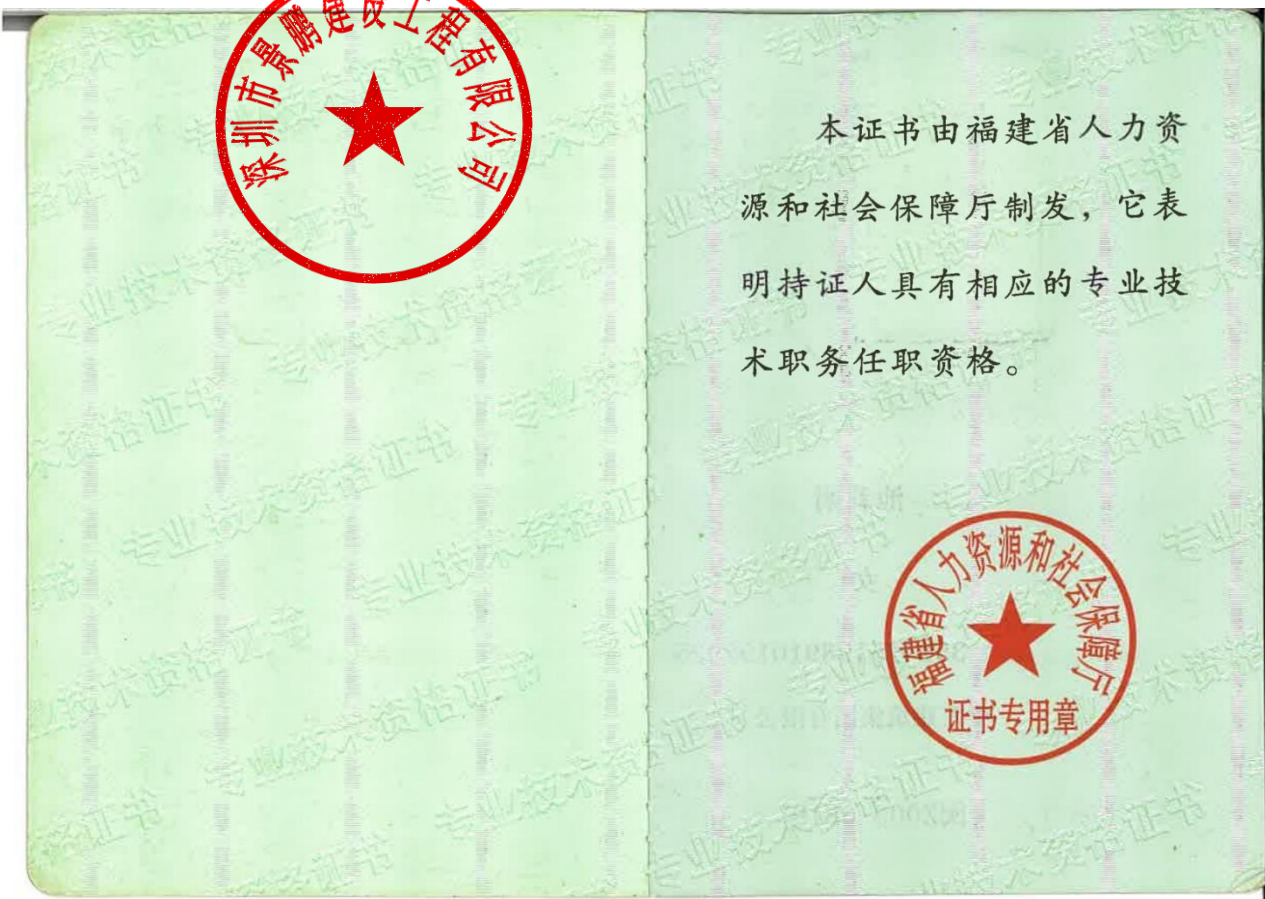

姓名: [Redacted] (加盖审批部门钢印有效)
 性别: [Redacted]
 身份证号: [Redacted]
 工作单位: 中汇建筑集团有限公司
 证书编号: [Redacted]

级别: 中级
 专业名称: 市政工程施工
 资格名称: 工程师
 评审组织: 福建建工集团有限责任公司工程技术
 中级职务评委会
 审批部门: 福建建工集团有限责
 任公司职改领导小组
 批准文号: [Redacted]
 批准日期: 2017.12.15

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: _____ 社保电脑号: _____ 身份证号码: _____ 页码: 1
 参保单位名称: 深圳市景鹏建设工程有限公司 单位编号: _____ 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	04		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	06		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	07		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	08		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01		3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02		3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03		3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12		4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01		4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计				10073.38	5518.16			1892.15	591.85			584.89					125.08



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（_____）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号 _____ 单位名称
 深圳市景鹏建设工程有限公司



查询条件

企业名称 请输入

统一社会信用代码 请输入

姓名 请输入

证件号码 请输入

查询 重置 展开

导出数据 添加人员

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报审核区县	是否审核通过	操作
1	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 17:07:08	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
2	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:40:31	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
3	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:38:44	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
4	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:34:58	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
5	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:31:40	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
6	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:26:52	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
7	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:24:10	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
8	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:20:17	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
9	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:17:23	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
10	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:13:22	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作





陕西省专业技术职业证书

本证书表明持证人已参加相应专业类别培训考试并取得合格成绩，具有相应的专业水平及职业能力。

姓 名： _____

身份证号： _____

级 别： _____ 中级 _____

职业名称： _____ 工程师 _____

专业名称： _____ 给水排水 _____

批准文号： _____

证书编号： _____

授予时间： _____ 2023-11-20 _____

唯一在线验证网址：
www.sxhrcdr.org.cn

陕西省人力资源发展研究中心
Shaanxi development research center of human resources



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名： |

社保电脑号： |

身份证号码： |

页码： 1

参保单位名称： 深圳市景鹏建设工程有限公司

单位编号： |

计算单位： 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	02		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	06		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	07		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	08		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01		3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02		3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03		3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12		4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01		4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计			10734.18	5896.76			2008.83	617.77			608.49		352.92	427.16		139.24	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位名称
 深圳市景鹏建设工程有限公司



企业信息管理

人员信息管理 / 人员信息登记

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

查询条件

企业名称 请输入

统一社会信用代码 请输入

姓名 请输入

证件号码 请输入

查询 重置 展开

导出数据 添加人员

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报审核区县	是否首次	操作
1	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-18 11:08:49	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
2	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:04:52	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
3	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:00	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
4	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:04	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
5	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:07	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
6	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:10	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
7	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:13	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
8	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:16	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
9	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:19	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
10	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:23	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作





陕西省专业技术职业资格证书

本证书表明持证人已参加相应专业类别培训考试并取得合格成绩，具有相应的专业水平及职业能力。

姓 名： _____

身份证号： _____

级 别： _____ 中级 _____

职业名称： _____ 工程师 _____

专业名称： _____ 园林绿化 _____

批准文号： _____

证书编号： _____

授予时间： _____ 2023-11-20 _____

唯一在线验证网址：
www.sxhrcdr.org.cn

陕西省人力资源发展研究中心
Shaanxi development research center of human resources



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名： 社保电脑号： 身份证号： 页码： 1
 参保单位名称： 深圳市景鹏建设工程有限公司 单位编号： 计算单位： 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	02		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	06		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	07		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	08		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09		2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12		2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01		3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02		3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03		3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11		3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12		4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01		4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计			10734.18	5896.76			2008.83	617.77			608.49		352.92		427.16	139.24	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号 _____ 单位名称
 深圳市景鹏建设工程有限公司



企业信息管理

人员信息管理 / 人员信息登记

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

查询 重置 展开

导出数据 添加人员

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	操作
1	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:07	初审区县审核通过	审核记录 操作
2	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:10	初审区县审核通过	审核记录 操作
3	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:13	初审区县审核通过	审核记录 操作
4	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:16	初审区县审核通过	审核记录 操作
5	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:19	初审区县审核通过	审核记录 操作
6	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:23	初审区县审核通过	审核记录 操作
7	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:27	初审区县审核通过	审核记录 操作
8	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:32	初审区县审核通过	审核记录 操作
9	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:36	初审区县审核通过	审核记录 操作
10	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:39	初审区县审核通过	审核记录 操作



其他人员4




本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation

持证人签名: _____

<p>姓名 _____</p> <p>性别 _____</p> <p>出生年月 _____</p> <p>任职资格 <u> 工程师 </u></p> <p>工作单位 <u> 中铁十三局集团 </u></p>	<p>系列 <u> 工 程 </u></p> <p>专业 <u> 城镇建设 </u></p> <p>评审通过时间 <u> 2003年7月 </u></p> <p>签发日期 _____</p> <p style="text-align: right;">  评审委员会 (章) </p> <p>编 号: _____</p>
---	--

查询条件

企业名称

统一社会信用代码

姓名

证件号码

查询

重置

展开

导出数据

添加人员

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报审核区县	是否省内	操作
1	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 17:07:08	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
2	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:40:31	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
3	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:38:44	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
4	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:34:58	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
5	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:31:40	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
6	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:26:52	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
7	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:24:10	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
8	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:20:17	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
9	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:17:23	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
10	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:13:22	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作



524

持证人具备担任中级专业技术职务的任职资格。

评委会名称：2012宁波市建工城建
专业水平考试确认

评定时间：2012年08月31日

公布文件号：

发证时间：2012年9月

姓名：

性别：

出生年月：

资格名称： 工程师

专业名称： 道路桥梁

证书编号： N^o



339

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: _____ 社保电脑号: _____ 身份证号码: _____ 页码: 1
 参保单位名称: 深圳市景鹏建设工程有限公司 单位编号: _____ 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	02		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	06		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	07		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	08		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09		2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10		2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11		2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12		2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01		3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02		3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03		3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11		3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12		4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01		4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计			11471.15	5896.76			9181.71	3300.52			608.49		352.92		427.16	139.24	



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 () 核查, 验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号 _____ 单位名称
 深圳市景鹏建设工程有限公司



查询条件

企业名称 请输入

统一社会信用代码 请输入

姓名 请输入

证件号码 请输入


查询 重置 展开

导出数据

添加人员

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报审核区县	是否首次	操作
1	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 22:22:15	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
2	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 17:07:08	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
3	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:40:31	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
4	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:38:44	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
5	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:34:58	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
6	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:31:40	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
7	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:26:52	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
8	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:24:10	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
9	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:20:17	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
10	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:17:23	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作



<h2>广西壮族自治区职称证书</h2>	
证书编号:	
姓 名:	
性 别:	
身份证号:	
职称系列:	工程系列
级 别:	中级
资格名称:	工程师
获取方式:	评审
专 业:	市政公用工程
取得资格时间:	2020年12月
评审机构:	1874工程系列河池市建筑中级评委会
批准机关:	河池市人力资源和社会保障局
在线验证网址:	
	
生成时间:	2021年04月02日

查询条件

企业名称 请输入

统一社会信用代码 请输入

姓名 请输入

证件号码 请输入

查询 重置 展开

导出数据 添加人员

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报所属区县	是否省	操作
1	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-12-16 21:12:12	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
2	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-12-06 09:56:11	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
3	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-11-06 15:49:37	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
4	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-11-06 14:10:29	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
5	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-28 15:05:30	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
6	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-28 15:02:06	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
7	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-20 23:12:00	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
8	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-18 19:58:00	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
9	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-18 11:27:16	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
10	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-18 11:11:53	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作



项目负责人和项目技术负责人签名确认表

本人姓名：____，性别：____，身份证证号 _____，已认真阅读 省道 S537 线(云安区段)细友石场至湾边村段改建工程-供水管道迁改工程施工 (项目名称) 招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目 项目负责人 一职，并承担相应的责任。

本人姓名：____，性别：____，身份证证号：_____，已认真阅读 省道 S537 线(云安区段)细友石场至湾边村段改建工程-供水管道迁改工程施工 (项目名称) 招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目 项目技术负责人 一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人： 深圳市景鹏建设工程有限公司 (盖公章)

项目负责人： _____ (签字)


项目技术负责人 _____ (签字)

日期： 2025 年 02 月 25 日

注：后附相关人员的二代身份证复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由对应的负责人签字确认。

附相关人员的二代身份证复印件或扫描件





六、投标人声明函

致：广东省鲲鹏城市建设投资集团有限公司（招标人）

我公司作为贵单位拟建的省道 S537 线(云安区段)细友石场至湾边村段改建工程-供水管道迁改工程施工（项目名称）招标的投标人，我公司郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目管理班子不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，如在两个及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。

二、我公司保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的，包括但不限于营业执照、资质证书、业绩证明资料、获奖证明资料、人员证书、社保、纳税证明材料等。我公司同意投标材料及其后提供的一切材料均可对社会公开，接受社会监督。

三、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、我公司近三年没有下列情形之一：

1. 捏造事实、伪造证明材料投诉；

2. 无故放弃中标的；

3. 超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；

4. 由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5. 办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、我公司不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

六、我公司保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关网站载明该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人：深圳市景鹏建设工程有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：_____ 字或盖章）

日期：2025年02月25日

七、投标人的其他评审情况

投标人根据“第三章 评标办法”自行编制格式。

企业人员评价

详见拟投入本工程项目主要施工人员简介表。

企业能力评价

序号	名称	颁奖时间	颁奖单位
1	阳西县城安和路升级改造项目荣获二〇二二年下半年“阳江市市政建设工程优质奖”	2023.05	阳江市建筑业协会
2	迎宾大道（东风四路-规划七路）改造及延伸工程项目	2023.02	阳江市建筑业协会
2	宝珺园(不含桩基)工程,荣获二〇二三年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。	2023.04	深圳建筑业协会
	宝珺园工程,荣获二〇二三年度上半年深圳市优质结构工程奖	2023.08	深圳建筑业协会

企业业绩评价


序号	项目名称	建设单位	合同时间	中标金额(万元)	证明材料
1	坪山区坪山街道“瓶改管”完善工程(标段一)	深圳市坪山区坪山街道办事处	2022.12.02	1473.925918	中标通知书、合同关键页、竣工验收报告
2	永淳路临时道路工程	深圳市龙华区龙华街道办事处	2021.08.27	1421.349101	中标通知书、合同关键页、竣工验收报告
3	龙华二线拓展区景龙南路(民益路-新区大道)工程	深圳市龙华区建筑工务署	2022.05.30	1310.897581	中标通知书、合同关键页、竣工验收报告

投标人：深圳市景鹏建设工程有限公司（盖公章）

日期：2025年02月25日

说明：后附相关证明资料。

阳西县城安和路升级改造项目荣获二〇二二年下半年“阳江市市政建设工程优质奖”

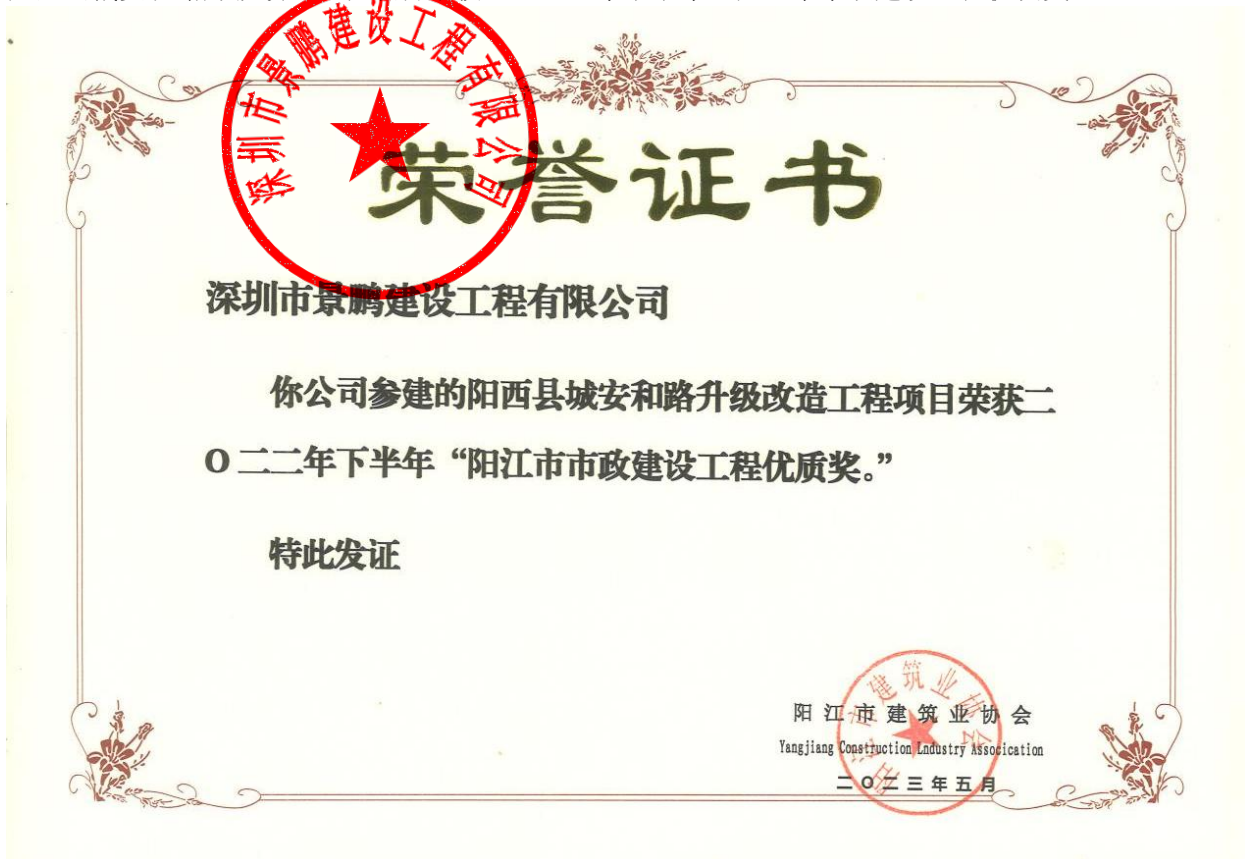

全国社会组织信用信息公示平台

xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6JlUxNDQxNzAwNzIzMDU5MTM0RjU9

民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织 已取缔非法社会组织

阳江市建筑业协会 正规 行业协会商会

统一社会信用代码: 法定代表人: 成立时间: 2001-03-20

页面打印 信息下载 提出异议

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码		社会组织名称	阳江市建筑业协会	
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记	
证书有效期	2024-07-10至2028-07-09	登记管理机构	阳江市民政局	
法定代表人		成立日期	2001-03-20	注册资金 3万元
业务范围	研究探讨行业发展;维护会员权益;开展对外交流;推广新技术;信息服务;建筑管理技术服务;对会员开展行业培训;承接职能转移;			
住所	阳江市江城区石湾北路金河湾小区汇金大厦4层404房			

点击或者下拉加载更多

迎宾大道（东风四路-规划七路）改造及延伸工程项目

7 深圳市景鹏建设工程有限公司

式建筑设计、绿色建筑、环境艺术设计、地质灾害治理工程设计、结构工程设计、风景园林工程设计、建筑装饰装修设计、建筑幕墙工程设计、钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、工程总承包；工程技术管理、（法律、行政法规规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

符合条件的资质 1

市政公用工程施工总承包一级

符合条件的荣誉 1

序号	荣誉项目	荣誉名称	获奖时间	来源
1	迎宾大道(东风四路-规划七路)改造及延伸项目工程被评为2022年下半年第三批阳江市市政工程安全生产文明施工示范工地	工程荣誉(市级)	2023-02-27	阳江市建筑业协会

2022年下半年第三批阳江市市政工程安全生产文明施工示范工地

序号	工程名称	申报单位	项目经理	参建单位	监理单位	项目总监	工程规模
1	珠海（阳江）合作共建园区海港大道等11条道路及次墩河排渠工程（二期工程）	联旺建设工程有限公司		广州市第二市政工程有限公司	珠海品成建设有限公司		1746.37万元
2	阳西县石桥铺片区排水排污建设工程	广东众强建设工程有限公司		/	广东安业建设工程顾问有限公司		4494万元
3	阳西县程村镇镇区人居环境整治建设工程项目	阳江市金城建筑工程有限公司		/	广东山海监理有限公司		1435.386万元
4	市区共青湖公园建设工程	广东中晔建设集团有限公司		/	广东建海工程项目管理有限公司		3010.82万元
5	江城区银岭科技产业园竹围路和新屋路项目	广东中盈建设有限公司		中景园生态建设有限公司	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		1336.58万元
6	迎宾大道（东风四路-规划七路）改造及延伸工程项目	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东华泓建设工程有限公司	深圳大兴工程管理有限公司		6004万元

全国社会组织信用信息公示平台

中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

阳江市建筑业协会 正常 行业协会类

统一社会信用代码: 法定代表人: 成立时间: 2001-03-20

基础信息 | 行政许可信息 | 年检(年报)信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码		社会组织名称	阳江市建筑业协会		
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记		
证书有效期	2024-07-10至2028-07-09	登记管理机关	阳江市民政局		
法定代表人		成立登记日期	2001-03-20	注册资金	3万元
业务范围	研究探讨行业发展;维护会员权益;开展对外交流;推广新技术;信息服务;建筑管理技术服务;对会员开展行业培训;承接职能转移;				
住所	阳江市江城区石湾北路金河湾小区汇金大厦4层404房				

点击或者下拉加载更多

宝珺园(不含桩基)工程,荣获二〇二三年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

2023/4/25

证书打印—深圳建筑业协会



http://www.szjzy.org.cn/administrator/pingyou/honorinfo.aspx?infoid=1064&typeid=38#

1/2



您现在的位置 网站首页 >> 工程评优 >> 深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地

深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地

年度

深圳市景鹏建设工程有限公司

搜索

序号	工程名称	施工单位	项目经理	监理单位	总监理工程师	建筑面积	年度
1	宝珺园(不含桩基)	深圳市景鹏建设工程有限公司				34589.94m ²	2023年度上半年

1 1 Go 每页20条记录,共1条记录

深圳建筑业协会

正常 行业协会商会

统一社会信用代码:

法定代表人:

成立时间: 1988-12-26

页面打印

信息下载

提出异议

- 基础信息
- 行政许可信息
- 年检(年报)信息
- 评估信息
- 表彰信息
- 行政处罚信息
- 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码		社会组织名称	深圳建筑业协会		
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记		
证书有效期	2021-11-16至2025-11-16	登记管理机关	深圳市民政局		
法定代表人		成立登记日期	1988-12-26	注册资金	100万元
业务范围	咨询服务、培训交流、质量评选推荐、行业协调。				
住所	深圳市南山区沙河街道高发社区深云西二路天健科技大厦(天健创智中心)A栋塔楼3层314、316单元				

点击或者下拉加载更多

宝珺园工程，荣获二〇二三年度上半年深圳市优质结构工程奖

2023/8/21 10:15

证书打印—深圳建筑业协会



www.szjzy.org.cn/administrator/pingyou/honorInfo.aspx?infoid=1492&typeld=33

1/2



中国社会组织政务服务平台 (全国社会组织信用信息公示平台)

深圳建筑业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 法定代表人: 成立时间: 1988-12-26

基础信息 | 行政许可信息 | 年检(年报)信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码		社会组织名称	深圳建筑业协会		
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记		
证书有效期	2021-11-16至2025-11-16	登记管理机关	深圳市民政局		
法定代表人		成立日期	1988-12-26	注册资金	100万元
业务范围	咨询服务、培训交流、质量评选推荐、行业协调。				
住所	深圳市南山区沙河街道高发社区深云西二路天健科技大厦(天健创智中心)A栋塔楼3层314、316单元				

点击或者下拉加载更多

1 坪山区坪山街道“瓶改管”完善工程（标段一）



中标通知书

标段编号:

标段名称: 坪山区坪山街道“瓶改管”完善工程（标段一）

建设单位: 深圳市坪山区坪山街道办事处

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市景鹏建设工程有限公司

中标价: 1473.925918万元

中标工期: 150天

项目经理(总监):

本工程于 2022-10-14 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2022-11-07 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2022-11-08



查验码:

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy



工程编号:

合同编号:

深圳市建设工程 施工(单价)合同

工程名称: 坪山区坪山街道“瓶改管”完善工程(标段一)

工程地点: 深圳市坪山街道三洋湖、中兴西、中兴西小区、
黄果坳村、立北村、中兴东

发 包 人: 深圳市坪山区坪山街道办事处

承 包 人: 深圳市景鹏建设工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市坪山区坪山街道办事处

承包人(全称): 深圳市景鹏建设工程有限公司

承包人统一社会信用代码: _____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 坪山区坪山街道“瓶改管”完善工程(标段一)

工程地点: 深圳市坪山区三洋湖、中兴西、中兴西小区、黄果坳村、立北村、中兴东

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 具体内容见施工图。

资金来源: 区投资。

二、工程承包范围

具体内容见施工图。

三、合同工期

计划开工日期: 2022 年 12 月 9 日; (以开工令为准)

计划竣工日期: 2023 年 5 月 8 日;

合同工期总日历天数 150 天。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格。

五、签约合同价(含税)

人民币¥ 1473.925918 万元

其中,

(1) 安全文明施工费: 人民币¥ / 元;



- (2) 材料和工程设备暂估价金额：人民币 _____ 元；
- (3) 专业工程暂估价金额：人民币 _____ 元；
- (4) 暂列金额：人民币¥ _____ 元；
- (5) 弃土费：人民币¥ _____ 元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第四部分的补充条款；
- (3) 本合同第一部分的协议书；
- (4) 本合同第三部分的专用条款；
- (5) 本合同第二部分的通用条款；
- (6) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (7) 图纸和技术规格书；
- (8) 经确认的预算书或工程报价单；
- (9) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项, 并履行本合同所约定的全部义务。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任, 并履行本合同所约定的全部义务。
- 3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2022年12月2日；

附件：



工程质量保修书

发包人(全称)：深圳市坪山区坪山街道办事处

承包人(全称)：深圳市景鹏建设工程有限公司

为保证 坪山区坪山街道“瓶改管”完善工程(标段一) (工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《深圳特区建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。

具体质量保修范围，双方约定如下：本施工合同的合同价款所包含的工程项目、设计变更修改、现场签证或者文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部工程内容(包括但不限于招标文件、设计图纸、施工图纸及工程量清单所涉的全部工程内容)

二、工程质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为 / 年(最低为5年)；

电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 / 年(最低为2年)；

供热和供冷系统工程为 / 个(最低为2个)采暖期、供冷期；

装饰装修工程为 / 年；

其他项目保修期约定： 本工程项目保修期为2年



三、工程质量保修责任

1. 属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。
2. 发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

四、工程质量保修费用

工程质量保修费用及相关的损害赔偿费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、工程质量保证方式

工程质量保证方式可采用以下方式：

■ 质量保证金：

质量保证金一般不超过签约合同价的 3%，发包人承包人约定本工程的质量保证金为签约合同价的 3 %，具体为：

币种：人民币

金额(大写)：¥ 肆拾肆万贰仟壹佰柒拾柒元柒角捌分

(小写)：¥ 442177.78 元

质量保证金银行利率为：不计利息。

□ 工程质量保证担保：

本项目不收质量保修金，但施工方有义务保修

□ 工程质量保险：

六、质量保证金的支付

采用质量保证金方式时，发包人在工程竣工验收合格满二年后第 14 天内，将剩余质量保证金支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

七、其他



发包人承包人约定的其他工程质量保修事项：承包人不按约定履行保修义务的，每发生一次，应按工程质量缺陷保修金的10%向发包人支付违约金，并承担因此给发包人造成的全部损失。发包人可以从工程质量缺陷保修金中直接扣除前述违约金。发包人从工程质量缺陷保修金中扣除违约金的，承包人应在10日内向发包人补足工程质量缺陷保修金的不足部分。承包人逾期未补足工程质量缺陷保修金，经发包人催告后仍不补足，发包人有权终止本工程质量缺陷保修协议，并没收所有工程质量缺陷保修金。由于有关政府部门规定的办事程序而影响支付的，承包人应予谅解，并放弃追究发包人的任何违约责任。

本《工程质量保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。


发 包 人(公章)：



承 包 人(公章)：

法定代表人(签字)：

法定代表人(签字)：



委托代理人(签字)：

委托代理人(签字)：




2022 年 12 月 2 日

2022 年 12 月 2 日



工程报验申请表

GD220211

单位(子单位)工程名称	坪山区坪山街道“瓶改管”完善工程(标段一)一立北村(查漏补缺)
致	深圳市龙建设监理有限公司 (项目监理机构):
<p>我单位已完成了坪山区坪山街道“瓶改管”完善工程(标段一)开工报告工作,</p> <p>现报上该工程报验申请表, 请予以审查和验收。</p> <p>附件:</p> <p>1、 开工报告</p>	
项目负责人:	 日期: 2022年12月8日
审查意见:	<p>同意</p> <p>   总/专业监理工程师: _____ 日期: 2022年12月9日 </p>



深圳市建设工程 竣工验收报告

(燃气工程专用)

深圳市建设局监制



填 报 说 明

1、本表仅适用于燃气工程；对于包含配套燃气工程的房屋建筑项目，除填写本表外，还需填写《深圳市房屋建筑工程竣工验收报告》。

2、竣工验收报告由建设单位负责填写。

3、报告一律用碳素墨水笔书写，字迹要清晰工整。

4、报告内容必须真实可靠，如发现弄虚作假行为，建设行政主管部门将依照有关法律、法规、规章进行处罚。

5、报告必须经建设、设计、施工、监理等有关单位的负责人签字及相关责任人员签章后，加盖单位公章。

6、报告一式五份，建设单位、施工单位、监理单位、城建档案管理部门、建设行政主管部门各存一份。



竣工项目燃气工程审查

工程名称	坪山区坪山街道“瓶改管”完善工程 (标段一)	工程地址	坪山街道三洋湖、中兴西、中兴西小区、黄果坳村、立北村、中兴东
建设单位	深圳市坪山区坪山街道办事处	工程内容	埋地管 D315/128 米, D250/171 米, D200/67 米, D160/154 米, D110/1158 米, D90/298 米, D63/726 米, 钢闸阀 DN315/1 个, PE 球阀 DN110/2 个, PE 球阀 DN63/1 个, 地上 405 栋共 2696 户
设计单位	中筑(深圳)设计院有限公司	工程造价	1473.925918 万元
监理单位	深圳市龙建建设监理有限公司	开工日期	2022 年 12 月 9 日
施工单位	深圳市景鹏建设工程有限公司	施工许可证	/
审查项目及内容		审查情况	
<p>一、完成设计项目情况</p> <p>1、场站燃气工程</p> <p>2、市政燃气管道工程</p> <p>3、地上燃气管道工程 ✓</p> <p>4、庭院燃气管道工程 ✓</p> <p>5、其它</p>		<p>已完成设计全部内容</p>	



二、完成合同约定情况	已完成
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	具备
四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	具备
五、质量合格文件 1、设计单位 2、施工单位 3、监理单位	具备
六、工程质量保修书	具备
审查结论 合格 建设单位负责人：， 2023年5月8日	



竣工验收组织实施情况

一、验收机构

姓名	工作单位	职务（职称）	签名
	深圳市坪山区坪山街道办事处	甲方	
	深圳市龙建建设监理有限公司	监理	
	中筑（深圳）设计院有限公司	设计	
	深圳市景鹏建设工程有限公司	项目经理	

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议
- 2、施工单位介绍施工情况
- 3、监理单位介绍监理情况
- 4、验收人员核查质保资料、并到现场检查
- 5、验收人员分别发言，建设单位做好记录








工程质量评定

各类工程名称	评定结果	质量控制资料核查结果	安全和主要使用功能核查及抽查结果	观感质量验收结果
1、场站燃气工程	/	共 <u>12</u> 项, 经审查符合要求 <u>12</u> 项, 经核定符合规范要求 <u>12</u> 项	共核查 <u>4</u> 项, 符合要求 <u>4</u> 项, 共抽查 <u>4</u> 项, 符合要求 <u>4</u> 项, 经返工处理符合要求 <u>0</u> 项	共抽查 <u>8</u> 项, 符合要求 <u>8</u> 项, 不符合要求 <u>0</u> 项
2、市政燃气管道工程	/			
3、地上燃气管道工程	合格			
4、庭院燃气管道工程	合格			
5、其它	/			
工程评定等级	合格			
执行标准	《城镇燃气设计规范》GB50028-2006			
	《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2015）			
	《深圳市中低压燃气管道工程建设技术规程》（SJG20-2017）			
工程中存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">已按要求整改</div>				



竣工验收结论:

坪山区坪山街道“瓶改管”完善工程（标段一），已按合同要求完成施工，各项技术资料齐全，达到合格标准。

 建设单位（公章） 单位负责人： 项目负责人： 2023年5月8日	 设计单位（公章） 单位负责人： 项目负责人： 2023年5月8日	 监理单位（公章） 单位负责人：  项目总监 注册号 有效期 2024.10.27 深圳市龙建建设监理有限公司 2023年5月8日	 施工单位（公章） 单位负责人： 项目经理： 2023年5月8日
--	--	--	--



深圳市建设工程承包商履约评价报告书

评价形式	<input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价		
建设单位 (评价单位)	深圳市坪山区坪山街道办事处	评价期限	2024年2月18日至2025年2月18日
承包商 (评价对象)	深圳市景鹏建设工程有限公司	承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构
承包商 资质等级	建筑工程施工总承包一级 市政公用工程施工总承包一级	承包商地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华旺路221号科泰大厦103
法定代表人	电话: { }	项目负责人	电话: { }
工程名称	坪山区坪山街道“瓶改管”完善工程(标段一)	承包范围	本项目招标范围包括但不限于对坪山区坪山街道三洋湖、中兴西、中兴西小区、黄果坳村、立北村、中兴东等地区实施管道燃气改造。主要建设内容包括:新建燃气管道、调压箱、燃气流量表、阀门、管沟、拆除和恢复路面等。
工程地点	深圳市坪山区	工程合同价	1473.93(万元)
开工日期	2022年12月9日	竣工日期	2023年5月8日
履约评价分项内容及得分情况			
序号	分项内容	得分	总得分
1	机构人员配备	13	
2	技术经济实力	12	
3	施工过程管理		
4	进度控制		
5	配合与服务	14	
6	资金支付	6	
监理单位意见(适用于施工履约评价):		注册号: 注册有效期: 2024.10.27	
		监理单位(公章): 年月日	
建设单位对承包商履约的总体评价:		建设单位(公章): 2024年2月18日	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (90≤总分≤100分) <input type="checkbox"/> 良好 (80分≤总分≤89分) <input type="checkbox"/> 合格 (60≤总分≤79分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分≤59分)		
承包商(评价对象) 签认或拒签说明		年月日	
备注	1. 建设单位应如实填写本《报告书》, 对其评价结果负责。 2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象, 并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的, 应在本《报告书》上注明情况。 3. 建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。		



2 永淳路临时道路工程



中标通知书

标段编号:

标段名称: 永淳路临时道路工程

建设单位: 深圳市龙华区龙华街道办事处

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市景鹏建设工程有限公司

中标价: 1421.349101万元

中标工期: 120天

项目经理(总监):

本工程于 2021-07-16 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2021-08-04 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章):



招标人(盖章):
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章):
日期: 2021-08-05



查验码:

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy



合同编号: _____

施工（单价）合同

工程名称:永淳路临时道路工程

工程地点:深圳市龙华区龙华街道 _____

发包人:深圳市龙华区龙华街道办事处 _____

承包人:深圳市景鹏建设工程有限公司 _____



协议书

发包人(全称): 深圳市龙华区龙华街道办事处

承包人(全称): 深圳市景鹏建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 永淳路临时道路工程

工程地点: 深圳市龙华区龙华街道

工程规模及特征: 项目位于龙华街道清湖社区,西起龙华和平路,东接龙华大道,大致呈西北-东南走向,全长约 395 米。项目投资总概算为 2100.06 万元。


资金来源: 政府投资 100%

二、工程承包范围

本工程内容主要包括: 道路、交通、水土保持、电气、给排水、燃气、电力迁改、通信迁改工程等。具体详见施工图纸及工程量清单。发包人有权利根据需要进行调整,承包人须服从,不得有异议。

1.房建工程: (在□内打√,并填写相应的工程量)

土石方工程	<input type="checkbox"/>	金属门窗工程	<input type="checkbox"/>
基坑支护工程	<input type="checkbox"/>	智能建筑工程	<input type="checkbox"/>
地基与基础工程	□桩基类别: 桩径: 数量:	通风空调工程	□空调面积: 平方米 □设计冷负荷: 冷吨
主体结构工程	□混凝土□砌体□钢结构 □网架□索膜结构	室外环境工程	<input type="checkbox"/>
装饰, 装修工程	□二次装修 □幕墙: 平方米	电梯工程	□电梯部 □自动扶梯部
屋面及防水工程	<input type="checkbox"/>	消防工程	<input type="checkbox"/>



建筑给排水工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 户数 <input type="checkbox"/> 庭院管：米
建筑电气工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	<input type="checkbox"/>

2. 市政工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

七通一平工程	<input type="checkbox"/> 万平方米	给水管道工程	<input checked="" type="checkbox"/> 514.8 米
挡墙护坡工程	<input type="checkbox"/> 长：80 米 宽：米	给排水构筑物工程	<input type="checkbox"/>
软基处理工程	<input type="checkbox"/> 万平方米	泵站工程	<input type="checkbox"/> 平方米
道路工程	<input checked="" type="checkbox"/> 长：395 米宽：	电信管道工程	<input type="checkbox"/> 米
桥梁工程	<input type="checkbox"/> 座	电力管道工程	<input type="checkbox"/> 米
隧道工程	<input type="checkbox"/> 长：宽：高：	路灯照明工程	<input type="checkbox"/> 座
排水管道工程	<input checked="" type="checkbox"/> 雨水管：米 <input checked="" type="checkbox"/> 污水管：米	道路改造工程	<input type="checkbox"/> 长：宽：高：
排水箱涵工程	<input type="checkbox"/> 长：宽：高：	绿化工程	<input type="checkbox"/>
交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input checked="" type="checkbox"/> 427 米
交通安全设施工程	<input type="checkbox"/>	其它工程-园建工程	<input type="checkbox"/>

3. 其它工程：

三、合同工期

开工日期： 年 月 日（具体以开工令为准）

竣工日期： 年 月 日

合同工期总日历天数天

标准工期 120 天。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准。国家、行业及工程所在地标准、规范存在不一致时，以较严格者为准。

五、合同价款

本合同签约合同价为：人民币（大写）壹仟肆佰贰拾壹万叁仟肆佰玖拾壹元零壹分（¥14213491.01元）（下浮率 19.88%）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）陆拾万零捌仟壹佰捌拾肆元零陆分（¥608184.06元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹拾捌万元（¥180000.0元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）/（¥/元）。

币种：人民币

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序：

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 施工合同重点条款确认书；
4. 专用条款和补充条款；
5. 通用条款；
6. 招标文件和投标文件；
7. 标准、规范及有关技术文件；



8. 图纸;
9. 工程量清单;
10. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;
11. 发包人和(或)工程师的有关通知及工程会议纪要;
12. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在保修期内承担相应的工程保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同生效

本合同订立时间: 2021年8月27日

订立地点: 深圳市龙华区龙华街道办事处

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。



发标人(公章):
深圳市龙华区龙华街道办事处

地 址: 龙华街道



承包人(公章): 深圳市景鹏建设工程有限公司

地 址: 深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口工业园 15 号 6 层 B 室

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

账号:

邮 政 编 码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

账号:

邮 政 编 码: 518000



市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称: 永淳路临时道路工程

验收日期: 2022年8月12日

建设单位(盖章): 深圳市龙华区龙华街道办事处

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制



一、工程概况

工程名称	永淳路临时道路工程	工程地点	深圳市龙华区龙华街道
工程规模	道路全长约392m, 双向3车道, 道路红线宽16.5m, 两侧布置人行道	工程造价(万元)	1421.3491万元
结构类型	道路、交通、电气、给排水、燃气、电力迁改工程及水土保持工程等	工程用途	市政道路
施工许可证号	/	开工日期	2021年9月20日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市龙华区龙华街道办事处		
勘察单位	深圳市协鹏工程勘察有限公司	资质证书号	
设计单位	华维设计集团股份有限公司		
施工单位	深圳市景鹏建设工程有限公司		
	/		/
	/		/
监理单位	深圳市建力建设监理有限公司		
施工图审查单位			





二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业

1、验收组

组 长	
副 组 长	
组 员	

2、专业组


专业组	组 长	组 员
道路工程		
给排水工程		
交通工程		
电气工程		

(二)验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

三、工程质量评定



专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	符合要求	符合要求	符合要求	合格
排水工程	符合要求	符合要求	符合要求	合格
给水工程	符合要求	符合要求	符合要求	合格
电力管沟工程	符合要求	符合要求	符合要求	合格
通信工程	符合要求	符合要求	符合要求	合格
照明工程	符合要求	符合要求	符合要求	合格
交通设施工程	符合要求	符合要求	符合要求	合格

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

四、验收(专业)组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
	深圳市龙华区龙华街道办事处			/
	深圳市龙华区龙华街道办事处			
	深圳市龙华区龙华街道办事处			/
	深圳市龙华区龙华街道办事处			/
	深圳市龙华区龙华街道办事处			/
	深圳市龙华区龙华街道办事处			/
	深圳市龙华街道城市建设办公室			
	深圳市龙华区清泉外国语学校			
	深圳市建力建设监理有限公司		监理总监	/
	深圳市建力建设监理有限公司		监理工程师	
	华维设计集团股份有限公司		设计负责人	/
	深圳市协鹏工程勘察有限公司		勘察负责人	/
	珠海电力工程监理有限责任公司		监理总监	
	深圳市景鹏建设工程有限公司		项目经理	
	深圳市景鹏建设工程有限公司		技术负责人	

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制




五、工程竣工验收结论

竣工验收结论

本工程按合同及设计要求、设计变更施工内容全部完成，符合施工规范和技术标准要求；各使用功能达标，工程技术资料基本齐全，经建设各方联合验收，一致评为合格。


验收日期： 2022 年 8 月 12 日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人:	项目总监:	项目负责人:		项目负责人:

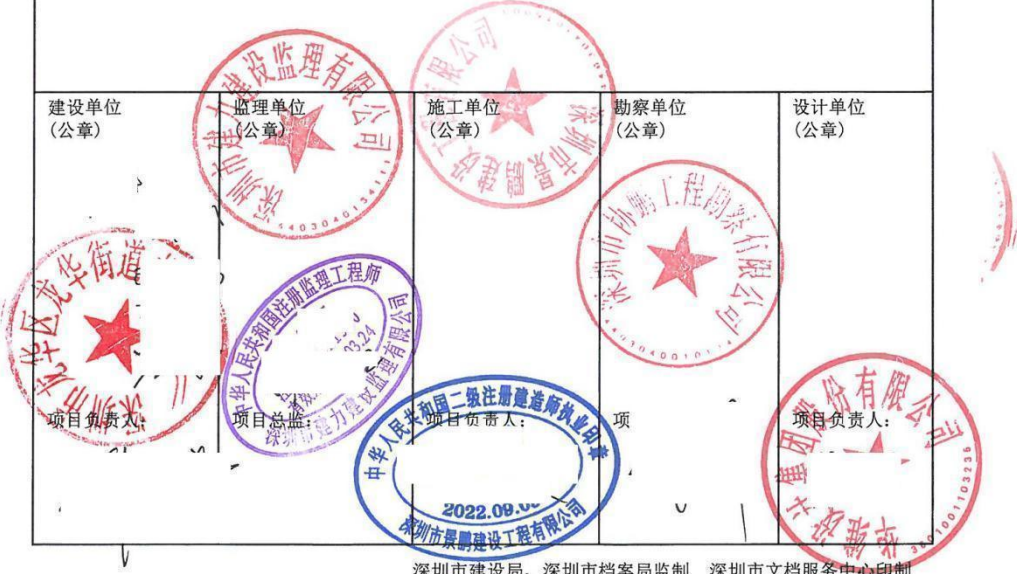

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

3 龙华二线拓展区景龙南路(民益路-新区大道)工程


中标通知书

标段编号: _____

标段名称: 龙华二线拓展区景龙南路(民益路-新区大道)工程

建设单位: 深圳市龙华区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市景鹏建设工程有限公司


中标价: 1310.897581万元

中标工期: 118天


项目经理(总监): _____

本工程于 2022-02-21 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2022-05-05 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章): 

法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章): _____

招标人(盖章): 

法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章): _____

日期: 2022-05-06

查验码: _____ 查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy



副本

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：龙华二线拓展区景龙南路（民益路-新区大道）工程

工程地点：深圳市龙华区

发 包 人：深圳市龙华区建筑工务署

承 包 人：深圳市景鹏建设工程有限公司

2020 年版



第一部分 协议书

发包人（全称）：深圳市龙华区建筑工务署

承包人（全称）：深圳市景鹏建设工程有限公司

本工程于2022年2月21日公开招标,2022年2月21日发布招标公告,2022年4月27日发布中标公示,公示期满后确定由承包人承建。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规、规章,并结合深圳市有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程建设施工事项协商一致,订立本协议。

一、工程概况

工程名称：龙华二线拓展区景龙南路(民益路-新区大道)工程

工程地点：深圳市龙华区

工程内容：本招标项目为龙华二线拓展区龙塘二路(向荣路-景龙南路)、景龙南路(民益路-民塘路)、民悦南路(景龙南路-大洋西街)工程的一部分。路段总长288m,路宽30m(含人行道、非机动车道、绿化带、机动车道)。主要建设内容：交通疏解、道路工程、给排水工程、电气工程、交通设施工程、绿化工程、海绵城市工程、水土保持以及通信改迁工程等。(以发包人确认的设计文件为准)

结构形式：

层/幢：

建筑面积： 平方米；

工程立项批准文号：

资金来源：政府投资 100%

二、工程承包范围

(1) 施工图所含全部内容。(2) 《工程量清单》包含的全部内容。(3)



承包人不能拒绝执行为完成本工程而需执行的可能遗漏的工程项目。发包人保留调整发包范围的权利/增减工程量的权利。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 七通一平工程 万平方米	<input checked="" type="checkbox"/> 电信管道工程 米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米； 高： 米	<input checked="" type="checkbox"/> 电力管道工程 米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程 万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程 立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 立方米/d
<input checked="" type="checkbox"/> 给水管道工程 米	<input type="checkbox"/> 泵站工程 平方米
<input checked="" type="checkbox"/> 道路工程 长： 米 宽： 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程 座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程 长： 米 宽： 米
<input checked="" type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米	<input checked="" type="checkbox"/> 路灯照明工程 座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input checked="" type="checkbox"/> 绿化工程 米
<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全设施工程 米	<input type="checkbox"/> 燃气工程 米
<input checked="" type="checkbox"/> 其它：电气工程、水土保持以及通信改迁工程等	

2.房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 （ <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土方 <input type="checkbox"/> 其它 ）；
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 （ <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 <input type="checkbox"/> 钢管混凝土 <input type="checkbox"/> 型钢混凝土 <input type="checkbox"/> 其它 ）；
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 （ <input type="checkbox"/> 金属门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙：_____平方米 <input type="checkbox"/> 其它 ）；
<input type="checkbox"/> 通风与空调 （ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 ）；
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 （ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网 <input type="checkbox"/> 其它 ）；
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 （ <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它 ）；



<input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它);		
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (<input type="checkbox"/> 室外设施 <input type="checkbox"/> 附属建筑 <input type="checkbox"/> 室外环境_____) 。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____; 庭院管: 米)		

3.二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4.其他工程

防治白蚁工程 (房建项目勾选); _____

三、合同工期

计划开工日期: 暂定 2022 年 6 月 15 日 (实际开工日期以监理人签发的开工令为准);

计划竣工日期: 暂定 2022 年 10 月 11 日;

合同工期总日历天数 118 天。

招标工期总日历天数 118 天。

定额工期总日历天数 118 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 1 % (压缩比例=1 - 合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格 _____

五、**签约合同价**

本合同签约合同价为：人民币（大写）**壹仟叁佰壹拾万零捌仟玖佰柒拾伍元捌角壹分（¥13108975.81元）**；

其中：

（1）安全文明施工措施费：

人民币（大写）**壹佰叁拾贰万贰仟肆佰捌拾叁元零壹分（¥1322483.01元）**；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）**贰拾万零贰仟壹佰陆拾元整（¥202160.00元）**；

（4）暂列金额：

人民币（大写）**陆拾捌万柒仟伍佰捌拾玖元肆角叁分（¥687589.43元）**；

（5）其他_____：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

最终结算价格以发包人委托第三方机构审定并经发包人确认的结果为准，项目按规定须提交龙华区财政投资评审中心评审的，则最终结算价以龙华区财政投资评审中心评审结论为准（若项目按规定须提交政府审计部门审计的，则最终结算价以政府审计部门审计结果为准）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- （1）本合同签订后双方新签订的补充协议；
- （2）本合同第一部分的协议书；
- （3）中标通知书及其附件；
- （4）本合同第四部分的补充条款；
- （5）本合同第三部分的专用条款；
- （6）本合同第二部分的通用条款；
- （7）本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8) 投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

(9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10) 图纸和技术规格书；

(11) 已标价工程量清单；

(12) 双方认为应作为合同构成的其它文件，包括发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其它文件。

七、词语含义

本协议书有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3、发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

2022年 5月 3 日

1.本合同订立时间：2022年 5 月 日；

2.订立地点：深圳市龙华区；

3. 与本合同有关的通知可用邮寄方式送达，邮寄地址以本合同中约定的地址为准，寄出三日后即视为送达，任何一方变更地址的，应书面方式通知对方。

4.本合同正本一式 2 份，均具有同等法律效力，发包人执 1 份，承包人执 1 份；副本一式 12 份，发包人执 6 份，承包人执 4 份，建设行政主管部门保存

1. 代理人保存一份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章后生效。

发包人：(公章) 深圳市龙华区建筑工务署 承包人：(公章) 深圳市景鹏建设工程有限公司

务署

有限公司

法定代表人或其委托代理

法定代表人或其委托代理人：

(签名)

(签名)

组织机构代码：

组织机构代码：

地址：深圳市龙华区梅龙大道国鸿工业
区3栋4-5楼

地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区
浪口工业园15号6层B室

邮政编码：

邮政编码：518000

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

法定代表人手机：

(务必填写用以发送履约评价结果)



基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 龙华二线拓展区景龙南路(民益路-新区大道)工程

建设单位(公章): 深圳市龙华区建筑工务署

竣工验收日期: 2023年11月28日

发出日期: 年 月 日



市政基础设施工程

工程名称	龙华二线拓展区景龙南路（民益路-新区大道）工程	工程地点	民治街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	9171.45平方米	工程造价（万元）	1310.897581
结构类型	新建道路	开工日期	2022年9月23日
施工许可证号		竣工日期	年 月 日
监督单位	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市龙华区建筑工务署	总施工单位	深圳市景鹏建设工程有限公司
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司	施工单位（土建）	深圳市景鹏建设工程有限公司
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	深圳市景鹏建设工程有限公司
设计单位	深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司		
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市中贺工程检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2023年7月24日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			



工程完成情况		 <p>市政基础设施工程</p> <p>已按设计施工图及合同约定项目完成，经有关部门检查符合设计及施工质量验收规范要求，通过验收。本工程评为合格。</p>	
工程质量情况	土建	已按设计施工图及合同约定项目完成，经有关部门检查符合设计及施工质量验收规范要求，通过验收。本工程评为合格。	
	设备安装	已按设计施工图及合同约定项目完成，经有关部门检查符合设计及施工质量验收规范要求，通过验收。本工程评为合格。	
工程未达到使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人: 2023年11月28日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格印章)  有效期至 2023.09.30 2023年11月28日 深圳市中行建设工程监理有限公司	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)  建筑 2023年11月28日 2024.04.26 深圳市勤察建设工程有限公司
	分包单位	设计单位	
	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2023年11月28日	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2023年11月28日

附件

八、需要提供的其他投标资料

需要提供的其他投标资料：

- (1) 有效的营业执照；
- (2) 有效期内的资质证书；
- (3) 有效期内的安全生产许可证；
- (4) 人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；
- (5) “云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其有效范围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供）；
- (6) 广东省以外的投标人，须按《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市〔2015〕52 号文）的规定，提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页截图；
- (7) 投标保证金的相关凭证；
- (8) 投标人开户许可证或银行出具基本账户证明；
- (9) 投标人在“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）的网页截图；
- (10) 投标人认为还须提供其他资料。

(1) 有效的营业执照;



营业执照

统一社会信用代码

名称 深圳市景鹏建设工程有限公司
类型 有限责任公司 (法人独资)
法定代表人

成立日期 2017年04月19日
住所 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华旺路
221号科泰大厦103

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



登记机关

2022年06月06日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

(2) 有效期内的资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 深圳市景鹏建设工程有限公司

详细地址: 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华旺路221号科泰大厦103

统一社会信用代码
(或营业执照注册号):

法定代表人: 郭坚鹏

注册资本: 36000万元人民币

经济性质: 有限责任公司(法人独资)

证书编号:

有效期: 2028年12月29日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包壹级;
市政公用工程施工总承包壹级。

发证机关: 

2023年12月29日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00074005

(3) 有效期内的安全生产许可证;

统一社会信用代码: []		[]	
[]		[]	
			
<h1>安全生产许可证</h1>			
编号: []		[]	
企业名称:	深圳市景鹏建设工程有限公司	发证机关:	广东省住房和城乡建设厅
法定代表人:	[]	发证日期:	2024年04月03日
单位地址:	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华旺路221号科泰大厦103		
经济类型:	有限责任公司(法人独资)		
许可范围:	建筑施工		
有效期:	2024年04月03日 至 2027年04月03日		

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

企业信息管理 | 人员信息管理 / 人员信息登记

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

查询条件

企业名称

统一社会信用代码

姓名

证件号码

[查询](#) [重置](#) [展开](#)

[导出数据](#) [添加人员](#)

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报审核区县	是否省内	操作
1	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 22:22:15	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
2	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 17:07:08	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
3	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:40:31	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
4	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:38:44	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
5	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:34:58	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
6	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:31:40	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
7	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:26:52	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
8	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:24:10	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
9	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:20:17	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
10	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:17:23	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作



(4) 人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件;

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

- 企业信息管理
- 人员信息管理 / 人员信息登记
- 人员信息管理
- 人员信息登记
- 信用评价管理

查询条件

企业名称 统一社会信用代码 姓名 证件号码



序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报审核区县	是否省内	操作
1	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2025-02-21 16:13:22	初审区县审核通过	云城区	是	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
2	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-12-16 21:12:12	初审区县审核通过	云城区	是	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
3	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-12-06 09:56:11	初审区县审核通过	云城区	是	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
4	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-11-06 15:49:37	初审区县审核通过	云城区	是	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
5	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-11-06 14:10:29	初审区县审核通过	云城区	是	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
6	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-28 15:05:30	初审区县审核通过	云城区	是	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
7	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-28 15:02:06	初审区县审核通过	云城区	是	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
8	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-20 23:12:00	初审区县审核通过	云城区	是	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
9	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-18 19:58:00	初审区县审核通过	云城区	是	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
10	深圳市景鹏建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-18 11:27:16	初审区县审核通过	云城区	是	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>

122

云浮市智慧建筑管理服务信息平台



企业信息管理 | 人员信息管理 / 人员信息登记

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

查询条件

企业名称 请输入

统一社会信用代码 请输入

姓名 请输入

证件号码 请输入

查询

重置

展开



导出数据

添加人员

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报审核区县	是否省内	操作
1	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-18 11:11:53	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
2	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-18 11:08:49	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
3	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:04:52	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
4	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:00	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
5	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:04	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
6	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:07	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
7	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:10	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
8	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:13	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
9	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:16	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作
10	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:19	初审区县审核通过	云城区	是	审核记录 操作

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

- 企业信息管理
- 人员信息管理 / 人员信息登记
- 人员信息管理
- 人员信息登记
- 信用评价管理

查询条件

企业名称 统一社会信用代码 姓名 证件号码



序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报审核区县	是否省内	操作
1	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:23	初审区县审核通过	云城区	是	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
2	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:27	初审区县审核通过	云城区	是	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
3	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:32	初审区县审核通过	云城区	是	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
4	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:36	初审区县审核通过	云城区	是	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
5	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:39	初审区县审核通过	云城区	是	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
6	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:42	初审区县审核通过	云城区	是	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
7	深圳市景腾建设工程有限公司		广东省-深圳市-龙华区				2024-10-14 11:05:45	初审区县审核通过	云城区	是	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>

(5) “云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其有效范围为信用等级B级或以上的企业新登记备案的还没评级的不提供）；

113.104.21.183:8848/publishJustice/creditEvaluation_copy.html

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

首页
政策文件
企业信用
个人信用
企业良好信用
企业不良信用
黑名单


企业名称 统一社会信用代码 企业类型

评价年度 评价月度 信用等级

序号	企业名称	统一社会信用代码	企业类型	评价年度	评价月度	等级	评分
1	深圳市景鹏建设工程有限公司		建设/施工类企业	2025	1	A	60
2	深圳市景鹏建设工程有限公司		建设/施工类企业	2024	12	A	60
3	深圳市景鹏建设工程有限公司		建设/施工类企业	2024	11	A	60
4	深圳市景鹏建设工程有限公司		建设/施工类企业	2024	10	A	60

共 4 条 < 1 > 前往 页

主办单位：云浮市住房和城乡建设局





企业信息注册回执证明

企业名称：深圳市景鹏建设工程有限公司

统一社会信用代码：

信用评分：60

信用等级：A

打印日期：2025-02-24 10:26:36

云浮市智慧建筑管理服务信息平台



企业信息管理

企业信息管理 / 企业信息登记

企业信息登记

云浮市分支机构管理

资质证书

人员信息管理

信用评价管理

上报审核

审核记录

打印企业注册信息回执

企业信息

企业名称*	深圳市景鹏建设工程有限公司	统一社会信用代码*	
工商营业执照注册号*		成立日期*	2017-04-19
企业登记注册类型*	有限责任公司(法人独资)	注册资本(万)*	36000 人民币
注册地区*	广东省 / 深圳市 / 龙华区	净资产(万)	人民币
注册地邮政编码*	518000	上报审核区县*	云城区
企业注册地址*	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华旺路221号科泰大厦103		



企业人员信息

法定代表人*	<input type="text"/>	选择人员	企业负责人*	<input type="text"/>	选择人员
技术负责人	<input type="text"/>	选择人员			

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

企业信息管理

企业信息管理 / 企业信息登记

企业信息登记

上报审核

审核记录

初审记录

变更记录

序号	审核状态	操作时间	操作人	审核意见
1	区县审核通过	2024-10-10 17:24:20		同意
2	初审已上报	2024-10-10 16:21:23	深圳市景鹏建设工程有限公司	上报



企业名称

工商管

企业登

注册地区*

广东省 / 深圳市 / 龙华区

净资产(万)

人民币

注册地邮政编码*

518000

上报审核区县*

云城区

企业注册地址*

深圳市龙华区大浪街道浪口社区华旺路221号科泰大厦103

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

- 企业信息管理
- 人员信息管理
- 信用评价管理**
- 建设/施工企业信用评价

信用评价管理 / 建设/施工企业信用评价

查询条件

评价年度 评价月度 审核状态

如有评分项更新, 请填写每项评分内容, 不可单项更新

序号	评价年度	评价月度	审核状态	企业类型	企业名称	统一社会信用代码	上报审核区县	上报时间	优良得分	操作
1	2025	1	地市终审通过	建设/施工类企业	深圳市景腾建设工程有限公司		云城区	2025-02-01 00:00:02	0	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
2	2024	12	地市终审通过	建设/施工类企业	深圳市景腾建设工程有限公司		云城区	2025-01-01 00:00:02	0	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
3	2024	11	地市终审通过	建设/施工类企业	深圳市景腾建设工程有限公司		云城区	2024-12-01 00:00:01	0	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>
4	2024	10	地市终审通过	建设/施工类企业	深圳市景腾建设工程有限公司		云城区	2024-10-14 11:01:12	0	<input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/>



(6) 广东省以外的投标人，须按《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市〔2015〕52号文）的规定，提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页截图；



深圳市景鹏建设工程有限公司属于广东省内企业

(7) 投标保证金的相关凭证:



投标保证保险保单
(电子)

编号:

投保人: 深圳市景鹏建设工程有限公司
被保险人: C7hn8DK7UmqMMLnWHcrKQigf1WuMa705/LY04+aKTVbp7piTU9nahVPToikDEBUG6Q8kTF33qZN5nkWmtn9+1A==
承保机构: 中国平安财产保险股份有限公司

致: C7hn8DK7UmqMMLnWHcrKQigf1WuMa705/LY04+aKTVbp7piTU9nahVPToikDEBUG6Q8kTF33qZN5nkWmtn9+1A==(以下简称“贵方”)

我方(即“承保机构”)已获得通知,本保单投保人(即“投标人”)已响应贵方于****年**月**日就 [h/5U1hkpWEeRrEbE1cUqzsqb8nCMzi58d2CusHh2A6/g103dIx9tMLSw08rmHCgDwQL0ZwIFwAeIQqJyibMK2PEH8GhfmmwXfgs2BZ9ZaTdsCyPad2BMZ4aubQTOrZvHc8BGniCB0Mm75d7e+n1v1cA==](#) (项目名称,以下简称“本工程”)发出的招标文件,并已向招标人(即“被保险人”)提交了投标文件(即“基础交易”)。

一、我方理解根据招标条件,投标人必须提交一份投标保证保险保单(以下简称“本保单”),以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此,应投保人要求,我方在此同意向贵方提供投标保证保险,本保单保险金额为人民币(大写) 壹拾贰万元整 (¥ 120,000)。

二、我方在投保人发生以下情形时承担保险责任:

- (1) 投保人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的;
- (2) 投保人在收到中标通知后,不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同;
- (3) 投保人在与贵方签订合同后,未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保;
- (4) 投保人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保单的有效期

本保单有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的 180 日。投标有效期延长的,本保单有效期相应顺延,最迟不超过 2026 年 02 月 24 日。

四、理赔时效承诺

保险人承诺在收到被保险人的书面索赔通知后 7 日内无条件在本保单保险金额内向被保险人支付赔款,前述书面索赔通知即为赔付要求之单据,且应满足以下要求:

- (1) 索赔通知到达的日期在本保单的有效期内;
- (2) 载明要求赔付的金额;
- (3) 载明申请人违反招标文件规定的义务内容和具体条款;
- (4) 声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除投保人我方支付责任的情形;

被保险人发出的书面索赔通知应应由其为鉴明被保险人法定代表人(负责人)或授权代理人签名并加盖公章。

五、本保单不得转让、不得设定担保。贵方未经我方书面同意,转让本保单或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。

六、本保单项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,不影响本保单的独立有效。

本保单信息是为您提供理赔及售后服务的重要依据,保单投诉、理赔等,请致电全国统一服务热线95511。

七、本保单适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为被保险人所在地。

八、保险人应当保证承保出单系统的正常运行及稳定，若遇系统故障或其他特殊情况导致投标保证金业务经营中断或出单错误的，保险人应当及时采取措施予以解决，包括但不限于及时通知投保人及业务相关合作方，说明原因及提供解决方案，在保险人及时提供解决方案的前提下，保险人可相应免责。

九、本保单自我方盖章之日起生效。

承保机构：中国平安财产保险股份有限公司佛山分公司
地 址：广东省佛山市汾江南路38号世博金融中心21楼
开立时间：2025 年 02 月 24 日



本保单信息是为您提供理赔及售后服务的重要依据，保单投诉、理赔等，请致电全国统一服务热线95511。

第 2 页 共 2 页

(8) 投标人开户许可证或银行出具基本账户证明;



基本存款账户信息

账户名称: 深圳市景鹏建设工程有限公司

账户号码:

开户银行:

法定代表人:

(单位负责人)

基本存款账户编号:

建行深圳泰然支行

2024年03月11日



(9) 投标人在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)的网页截图;

中国执行信息公开网
司法为民 司法便民

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
限制高消费令 被执行人未按执行通知书指定的期间履行法律文书...	

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
-------	------

查询条件

被执行人姓名/名称: 深圳市景鹏建设工程有限公司

身份证号码/组织机构代码: _____

省份: 全部

验证码: wjta 验证码正确! 查询

查询结果

在全国范围内没有找到 深圳市景鹏建设工程有限公司相关的结果.

(10) 投标人认为还须提供其他资料。

无。



十、投标报价

(一) 投标报价说明

- 1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
- 2、工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。
- 3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。
- 4、其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。
- 5、本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
- 6、本报价的币种为人民币。
- 7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

(二) 工程量清单报价书

工程量清单报价书由下列格式内容组成：

1. 投标总价；
2. 建设项目投标报价汇总表；
3. 单位工程投标报价汇总表；
4. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；
5. 综合单价分析表（仅投标人中标后另册提供）；
6. 总价措施项目清单与计价表；
7. 其他项目清单与计价汇总表；
8. 暂列金额明细表；
9. 材料（工程设备）暂估单价及调整表；
10. 专业工程暂估价及结算价表；
11. 规费、税金项目清单与计价表；
12. 发包人提供材料和工程设备一览表；
13. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）；
14. 投标报价需要的其他资料（当投标人填报的可竞争费用，在投标报价时以低价竞争的，投标人应在投标文件中对此提交相关说明资料和证明材料，以证明其不低于企业成本）。

说明：投标报价需要的其他资料或表格可以按工程量清单计价统一格式由投标人自行决定是否编制到投标报价书中。**工程量清单报价书格式以软件导出为准。**



省道S537线(云安区段)细友石场至湾边村段改建工程-供水管道迁改工程施工

工程

投 标 总 价

招 标 人： 广东省鲲鹏城市建设投资集团有限公司

工 程 名 称： 省道S537线(云安区段)细友石场至湾边村段改建工程-供水管道迁改工程施工

投 标 总 价 (小写)： 6940415.74元

(大写)： 陆佰玖拾肆万零肆佰壹拾伍元柒角肆分

投 标 人： 深圳市景鹏建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： 2025 年 02 月 25 日



建设项目投标报价汇总表

工程名称：省道S537线(云安区段)细友石场至湾边村段改建工程-供水管道迁改工程施工

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	省道S537线(云安区段)细友石场至湾边村段改建工程-供水管道迁改工程施工	6940415.74		296436.10	
1.1	省道S537线(云安区段)细友石场至湾边村段改建工程-供水管道迁改工程施工	6940415.74		296436.10	
合计		6940415.74		296436.1	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线(云安区段)细友石场至湾边村段改建工程-供水管道迁改工程施工

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		给排水					5907975.57		
1	040101002001	挖沟槽土方	1.挖管沟土方，一、二类土 2.A型防护	m3	16920.72	6.64	112353.58		
2	040101002002	挖沟槽土方	1.挖管沟土方，一、二类土 2.B型防护	m3	1308.86	6.63	8677.74		
3	040305001001	管垫层	1.砂石垫层 2.厚度:150mm	m3	1037.63	143.23	148619.74		
4	040103001001	回填方	1.管侧回填中粗砂150厚	m3	557.02	270.30	150562.51		
5	040103001002	回填方	1.填方材料品种:场内利用土 2.填方粒径要求:符合设计及规范要求	m3	13399.15	143.23	1919160.25		
6	040103001004	回填方(B型段)	1.回填石屑 2.填方粒径要求:符合设计及规范要求	m3	353.26	143.23	50597.43		
7	040103002001	余方弃置	1.外运土方 2.运距:暂按5km考虑	m3	2820.56	50.51	142466.49		
8	粤040101006001	打拔钢板桩	1、桩长:6m内 2、钢板桩类型:拉森III型 3、桩间距:密扣 4、支撑:宽1.1m内, HM300*200*6*8钢腰梁, Φ200*10钢管支撑, 间距4.0m 5、综合考虑钢板桩场内外运输, 运距综合考虑	t	1000.926	892.40	893226.36		
9	040501002001	钢管	1.管道材质、规格:焊接钢管DN500*10.0 2.接口方式:焊接 3.闭水试验 4.管道消毒冲洗	m	6243.41	354.83	2215349.17		
10	040503002001	供水管道标志桩	1.混凝土强度等级:C20	件	62	856.14	53080.68		
11	040205004001	供水标志牌	1.不锈钢3mm厚	块	126	34.83	4388.58		
12	040502006001	法兰	1.材质、规格、结构形式:不锈钢, 3mm厚	副	24	93.21	2237.04		
本页小计								5700719.57	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线(云安区段)细友石场至湾边村段改建工程-供水管道迁改工程施工


标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	040504001001	砌筑井	1. 阀门井 2. 详见图纸DY-01及图集07 MS101-2页14 3. 井深:1.9m	座	24	1203.09	28874.16	
14	040504001002	砌筑井	1. 排气井 2. 详见图纸DY-01及图集07 MS101-2页52	座	4	520.75	2083.00	
15	040504001003	砌筑井	1. 排泥井 2. 详见图纸DY-01及图集07 MS101-2页58	座	6	517.94	3107.64	
16	040502005001	阀门	1. 种类:甲阀 2. 材质及规格:DN500 3. 连接形式:法兰盘	个	24	6058.72	145409.28	
17	040502005003	闸阀	1. 种类:闸阀DN63 2. 排气井内	个	4	144.65	578.60	
18	040502005004	排气阀门	1. 种类:排气阀 2. 尺寸: DN63	个	4	67.75	271.00	
19	040502001001	铸铁管管件	1. 种类:单承单盘排气三通 2. 材质及规格:铸铁, DN500*50 3. 接口形式:胶圈接口	个	4	682.23	2728.92	
20	040502005005	排泥阀	1. 种类:排气阀 2. 尺寸: DN100	个	6	2347.91	14087.46	
21	040502002001	钢管管件制作、安装	1. 种类:一承二插排泥三通 2. 材质及规格:铸铁, DN500*500 3. 接口形式:胶圈接口	个	6	1006.95	6041.70	
22	040502002002	弯头	1. 种类:90°弯头 2. 材质及规格:DN500 3. 接口形式:焊接	个	6	679.04	4074.24	
		措施项目						
23	041101005001	井字架		座	34			
本页小计							207256.00	
合 计							5907975.57	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线(公安区段)细友石场至湾边村段改建工程-供水管道迁改工程施工

标段：


第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	1796582.42	16.5	296436.10			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%；
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11



总价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线(公安区段)细灰石场至湾边村段改建工程-供水管道迁改工程施工

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								计算), 结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计						296436.10		

编制人 (造价人员) : -

复核人 (造价工程师) :

表-11

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：省道S537线(云安区段)细友石场至湾边村段改建工程-供水管道迁改工程施工

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	焊接钢管 DN400	m	6166.9907		270.00	270.00		
2	石屑	m ³	18112.1027		91.15	91.15		
3	中砂	m ³	712.7875		195.15	195.15		
4	砂石	m ³	1366.5722		91.15	91.15		
5	拉森钢板桩	t	22.5409		4991.15	4991.15		
6	止回阀 DN500	个	24		3396.11	3396.11		
7	水	m ³	8619.5614		4.18	4.18		
8	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ³	63.497		427.52	427.52		
9	预拌混凝土	m ³	63.5258		344.66	344.66		
10	其他材料费	元	21625.1419		1.00	1.00		
11	低碳钢焊条 综合	kg	2803.6172		6.32	6.32		
12	排泥阀 DN100	个	6		2257.43	2257.43		
13	井环盖、井座 φ700	套	24		517.32	517.32		
14	尼龙砂轮片 φ150	片	1966.6742		4.71	4.71		
15	氧气	m ³	1576.4261		3.64	3.64		
16	乙炔气	kg	601.9935		7.92	7.92		
17	氩气	m ³	270.5894		17.21	17.21		
18	井环盖、井座	套	10		421.63	421.63		
19	等径三通 DN500*500	个	6		558.69	558.69		
20	高压电缆牌 菱形, 2mm不锈钢	块	126		25.00	25.00		

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21
